

平成30年度

水道事業統計年報

自 平成30年4月 1日
至 平成31年3月31日



宮古島市上下水道部

目 次

第1章 事業の推移

1. 事業の沿革	1
2. 平成30年度事業概要	2
3. 事業の推移	3
4. 事業の伸び率	4
5. 水道料金の変遷表	6

第2章 機構・職制

1. 機 構	7
2. 職種別職員配置	7
3. 事務分掌	8
4. 年齢別職員構成	10
5. 勤務年数別職員構成	10
6. 給与別職員構成	10

第3章 施 設

1. 主要施設所在地	11
2. 水源施設	11
3. 貯水施設	12
4. 導水施設	13
5. 浄水施設	15
6. 送水施設	18
7. 配水施設	19
8. 宮古島市配水管延長(総括)	20
9. 全島配管、施設概観図	22
10. 水源施設耐震化進捗状況	23
11. 浄水施設耐震化進捗状況	24
12. 送水施設耐震化進捗状況	25
13. 配水施設耐震化進捗状況	26

第4章 浄水統計

1. 配水量・有収水量分析	27
2. 月別、年度別、有効無効水量グラフ	28
3. 系統別配水量	32
4. 浄水場別稼働状況	33
5. 電力消費量	34
6. 次亜塩素消費量	36
7. 燃料消費量	38
8. 原浄水水質試験成績	39
9. 浄水水質の推移	42

第5章 工事施工状況

1. 月別、地区別給水装置工事施工状況	43
2. 給水装置修理、停止、開始、量水器取替状況	44
3. 配水施設修理状況	45
4. 工 事	46

第6章 業務統計

1. 月別、用途別加入状況	49
2. 月別、用途別使用状況	50
3. 有効、無効水量	51
4. 地区別、用途別使用水量及び使用料金	52
5. 月別料金徴収状況	52

第7章 財 務

1. 平成30年度宮古島市水道事業決算報告書	53
2. 平成30年度宮古島市水道事業損益計算書	55
3. 平成30年度宮古島市水道事業剰余金計算書	56
4. 平成30年度宮古島市水道事業剰余金処分計算書	57
5. 平成30年度宮古島市水道事業貸借対照表	58
6. 平成30年度宮古島市水道事業会計キャッシュ・フロー計算書(間接法)	61
7. 企業債明細書	62
8. 固定資産明細書	66
9. 平成31年度宮古島市水道事業会計予算実施計画	67
10. 経営分析	70

第8章 議会及び許認可事項

1. 議会議決事項	73
2. 行政官庁許認可事項	73

資 料

1. 宮古島における降水量調べ	74
2. 年次平均降水量	74
3. 月別平均降水量	74
4. 降水量の少なかった時期の記録	75
5. 白川田水源地湧水量調査表	76
6. 宮古島市水道水源地下水流域図	77
7. 宮古島市水道年表	78

第1章 事業の推移

第1章 事業の推移

1. 事業の沿革

◎ 創 設

〔平良市〕

平良市における水道は、昭和14年、当時の平良町長石原雅太郎氏の水道構想に始まり、昭和25年6月この基本構想が青写真となり、同年12月8日から本格的に測量を開始し、県及び軍政府の関係者に対し補助の折衝を重ね、漸く、昭和26年2月13日には当時の軍政府より1,237万円(B軍票)の補助指令を受け昭和27年3月27日に工事が着手された。

平良市の上水道事業に対する当初の構想は、市内の大和井(ヤマトガー)を水源地とすべく県衛生部や関係官庁に対し、水質、水量等の調査を依頼し、調査の結果、大和井の水量では将来不足するおそれがあるとして、大野山林北端にある白川田水源に変更し、袖山嶺に配水池を設置し自然流下により市街地に配水し主要ヶ所に共同栓を設置して給水するよう計画設計がなされ、工事は急ピッチで進み、平良市全市民の労力奉仕により昭和28年に工事は完成した。

〔城辺町〕

昭和29年、琉球政府補助により保良井(ボラガー)の湧水を利用して保良部落内に簡易水道を布設した他、吉野、城辺学区、西里添、下北等の各部落に簡易水道が布設された。

昭和30年9月19日、友利部落に友利水道組合(島田文雄組合長)によって、計140万円の工事費で水道施設が完成、友利、砂川部落400戸がこの恩恵を浴す。

〔下地町〕

下地町は地下水に恵まれ各家庭に井戸があったため、他市町村より水道の普及はおくれ比較的水の少ない川満、入江部落に昭和34年に簡易水道が布設された。

〔上野村〕

昭和31年3月宮国部落に簡易水道が設立され同年6月工事は完成し、部落民は水道水を利用してしたが、その後施設を拡張し他部落まで施設を延長することになり、組合による管理が困難となったため昭和33年8月村に移管された。又、野原部落でも昭和34年より野原岳の地下水を利用して部落で簡易水道を経営していたが、昭和38年7月これも村に移管された。

〔伊良部町〕

昭和35年8月待望の簡易水道が創設され、長い間の水問題が一举に解決され、昭和41年8月に北部佐良浜地区が給水開始となり、昭和42年に国仲地区が給水開始、昭和47年に仲地、佐和田、長浜、伊良部地区が給水開始となり、昭和52年2月には人口の自然増加や、下地島訓練場の施設区域の開設により水道事業の変更許可を受け、平成9年度に浄水方法変更の認可を受け、平成12年4月より逆浸透膜法を採用した。

以上のように宮古本島における水道事業は、各市町村で運営がなされていたが、昭和39年5月、高等弁務官布令により宮古島の水利系統を総括する機関として宮古島用水管理局が設立され、同時に宮古島の全島上水道計画がなされ、総工費968,123.44ドルを以って工事が進められた。しかし昭和40年7月市町村自治法に基く宮古島上水道組合を設立することに伴い用水管理局は発展的に解消し、昭和47年5月沖縄県が本土に復帰したことによって、地方公営企業法に基づき宮古島上水道企業団と改称されました。

更に、平成17年10月1日5市町村合併に伴い、宮古島上水道企業団と伊良部町水道課が統合され宮古島市水道局となり、平成22年4月1日に行政改革に伴い上下水道部に改称される。

2. 平成30年度 事業の概要

1. 概 況

(1) 総 括 事 項

(業務状況)

平成30年度の業務量につきましては、給水戸数が29,978戸で、前年度に比べ784戸(2.69%)の増加となっております。

年間総配水量は、8,922,719 m³で前年度に比べ180,076 m³(2.06%)の増加となり、一日平均配水量は、24,446 m³で前年度に比べ493 m³(2.06%)の増加となっております。有収率については、84.34%で前年度に比べ0.64%の減少となっております。

(工事状況)

平成30年度の建設改良費は総額 619,258,953円で、その主たる事業は国庫補助事業であります。平成29年度繰越分として、将来における水需要増加が予想される中、新たな東添道水源地の建築工事を施工し、当年度分で、ポンプ・計装・導水管の新設工事を行い、3,000 m³/日の計画取水能力を整備してあります。また、配水管布設工事においては、赤水と漏水の原因となっている老朽管の改良工事を実施して、耐震化の整備を行い、安全で安心な水道水を安定的に供給できる施設の整備に努めました。

(財政状況)

収益的収支につきましては、総事業収益 2,003,501,288円(対前年度比 0.56%減)に対しまして、総事業費用 1,735,908,060円(対前年度比 5.22%増)となり、収支差引 267,593,228円の純利益を計上しております。

一方、資本的収支につきましては、資本的収入 382,321,380円に対しまして、資本的支出は 956,669,780円となっております。

資本的収入額が資本的支出額に不足する額 574,348,400円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額 27,786,314円、減債積立金 256,416,210円及び当年度分損益勘定留保資金 290,145,876円で、補ていたしました。

3. 事業の推移

種 別	年 度 単 位	平 成 26年度	平 成 27年度	平 成 28年度	平 成 29年度	平 成 30年度	備 考
行政区域内 世 帯 数	世帯	24,848	25,158	28,805	29,194	29,978	
行政区域内 人	人	54,128	53,812	53,778	53,847	54,558	
給 水 人 口	〃	54,106	53,789	53,769	53,821	54,529	
普 及 率	%	99.96	99.96	99.98	99.95	99.95	
給 水 栓 数	栓	25,791	26,014	26,445	26,771	27,027	
配 水 量	m³	8,329,307	8,121,673	8,381,083	8,742,643	8,922,719	
一 日 最 大 配 水 量	〃	29,960	27,450	27,661	31,428	31,122	
一 人 一 日 最大配水量	ℓ	554	510	514	584	571	
一 日 平 均 配 水 量	m³	22,820	22,190	22,962	23,952	24,446	
一 人 一 日 平均配水量	ℓ	422	413	427	445	448	
有 効 水 量	m³	7,321,515	7,510,703	7,557,599	7,663,488	7,765,211	
一 日 平 均 有 効 水 量	〃	20,059	20,521	20,706	20,996	21,275	
一人一日平均 有 効 水 量	ℓ	371	382	385	390	390	
有 効 率	%	87.90	92.48	90.17	87.66	87.03	
有 収 水 量	m³	7,090,595	7,265,932	7,321,516	7,428,905	7,525,766	
一 日 平 均 有 収 水 量	m³	19,426	19,852	20,059	20,353	20,619	
一人一日平均 有 収 水 量	ℓ	359	369	373	378	378	
有 収 率	%	85.13	89.46	87.36	84.98	84.35	
一 栓 当 り 有 収 水 量	m³	275	279	277	278	278	
一栓一月当 り有収水量	m³	23	23	23	23	23	
水道使用料金	円	1,673,141,107	1,744,676,038	1,763,191,319	1,797,900,749	1,832,283,076	
一 栓 当 り 使 用 料 金	〃	64,873	67,067	66,674	67,159	67,795	
一栓一月当 り使用料金	〃	5,406	5,589	5,556	5,597	5,650	
一 m³ 当り 使 用 料 金	〃	236.0	240.1	240.8	242.0	243.5	
導水管延長	m	25,039	25,039	15,345	15,345	15,436	H30 東添道水源地利用開始 に伴い導水管延長の増加
送水管延長	〃	24,960	24,960	24,960	25,686	25,619	
配水管延長	〃	467,946	469,208	470,040	470,520	471,379	
消 火 栓 数	栓	322	324	326	330	333	
仕 切 弁 数	ヶ所	1,296	1,330	1,338	1,344	1,355	
空 気 弁 数	〃	285	296	310	315	318	
給 水 収 益	円	1,552,809,032	1,615,566,861	1,632,711,567	1,664,851,252	1,696,688,422	

4. 事業の伸び率

(イ) 業 務

項目 年度	給 水 人 口	前年度比%	給水栓数	前年度比%	配水量(m³)	前年度比%	一 日 最 大 配 水 量 (m³)	前年度比%
H11	49,298	0.1	18,423	△ 8.9	8,481,176	△ 5.3	28,605	△ 0.9
H12	49,276	△ 0.0	18,724	1.6	8,149,525	△ 3.9	25,671	△ 10.3
H13	49,601	0.7	18,877	0.8	8,092,086	△ 0.7	30,459	18.7
H14	49,298	△ 0.6	19,303	2.3	7,804,728	△ 3.6	28,166	△ 7.5
H15	49,397	0.2	19,425	0.6	7,781,042	△ 0.3	35,815	27.2
H16	49,537	0.3	19,611	1.0	7,586,565	△ 2.5	29,859	△ 16.6
H17	55,723	12.5	22,525	14.9	8,617,793	13.6	29,797	△ 0.2
H18	55,395	△ 0.6	23,007	2.1	8,640,476	0.3	27,467	△ 7.8
H19	55,077	△ 0.6	23,528	2.3	8,696,378	0.6	28,758	4.7
H20	54,818	△ 0.5	23,872	1.5	8,444,543	△ 2.9	26,527	△ 7.8
H21	54,812	△ 0.0	24,052	0.8	8,463,423	0.2	25,933	△ 2.2
H22	54,663	△ 0.3	24,282	1.0	8,433,303	△ 0.4	25,095	△ 3.2
H23	54,984	0.6	24,700	1.7	8,580,319	1.7	36,631	46.0
H24	54,469	△ 0.9	24,929	0.9	8,390,700	△ 2.2	28,774	△ 21.4
H25	54,267	△ 0.4	25,388	1.8	8,221,584	△ 2.0	29,499	2.5
H26	54,106	△ 0.3	25,791	1.6	8,329,307	1.3	29,960	1.6
H27	53,789	△ 0.6	26,014	0.9	8,121,673	△ 2.5	27,450	△ 8.4
H28	53,769	△ 0.0	26,445	1.7	8,381,083	3.2	27,661	0.8
H29	53,821	0.1	26,771	1.2	8,742,643	4.3	31,428	13.6
H30	54,529	1.3	27,027	1.0	8,922,719	2.1	31,122	△ 1.0

(ロ) 財 務

項目 年度	給 水 収 益	前年度比%	給 水 原 価	前年度比%	供 給 単 価	前年度比%	人 件 費	前年度比%
H11	1,506,974,100	14.1	212.46	20.8	212.21	18.4	431,402,851	2.8
H12	1,556,603,339	3.3	223.81	5.3	223.38	5.3	420,150,203	△ 2.6
H13	1,575,239,129	1.2	221.08	△ 1.2	223.90	0.2	462,568,365	10.1
H14	1,580,064,235	0.3	221.70	0.3	224.37	0.2	435,218,660	△ 5.9
H15	1,571,232,656	△ 0.6	221.16	△ 0.2	223.69	△ 0.3	423,308,553	△ 2.7
H16	1,537,107,284	△ 2.2	219.53	△ 0.7	222.98	△ 0.3	394,237,336	△ 6.9
H17	1,654,096,641	7.6	220.06	0.2	221.08	△ 0.9	410,270,503	4.1
H18	1,631,033,528	△ 1.4	220.10	0.0	219.53	△ 0.7	417,725,624	1.8
H19	1,639,488,432	0.5	206.95	△ 6.0	220.51	0.4	431,088,922	3.2
H20	1,597,678,838	△ 2.6	215.03	3.9	219.31	△ 0.5	421,662,140	△ 2.2
H21	1,624,866,233	1.7	211.31	△ 1.7	219.84	0.2	396,987,063	△ 5.9
H22	1,592,063,432	△ 2.0	214.92	1.7	218.85	△ 0.5	368,410,988	△ 7.2
H23	1,595,828,614	0.2	207.44	△ 3.5	219.30	0.2	367,739,835	△ 0.2
H24	1,567,470,841	△ 1.8	205.40	△ 1.0	218.41	△ 0.4	364,450,468	△ 0.9
H25	1,562,683,738	△ 0.3	213.95	4.2	218.52	0.1	344,870,921	△ 5.4
H26	1,552,809,032	△ 0.6	240.31	12.3	219.00	0.2	334,929,967	△ 2.9
H27	1,615,566,861	4.0	186.25	△ 22.5	222.35	1.5	319,241,708	△ 4.7
H28	1,632,711,567	1.1	186.22	△ 0.0	223.00	0.3	288,337,573	△ 9.7
H29	1,664,851,252	2.0	189.69	1.9	224.10	0.5	277,425,108	△ 3.8
H30	1,696,688,422	1.9	198.73	4.8	225.45	0.6	267,645,196	△ 3.5

一人一日 最大配水量(ℓ)	前年度比%	一人一日 平均配水量(ℓ)	前年度比%	有収水量(㎥)	前年度比%	有収率(%)	前年度比%
580	△ 1.0	470	△ 5.6	7,101,427	△ 3.6	83.73	1.8
521	△ 10.2	453	△ 3.6	6,968,379	△ 1.9	85.51	2.1
614	17.9	447	△ 1.3	7,035,398	1.0	86.94	1.7
571	△ 7.0	433	△ 3.1	7,042,194	0.1	90.23	3.8
725	27.0	430	△ 0.7	7,024,025	△ 0.3	90.27	0.0
603	△ 16.8	420	△ 2.3	6,893,414	△ 1.9	90.86	0.7
535	△ 11.3	424	1.0	7,481,917	8.5	86.82	△ 4.4
462	△ 13.6	427	0.7	7,429,613	△ 0.7	85.99	△ 1.0
485	5.0	433	1.4	7,435,478	0.1	85.50	△ 0.6
436	△ 10.1	423	△ 2.3	7,285,075	△ 2.0	86.27	0.9
473	8.5	423	0.0	7,391,164	1.5	87.33	1.2
523	10.6	423	0.0	7,277,147	△ 1.5	86.29	△ 1.2
666	27.3	426	0.7	7,276,961	△ 0.0	84.81	△ 1.7
528	△ 20.7	423	△ 0.7	7,176,665	△ 1.4	85.53	0.8
577	9.3	416	△ 1.7	7,151,309	△ 0.4	86.98	1.7
554	△ 4.0	422	1.4	7,090,595	△ 0.8	85.13	△ 2.1
510	△ 7.9	413	△ 2.1	7,265,932	2.5	89.46	5.1
514	0.8	427	3.4	7,321,516	0.8	87.36	△ 2.3
584	13.6	445	4.2	7,428,905	1.5	84.97	△ 2.7
571	△ 2.2	448	0.7	7,525,766	1.3	84.34	△ 0.7

動力費	前年度比%	減価償却費	前年度比%	支払利息	前年度比%	企業債償還金	前年度比%
66,951,698	9.2	217,527,268	13.3	278,286,310	1.7	170,253,201	8.1
65,515,834	△ 2.1	279,143,556	28.3	284,850,288	2.4	187,680,232	10.2
65,317,515	△ 0.3	294,656,351	5.6	282,459,564	△ 0.8	204,692,195	9.1
65,431,636	0.2	313,918,553	6.5	278,190,671	△ 1.5	224,547,961	9.7
64,405,437	△ 1.6	319,401,191	1.7	265,195,389	△ 4.7	245,868,106	9.5
63,238,828	△ 1.8	328,566,719	2.9	255,726,696	△ 3.6	276,198,035	12.3
97,650,157	54.4	386,751,004	17.7	274,151,470	7.2	361,322,527	30.8
96,193,071	△ 1.5	392,281,537	1.4	260,322,433	△ 5.0	390,929,201	8.2
93,279,511	△ 3.0	392,696,481	0.1	244,137,353	△ 6.2	826,368,239	111.4
101,970,493	9.3	394,050,603	0.3	205,195,444	△ 16.0	816,223,330	△ 1.2
94,220,848	△ 7.6	396,943,402	0.7	179,183,253	△ 12.7	415,047,091	△ 49.2
90,599,017	△ 3.8	380,934,211	△ 4.0	167,265,821	△ 6.7	411,016,864	△ 1.0
97,455,659	7.6	354,033,680	△ 7.1	155,035,153	△ 7.3	448,343,575	9.1
99,677,322	2.3	341,226,511	△ 3.6	142,972,425	△ 7.8	742,259,337	65.6
101,564,246	1.9	343,044,780	0.5	119,547,210	△ 16.4	408,948,705	△ 44.9
105,258,828	3.6	574,700,514	67.5	112,330,008	△ 6.0	402,100,694	△ 1.7
88,944,450	△ 15.5	570,686,535	△ 0.7	106,071,768	△ 5.6	390,119,589	△ 3.0
79,121,598	△ 11.0	529,789,357	△ 7.2	98,531,792	△ 7.1	373,603,572	△ 4.2
89,571,704	13.2	527,777,484	△ 0.4	90,940,308	△ 7.7	340,349,395	△ 8.9
100,284,161	12.0	530,485,668	0.5	82,941,046	△ 8.8	329,954,464	△ 3.1

5. 水道料金変遷表


用 途	改定年月日		昭和47年5月15日	昭和49年8月1日	昭和57年4月1日	昭和62年4月1日	平成7年1月1日	平成11年7月1日	
	区分								
家 庭 用	基 本 水 量		8	8	8	8	8	0	
	基 本 料 金		360	450	650	950	1,100	550	
	超 過 料 金		55	9～20 70	9～20 95	9～20 110	9～20 130	8㎡ まで 100	
				21～30 80	21～30 105	21～30 135	21～30 160	9～20 162	
				31～ 100	31～ 120	31～ 165	31～ 200	21～30 200 31㎡ 超える 250	
共 同 栓	基 本 水 量		10						
	基 本 料 金		570						
	超 過 料 金		55						
営 業 用	一 級	基本水量							
		基本料金							
		超過料金							
	二 級	基本水量							
		基本料金							
		超過料金							
	基 本 水 量		10	10	10	10	10	0	
	基 本 料 金		505	700	1,000	1,450	1,700	700	
	超 過 料 金		75	11～ 50 110	11～ 50 125	11～ 50 150	11～ 50 180	10㎡ まで 140	
			65	51～200 130	51～200 160	51～200 200	51～200 245	11～50 224 51～200 305	
			55	201～ 155	201～ 175	201～ 230	201～ 285	201㎡ 超える 355	
			40						
	官 公 署 用	基 本 水 量		12	10	10	10	10	0
		基 本 料 金		900	1,000	1,200	1,700	2,000	700
超 過 料 金		75	160	185	220	270	10㎡ まで 180 10㎡ 超える 338		
学 校 用	基 本 水 量		20						
	基 本 料 金		450						
	超 過 料 金		40						
浴 場 用	基 本 水 量		200	100					
	基 本 料 金		5,400	3,000					
	超 過 料 金		30	45					
製 氷 用	基 本 水 量								
	基 本 料 金								
	超 過 料 金								
給 水 所	水 量								
	料 金								
船舶給水	1 ㎡ 当 たり		110	150	185	260	320	基本料金 1,000 1㎡ につき 420	
臨時給水	〃		110	150	185	260	320	基本料金 1,000 1㎡ につき 420	
米 軍 用	基 本 水 量		8						
	基 本 料 金		360						
	超 過 料 金		55						
連 合 専 用					1戸(又は1室)に つきそれぞれの用 途に応じて上記の 金額を適用する。			1戸(又は1室)に つきそれぞれの用 途に応じて上記の 金額を適用する。	

注:昭和43年7月9日以前の料金はドル。昭和47年5月15日よりの料金は1ドル360円で換算。

第2章 機構、職制

第2章 機 構 ・ 職 制

1. 機 構

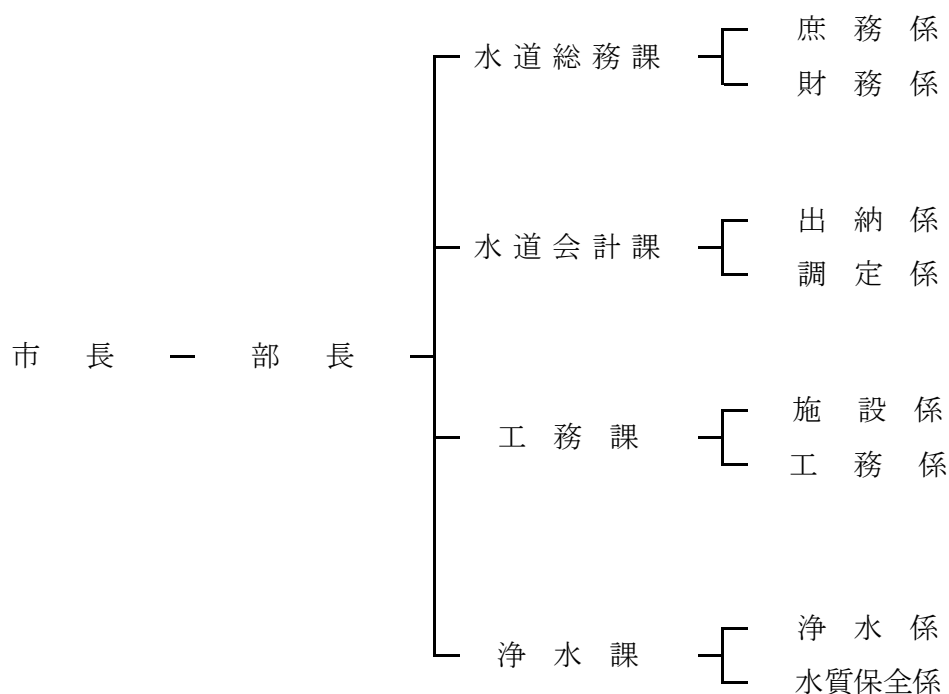

2. 職種別職員配置

職種別 課係員	管理職	事 務 職 員					技 術 職 員					合 計
		主幹	補佐	係長	調整官	主査・主事	主幹	補佐	係長	調整官	技査・技師	
部 長	1											1
水道総務課	1											1
庶 務 係			1			2						3
財 務 係				1		2						3
水道会計課	1											1
出 納 係			1		2	1						4
調 定 係			1			2						3
工 務 課	1											1
施 設 係									1	3	1	5
工 務 係								1		2	3	6
浄 水 課	1											1
浄 水 係								1		2	1	4
水質保全係									1		1	2
合 計	5		3	1	2	7		2	2	7	6	35

3. 事務分掌

水道総務課

庶務係

1. 文書の受付、発送及び保存に関する事。
2. 公印に関する事。
3. 公告式に関する事。
4. 条例、規則及び規程等の制定及び改廃に関する事。
5. 職員の任免、定数、分限及び懲戒に関する事。
6. 職員の給与及び服務に関する事。
7. 職員の福利、厚生及び衛生に関する事。
8. 職員の研修に関する事。
9. 職員の旅行命令に関する事。
10. 業務状況の報告に関する事。
11. 指定給水装置工事事業者に関する事。
12. 宮古島市水道事業給水条例(平成17年宮古島市条例第215号)違反取締りに関する事。
13. 事務所の管理及び取締りに関する事。
14. 他課他係の所管に属しない事。
15. 事業経営の調査、統計及び研究に関する事。
16. 式典及び行事に関する事。
17. 水道協会に関する事。
18. 水道水源保全地域の地下水及び湧水の保全に関する事。
19. 水道水源保全地域における地下水審議会に関する事。
20. 水道水源保全地域の環境保全及び巡回点検に関する事。
21. 水道水源保全地域の土地の利用状況に関する事。

財務係

1. 予算の編成及び令達に関する事。
2. 予算の執行管理に関する事。
3. 企業債に関する事。
4. 事業の財政計画に関する事。
5. 契約に関する事。
6. 固定資産の取得及び処分に関する事。
7. 課内備品(図書を除く)の管守及び統計に関する事。

水道会計課

出納係

1. 現金、有価証券及び担保物件の保管、出納に関する事。
2. 上下水道料金その他諸収入の徴収に関する事。
3. 上下水道料金又は工事費の督促並びに滞納処分に関する事。
4. 決算に関する事。
5. 事業の資金計画に関する事。
6. 一時借入金に関する事。
7. 給与に係る所得税等の徴収及び納付に関する事。
8. 物品の出納及び管守に関する事。
9. 不用品の処分に関する事。
10. 主管文書の管守及び統計に関する事。

調定係

1. 上下水道料金その他収入の調定に関する事。
2. 納額通知書の作成に関する事。
3. 給水装置の開、閉栓並びに用途変更及び名義変更に関する事。
4. 給水停止、開始に関する事。
5. 量水器の検針に関する事。
6. 量水器の点検に関する事。
7. 量水器の修理及び取替えに関する事。
8. 量水器原簿の作成、整理及び管理に関する事。
9. 主管文書の管守及び統計に関する事。

工 務 課

施 設 係

1. 上水道施設の計画、設計及び施工管理に関すること。
2. 水源の調査開発に関すること。
3. 水道施設の統合調整に関すること。
4. 用具の管守に関すること。
5. 主管文書の管守及び統計に関すること。

工 務 係

1. 給水工事の設計、施行、検査及び精算に関すること。
2. 給水工事用資材の検査に関すること。
3. 給水に関する届出等の受付に関すること。
4. 給水装置工事台帳の作成び管理に関すること。
5. 指定給水装置工事事業者の指導監督に関すること。
6. 管理図面の作成及び原図管理に関すること。
7. 施設の維持管理に係る他課係との連絡調整に関すること。
8. 給配水の計画及び実施に関すること。
9. 導、送、配水管及び附属設備の維持管理に関すること。
10. 漏水防止の計画及び実施に関すること。
11. 漏水の調査及び対策に関すること。
12. 漏水防止の啓発に関すること。
13. 給水装置の修理に関すること。
14. 給水停止、開始等の施行に関すること。
15. 量水器の取替施行に関すること。
16. 盗水等不正工事の調査報告に関すること。
17. 消火栓に関すること。
18. 用具の保管に関すること。
19. 主管文書の保管及び統計に関すること。

浄 水 課

浄 水 係

1. 取水、集水に関すること。
2. 揚水、導水、浄水及び送配水作業に関すること。
3. 湧水の調査に関すること。
4. 揚水、導水、浄水施設の維持管理に関すること。
5. 浄水場系統施設の電気及び機械設備の維持管理に関すること。
6. 工具備品等の管守に関すること。
7. 主管文書の管守及び統計に関すること。

水質保全係


1. 水質の検査及び保全に関すること。
2. 水質検査施設の維持管理に関すること。
3. 用具の保管に関すること。
4. 主管文書の保管及び統計に関すること。

4. 年齢別職員構成

H31.3.31現在

年齢別	事務職員		技術職員		合計	
	職員数	比率	職員数	比率	職員数	比率
20歳未満						
20歳以上～25歳未満						
25歳以上～30歳未満	2	13			2	6
30歳以上～35歳未満	1	6			1	3
35歳以上～40歳未満	2	13	4	21	6	17
40歳以上～45歳未満	1	6	6	32	7	20
45歳以上～50歳未満	1	6			1	3
50歳以上～55歳未満	3	19	2	11	5	14
55歳以上～60歳未満	6	38	4	21	10	29
60歳以上～			3	16	3	9
合 計	16	100	19	100	35	100


年齢別職員構成

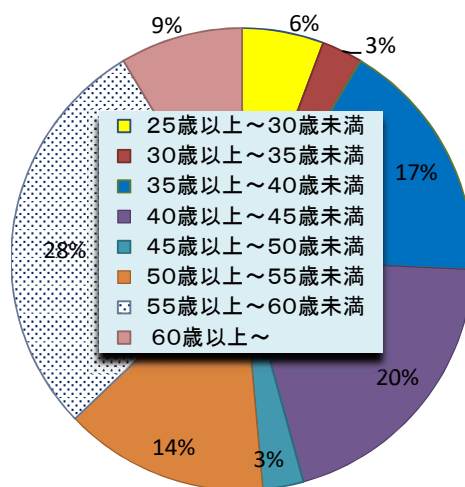

5. 勤続年数別職員構成

年 数 別	事務職員		技術職員		合計	
	職員数	比率	職員数	比率	職員数	比率
1年未満	1	6			1	3
1年以上～ 5年未満	5	31	5	26	10	29
5年以上～10年未満	1	6	3	16	4	11
10年以上～15年未満	1	6	2	11	3	9
15年以上～20年未満	2	13	1	5	3	9
20年以上～25年未満	2	13	3	16	5	14
25年以上～30年未満	3	19	3	16	6	17
30年以上～	1	6	2	11	3	9
合 計	16	100	19	100	35	100


勤務年数別職員構成

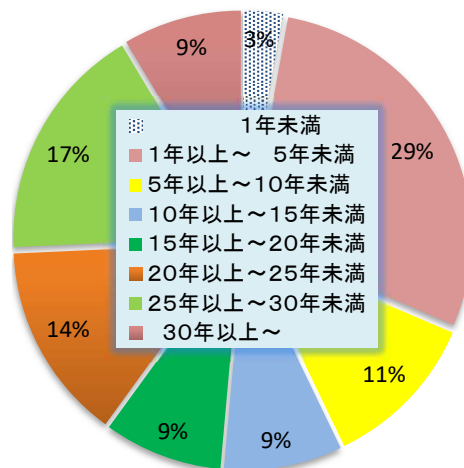

6. 給料別職員構成

年 数 別	事務職員		技術職員		合計	
	職員数	比率	職員数	比率	職員数	比率
15万円未満						
15万円以上～20万円未満	2	13	1	5	3	9
20万円以上～25万円未満	1	6	1	5	2	6
25万円以上～30万円未満	3	19	3	16	6	17
30万円以上～35万円未満			5	26	5	14
35万円以上～40万円未満	7	44	7	37	14	40
40万円以上～45万円未満	3	19	2	11	5	14
45万円以上～						
合 計	16	100	19	100	35	100

給与別職員構成

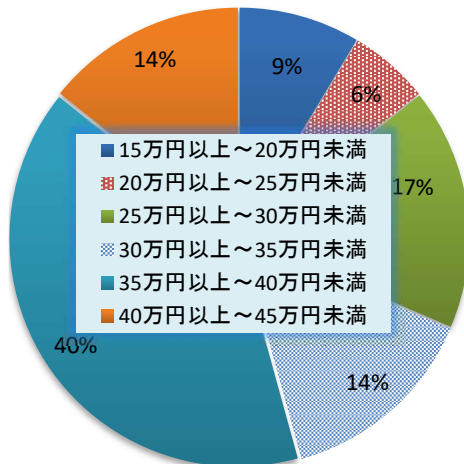

第 3 章 施 設

第 3 章 施 設

1. 主要施設所在地

施 設 名				所 在 地	電 話
事 務 所	部 長 室			平良字西里794-3	0980-72-2654
	水 道 総 務 課				〃 2653
	水 道 会 計 課				〃 4262
	工 務 課				〃 2651
					〃 2652
袖 山 浄 水 場				平良字西里1472-3	0980-72-2650
白 川 田 貯 水 池				平良字東仲宗根添3223-1	
狩 俣 ポ ン プ 場				平良字狩俣4417-1	
加 治 道 浄 水 場				城辺字比嘉978	0980-77-4704
下 北 増 圧 ポ ン プ 場				城辺字下里添785-5	
前 浜 ポ ン プ 場				下地字与那覇1199	
久 松 ポ ン プ 場				平良字久貝458-31	

2. 水 源 施 設

名 称	位 置	種 別	員数	摘 要
山 川 水 源 地	平良字東仲宗根添3155	止 水 壁	1	H=2.5m L=53.17m H=5.6m L=9m H=4.9m L=6.0m
		量 水 井	1	鉄筋コンクリート3.10×5.80×2.00
		取 水 管	1	RCP φ=600 L=60m Q=400 L=123m
		接 合 井	3	鉄筋コンクリート
白 川 田 水 源 地	平良字東仲宗根添3155	ポ ン プ 室	1	鉄筋コンクリート340.7㎡
		ポ ン プ 井	1	鉄筋コンクリート430㎡
		取 水 井	1	8.5×5.2×4.4=194㎡
		量 水 井	1	3.2×7.05×2.8=63㎡
		取 水 管	1	DCIP φ=600 L=96.8m
袖 山 水 源 地	平良字西里1472-81	ポ ン プ 室	1	鉄筋コンクリート44.82㎡
		井 戸	2	ケーシングパイプ φ=300×2 深さ35m
前 福 水 源 地	平良字西仲宗根1623-1	ポ ン プ 室	1	鉄筋コンクリート 8.0×6.2=49.6㎡
		井 戸	1	ケーシングパイプ φ=400 深さ40m
西 底 原 水 源 地	平良字東仲宗根添1025-4	ポ ン プ 室	1	鉄筋コンクリート 8.0×6.2=49.6㎡
		井 戸	1	ケーシングパイプ φ=300 深さ35m
高 野 水 源 地	平良字東仲宗根添1166-586	ポ ン プ 室	1	鉄筋コンクリート 8.0×6.2=49.6㎡
		井 戸	2	ケーシングパイプ φ=400・250 深さ36m
大 野 水 源 地	平良字東仲宗根添1166-288	ポ ン プ 室	1	鉄筋コンクリート 4.5×3.5=15.75㎡
		井 戸	1	ケーシングパイプ φ=300 深さ28.5m
ニ ャ ー ツ 水 源 地	平良字東仲宗根782-6	ポ ン プ 室	1	鉄筋コンクリート 7.0×10.0=70.0㎡
		井 戸	2	ケーシングパイプ φ=300・400 深さ43m
底 原 水 源 地	平良字東仲宗根968-3	ポ ン プ 室	1	鉄筋コンクリート 7.0×11.0=77.0㎡
		井 戸	2	ケーシングパイプ φ=300・400 深さ50.7m
添 道 水 源 地	平良字西仲宗根1282-5	ポ ン プ 室	1	鉄筋コンクリート 77.0㎡
		井 戸	2	ケーシングパイプ φ=400×2 深さ59.0m
東 添 道 水 源 地	平良字西仲宗根1555-8	ポ ン プ 室	1	鉄筋コンクリート 120.21㎡
		井 戸	2	ケーシングパイプ φ=350×2 深さ69.0m
加 治 道 水 源 地	城辺字比嘉978	ポ ン プ 室	1	鉄筋コンクリート 134.48㎡
		井 戸	2	ケーシングパイプ φ=300×2 深さ37m
加 治 道 西 水 源 地	城辺字比嘉540-4	ポ ン プ 室	2	鉄筋コンクリート 1.9×2.4=4.56㎡
		井 戸	2	ケーシングパイプ φ=300×2 深さ35.88m

3. 貯水施設

名 称	位 置	種 別	員 数	摘 要
白川田貯水池	平良字 東仲宗根添	P . C 造 丸 型	2	P.Cコンクリート丸型
		フ ラ ッ ト 屋 根		φ 92.7×H6000 40,000m ³ ×2基
		取 水 管	405	DIP φ 500 L=405m
		調 整 池	1	鉄筋コンクリート造 90×10.0×2.70m
		地 下 排 水 管	595.6	150 φ透水管 L=595.6m
		ホ°ンフ°井周り配管	1	一式
		流 入 管	148	DCIP φ 500 L=148m
		流 出 管	53	DCIP φ 500 L= 53m
		越 流 管	322	DCIP φ 350 L=322m
		送 水 ポ ン プ	2	陸上ポンプ片吸い込み式 Q=3.0m ³ /m H=60m 45Kw
		排 水 ポ ン プ	1	水中プレートレス D=250 Q=6.0m ³ /m H=75m
		圧 力 タ ン ク	1	銅板製 φ 1,224×2.3m ²
		電 気 室	1	鉄筋コンクリート造 78.0m ²
		電 気 装 置	1	低圧受電盤1、直流電源盤1、計装盤1
				動力制御盤1、遠方監視制御盤1

4. 導水施設

位 置	種 別	員数	摘 要
袖 山 水 源 地	1号水中ポンプ	1	D=150 Q=2.0m ³ /m H=65m 45kw
	2号水中ポンプ	1	D=150 Q=1.5m ³ /m H=65m 37kw
	電 気 装 置	1	受配電盤 1 現場指示計盤 1
白 川 田 水 源 地	取 水 ポ ン プ	3	横軸両吸込うず巻きポンプ D=250×200 Q=7.0m ³ /m H=69m 132kw 60Hz
	機 械 設 備		電動仕切弁φ250 圧力タンク4.0m ³ 1
	電 気 設 備		高压引込盤 1 受電盤 1 主変圧器盤 1 電源切換盤 1 低压分岐盤 1 ポンプ盤(インバーター制御) 3
	計 装 設 備	1	電磁流量計φ300 1 計装テレメーター盤 1 UPS装置 1
	非 常 用 設 備	エンジン	SA6D170-A 出力600PS 冷却方式ラジエーター式
		発 電 機	3相 出力500kva 電圧440V 周波数60Hz 回転式1800PS
前 福 水 源 地	水 中 ポ ン プ	1	D=125 Q=2.0m ³ /m H=85m 45kw
	電 気 装 置	1	自動制御装置 1 受電盤 1 低压盤 1 現場計装盤 1
	非 常 用 設 備		
西 底 原 水 源 地	水 中 ポ ン プ	1	D=125 Q=1.8m ³ /m H=80m 37KW 220V 131A 60Hz
	電 気 装 置	1	ポンプ盤 1 現場指示計盤 1
高 野 水 源 地	1号水中ポンプ	1	D=150 Q=3.0m ³ /m H=80m 45KW 220V 195A 60Hz
	2号水中ポンプ	1	D=125 Q=2.0m ³ /m H=80m 45KW 220V 160A 60Hz
	電 気 装 置	1	受電装置 1 計装設備 1
	非 常 用 設 備	エンジン	106Kw 1,800RPM 冷却方式:ラジエーター式
		発 電 機	出力:95KVA(76kw) 電圧:200V 電流:274A 60Hz
大 野 水 源 地	水 中 ポ ン プ	1	D=150 Q=2.6m ³ /m H=70m 3,600RPM 60KW 200V 45KW
	電 気 装 置	1	取水ポンプ盤 1 計装テレメーター盤(子局) 受電盤 1
	計 装 設 備	1	電磁流量計 φ150 1 水位計 1
ニ ャ ー ツ 水 源 地	1号水中ポンプ	1	D=φ150 Q=3.0m ³ /m H=75m 55KW 220V 60Hz 3,600RPM
	2号水中ポンプ	1	D=φ150 Q=2.0m ³ /m H=75m 45KW 220V 60Hz 3,600RPM
	機 械 設 備	1	電動仕切弁φ150 0.75KW 1 圧力タンク3.0m ³ 1
	電 気 設 備	1	高压受電盤 1 水中ポンプ盤 2 計装テレメーター盤(子局)1
	計 装 設 備	1	電磁流量計φ200 1 水位計 1
	非 常 用 設 備	エンジン	直列立形4サイクルディーゼル 6気筒 180PS 1,800RPM
		発 電 機	3相 電圧220V 60Hz 1,800RPM 150KVA
底 原 水 源 地	1号水中ポンプ	1	D=φ150 Q=3.0m ³ /m H=75m 55KW 220V 60Hz 3,600RPM
	2号水中ポンプ	1	D=φ150 Q=2.0m ³ /m H=75m 45KW 220V 60Hz 3,600RPM
	機 械 設 備	1	電動仕切弁φ150 0.75KW 1 圧力タンク1.2m ³ 1
	電 気 設 備	1	高压受電盤 1 水中ポンプ盤 2 計装テレメーター盤(子局)1
	計 装 設 備	1	電磁流量計φ200 1 水位計 1
	非 常 用 設 備	エンジン	直列立形4サイクルディーゼル 6気筒 180PS 1,800RPM
		発 電 機	3相 電圧220V 60Hz 1,800RPM 150KVA

位 置	種 別	員数	摘 要			
添道水源地	水 中 ポ ン プ	2	PMU形水中深井戸ポンプ D=150 Q=2.0m ³ /m H=76.0m 45KW 200V 60Hz 3,600rpm			
	機 械 設 備		電動バタフライ弁 φ250 2台 圧力タンク 1.2m ³ 1台			
	電 気 装 置		高圧引込盤 1面 受電盤 1面 変圧器盤 1面 取水ポンプ盤(インバータ制御) 2面			
	計 装 設 備		電磁流量計 φ200 1台 計装テレメーター 2面(親・子) 静電容量式水位 計2台			
	非 常 用 発 電 機		ディーゼル発電機1台 KSDE-75E 80KVA 200V 60Hz 3,600rpm 冷却方式ラジエーター式			
東添道水源地	水 中 ポ ン プ	2	PMU形水中深井戸ポンプ D=150 Q=3.0m ³ /m H=67.0m 55KW 200V 60Hz 3,600rpm D=150 Q=2.0m ³ /m H=64.0m 45KW 200V 60Hz 3,600rpm			
	機 械 設 備		外ねじスルース弁 φ150 2台 急閉チェック弁 2台 圧力タンク 1.2m ³			
	電 気 装 置		高圧引込盤 1面 受電盤 1面 変圧器盤 1面 取水ポンプ盤(インバータ制御) 2面			
	計 装 設 備		電磁流量計 φ150 1台 計装テレメーター 2面(親・子) 投込式水位計 2台			
	非 常 用 発 電 機		ディーゼル発電機1台 QSDE-115J 135KVA 220V 60Hz 1,800rpm 冷却方式ラジエーター式			
加治道水源地	1 号 水 中 ポ ン プ	1	D=125 Q=2.0m ³ /m H=45m 3,450RPM 60Hz 200V 22KW			
	2 号 水 中 ポ ン プ	1	D=125 Q=2.0m ³ /m H=45m 2,450RPM 60Hz 200V 22KW			
	電 気 装 置		高圧引込盤 1 高圧受電盤 1 取水ポンプ盤2 変圧器盤2			
	非 常 用 発 電 機	エンジン1 発電機 1	EP100T 出力180PS 冷却方式ラジエーター式 3相 電圧150KVA 440v 60Hz 1,800RPM			
加 治 道 西 水 源 地	1 号 水 中 ポ ン プ	1	D=φ125 Q=2.0m ³ /m H=40m 3,600RPM 60Hz 440V 22KW			
	2 号 水 中 ポ ン プ	1	D=φ125 Q=2.0m ³ /m H=40m 3,600RPM 60Hz 440V 22KW			
	計 装 設 備		電磁流量計 φ150mm 水位計 2			
導 水 管	No	口 径	延 長	管 種	摘 要	布設年度
宮古島	1	250	292.0	ダクタイル 鋳鉄管	袖山水源地～袖山浄水場	1972(S.47)
	2	500	3,533.0	ダクタイル 鋳鉄管	白川田水源地～袖山浄水場	1990(H. 2)
	3	400	2,349.0	鋳 鉄 管	白川田水源地～袖山浄水場	1964(S.39)
	4	300	1,270.0	ダクタイル 鋳鉄管	前福水源地～袖山浄水場	1977(S.52)
	5	300	331.0	ダクタイル 鋳鉄管	西底原水源地～前福導水管	1981(S.56)
	6	300	2,593.0	ダクタイル 鋳鉄管	高野水源地～袖山浄水場	1984(S.59)
	7	300	1,788.0	ダクタイル 鋳鉄管	ニヤーツ水源地～袖山浄水場	1994(H. 6)
	8	400	751.9	ダクタイル 鋳鉄管	ニヤーツ水源地～袖山浄水場	1994(H. 6)
	9	300	45.0	ダクタイル 鋳鉄管	底原水源地～ニヤーツ導水管	1994(H. 6)
	10	200	115.0	鋳 鉄 管	加治道浄水場内	1965(S.40)
	11	200	412.0	ダクタイル 鋳鉄管	加治道西水源～加治道浄水場	1995(H. 7)
	12	500	477.0	ダクタイル 鋳鉄管	白川田貯水池～白川田導水管	1989(H. 1)
	13	300	1,387.8	ダクタイル 鋳鉄管	添道水源～ニヤーツ導水管	2001(H.13)
	14	300	90.7	ダクタイル 鋳鉄管	東添道水源～ニヤーツ導水管	2018(H.30)
小 計			15,435.4			
合 計			15,435			

5. 浄水施設

位 置	種 別	員数	摘 要
袖山浄水場	中 央 管 理 棟		RC造り 2階建 床面積=633.29m ³ 1階 床面積(A=295.90m ³) 2階 床面積(A=337.39m ³)
	資 料 室	1	鉄筋コンクリート平屋 67.96m ²
	計装設備	1	1 CRT装置 2 12 水処理計基盤(既設系) 1
			2 ハードコピー 1 13 中央分電盤 1
			3 場外系制御装置 2 14 白川田貯水池テレメーター盤 1
			4 場内系制御装置 2 15 ニャーツ底原テレメーター盤 1
			5 場外系制御装置 1 16 大野水源テレメーター盤 1
			6 情報処理装置 1 17 加治道、加治道西水源テレメーター盤 1
			7 中央分電盤 1 18 久松、山中配水池テレメーター盤 1
			8 ミニUPS 1 19 白川田水源地テレメーター盤 1
			9 次亜注入ポンプ盤 1 20 久松ポンプ場テレメーター盤 1
			10 監視盤 2 21 東添道水源地テレメーター盤 1
			11 インターフェース盤 3
袖山浄水場	電 気 設 備		自動切替盤 1 受電盤 1 低圧動力電灯盤 1 電源盤 2 ポンプ盤
	次 亜 注 入 設 備	1	1 次亜注入ポンプ 浄水池向け ダイアフラムポンプ 40～1800cc/mim×0.4kw 2 配水池向け ダイアフラムポンプ 20～1200cc/mim×0.2kw 2 2 次亜貯留槽 PE製円筒タンク 容量 15m ³ ×2基
	緩 速 濾 過 池	8	17.25×27.6×2.6 流速7m/日 26,661m ³ /日
	〃	1	23.7×20.0×2.6 流速7m/日 3,300m ³ /日
	着 水 井	3	鉄筋コンクリート(2.5×5.5×2.0) 2 (6.1×2.9×3.82) 1
	袖 山 PC 浄 水 池	1	PCコンクリート(丸形) 27×7 4,000m ³ HWL=51.2m LWL=44.2m
加治道浄水場	緩 速 濾 過 池	2	13.5×21.4×2.4 流速7m/日 4,044m ³ /日
	緩速濾過池予備	1	〃 〃 2,022m ³ /日
	浄 水 池	1	RC造り 12.65×6.5×4.9=200m ³
	次亜生成滅菌室	1	鉄筋コンクリート 35m ²
	次 亜 注 入 設 備	4	100～200cc/0.2kw
	計 装 設 備		計装テレメーター盤(子局) 補機盤

5-1. 袖山浄水場硬度低減化施設

機 器 名 称	主 仕 様	数 量
硬 度 処 理 反 応 塔 (ペレットリアクター)	形 式: 流動床式晶析軟化法(ペレット法) 塔 形: $\phi 2300\text{mm}$ 高 さ: 約 8300mm 材 質: SUS 304 処理能力: $10,000\text{m}^3/\text{基}\cdot\text{日}$	4基
種 ペ レ ッ ト 製 造 装 置	形 式: 乾式粉碎器(ナイフハンマー) 処理能力: $250\text{kg}/\text{時}$ 製品粒度: 約 $250\mu\text{m}$	1基
種 ペ レ ッ ト 洗 浄 装 置	形 式: 円筒型 形状寸法: $\phi 600\text{mm}\times\text{H}3000$ 材 質: SUS 304	2基
生成ペレット貯留ホッパ	形 式: 円筒・円錐形ホッパ 形状寸法: $\phi 3200\text{mm}\times\text{H}4300$	1基
処 理 水 送 水 ポ ン プ	形 式: 横軸両吸込渦巻きポンプ 送 水 量: 約 $10,000\text{m}^3/\text{台}\cdot\text{日}$ 電 動 機: $45\text{KW}/\text{台}$	4台
苛 性 ソ ー ダ 貯 留 槽	容 量: 16m^3 材 質: FRP	2基
硫 酸 貯 留 槽	容 量: 10m^3 材 質: FRP	1基
非 常 用 発 電 機	形 式: ガスタービンエンジン 発電容量: 750KVA	1台
電 機 設 備	引込受電盤1、電源切換盤1、主変圧器盤1、低圧分岐盤1、送水ポンプ盤2 補機盤6、UPS装置1、現場操作盤19	
計 装 設 備	中央監視装置1、シーケンサ盤3、監視操作盤(浄水場中央管理棟設置)3	
名 称	構 造	規 格
硬 度 処 理 棟	RC造り	延床面積: 1186.34m^2
種 ペ レ ッ ト 製 造 棟	RC造り	延床面積: 89.52m^2
ポ ン プ 井	RC造り	容 量: 600m^3
着 水 井	RC造り	容 量: 31m^3
分 水 井	RC造り	容 量: 31m^3
流 入 流 出 管	DCIP $\phi 700$ 、 $\phi 600$:	211m
法 面	フリーフレーム工法 面積: $2,010\text{m}^2$	
フ ェ ン ス	亜鉛溶融メッキ仕上げ: 287m	

5-2. 加治道浄水場硬度低減化施設

機 器 名 称	主 仕 様	数 量
硬 度 処 理 反 応 塔 (ペレットリアクター)	形 式: 流動床式晶析軟化法(ペレット法) 塔 形: $\phi 1200\text{mm}$ 高 さ: 約 7200mm 材 質: SUS 304 処理能力: $2,500\text{m}^3/\text{基}\cdot\text{日}$	3基
種 ペレット洗 浄 装 置	形 式: 円筒型 処理能力: $\phi 300\text{mm}\times\text{H}4000\text{mm}$ 製品粒度: アクリル樹脂(一部SUS)	1基
生成ペレット貯留ホッパ	形 式: 鋼板製ホッパー(下部排出式) 形状寸法: $\phi 1900\text{mm}\times\text{H}4400$	1基
苛 性 ソーダ 貯 留 槽	容 量: 8.0m^3 材 質: ポリエチレン製	1基
硫 酸 貯 留 槽	容 量: 3.0m^3 材 質: ポリエチレン製	1基
電 機 設 備	補機盤3、動力盤1、電灯分電盤1、現場操作盤1	
計 装 設 備	シーケンサー盤1、監視操作盤2、計装盤1	
名 称	構 造 規 格	
硬 度 処 理 棟	RC造り 延床面積: 376.94m^2	
原 水 槽	RC造り 延床面積: 51.8m^2	
P H 調 整 槽	RC造り 容 量: 39.0m^3	
流 入 流 出 管	流入管 $\phi 200\sim\phi 300$ L=147.1m 流出管 $\phi 200\sim\phi 300$ L=123.5m	

6. 送水施設

位 置	種 別	員数	摘 要			
袖山浄水場	東 部 ポ ン プ (1 号 、 2 号)	2	片吸込うず巻ポンプ D=φ200×φ150 Q=φ5.3m ³ /m 440V 132KW H=87m			
	北 部 ポ ン プ (1 号 、 2 号)	2	片吸込うず巻ポンプ D=φ200×φ150 Q=φ6.1m ³ /m 440V 75KW H=50m			
	ポンプ室	1	RC造り 地上1階 地下1階 延床面積A=164m ²			
	浄水場東・北部送 水施設改良工事 (高圧受変電設備)		引込受電盤 1面 主変圧器盤 1面 低圧動力電灯盤 1面 東・北部ポンプ盤 各2面 電磁流量計φ300 2台			
加治道浄水場	1 号 ポ ン プ	1	多段渦巻きポンプ3段 Q=2.0m ³ /m D=φ125 H=71m 45KW			
	2 号 ポ ン プ	1	多段渦巻きポンプ3段 Q=3.0m ³ /m D=φ150 H=71m 55KW			
	計 装 設 備		送水ポンプ盤2			
下北増圧 ポンプ室	ポ ン プ 室	1	鉄筋コンクリート 6.6×3.6×2.4			
	増 圧 ポ ン プ	2	電動機直結ブースターポンプユニット D=φ100 Q=φ1.2m ³ /m H=45m15KW			
	計 装 設 備		ポンプ動力盤1、ポンプ動力回路2、電動弁操作回路1、電力量計盤1、送水流量計1、 積算計1 流量記録計1、自動運転設定器1、短時間電動バタフライ弁1			
久松ポンプ場	送 水 ポ ン プ	2	陸上渦巻きポンプ D=φ150×φ125 Q=2.54m ³ /m H=73m 55Kw			
	ポ ン プ 室	1	RC造り 床面積A=133m ² 吐出電動弁φ150×2基、非常用ディーゼル発電機			
	計 装 設 備		加圧ポンプ現場操作盤1面、流量計(電磁式、防浸形)φ150×1台、圧力伝送器×2台			
	口 径	延 長		管 種	摘 要	布設年度
送水管	75	3,700	3,700	ポリエチレン管	狩俣～大神配水池	1980(S.55)
	125	1,420	5,253	NEWPLP	前浜～来間配水池	1974(S.49)
	150	920		DCIP	前浜～来間配水池	2017(H.29)
	150	2,853		NEWPLP	狩俣～池間配水池	1974(S.49)
	150	60		DCIP	狩俣～池間配水池	2017(H.29)
	200	172	9,398	DIP	加治道浄水場～与並武岳PCタンクへの道路まで	1981(S.56)
	150	268		〃	与並武岳PCタンク手前道路～与並武岳PCタンク	1981(S.56)
	200	3,376		〃	伊良部地区内	
	300	800		〃	袖山浄水場～二重越PCタンク	1979(S.54)
	350	4,010		〃	袖山浄水場～野原PCタンク	1979(S.54)
	200	335		〃	加治道浄水場～与並武岳PCタンク	1993(H. 5)
	300	437		〃	久松ポンプ場～伊良部大橋	2011(H.23)
	300	14	764	SUS	伊良部大橋	2009(H.21)
	300	750		ポリエチレン管	伊良部大橋	2010(H.22)
	300	1,835	1,835	〃	伊良部大橋	2011(H.23)
	300	1,482	1,986	DCIP	伊良部大橋	2012(H.24)
	300	504		ポリエチレン管	伊良部大橋	2012(H.24)
	300	234	1,385	DCIP	伊良部大橋～牧山	2013(H.25)
	300	1,138		ポリエチレン管	伊良部大橋	2013(H.25)
	300	13		SUS	伊良部大橋	2013(H.25)
	300	541	1,365	DCIP	伊良部大橋～牧山	2014(H.26)
	300	821		ポリエチレン管	伊良部大橋～牧山	2014(H.26)
	300	3		SUS	伊良部大橋～牧山	2014(H.26)
	計	25,686				

7. 配水施設

位 置	種 別	員数	摘 要	備 考
平良市街地系	袖山配水池	1	PCコンクリート(丸形) 30.2×7.0 $5,000\text{m}^3$ HWL=51.2m LWL=44.2m	
	久松配水池	1	PCコンクリート(丸形) 12.0×5.1 570m^3 HWL=41.0m LWL=36.0m	
	二重越配水池	1	PCコンクリート(丸形) 18.0×6.0 $1,500\text{m}^3$ HWL=71.0m LWL=65.0m	
	二重越第2配水池	1	PCコンクリート(丸形) 14.3×10.0 $1,600\text{m}^3$ HWL=76.0m LWL=66.0m	
平良北部系	狩俣配水池	1	鉄筋コンクリート(丸形) 7.3×3.6 120m^3 HWL=36.9m LWL=34.14m	
	池間配水池	1	PCコンクリート(丸形) 8.8×6 360m^3 HWL=30.0m LWL=24.0m	
	狩俣ポンプ場	2	鉄筋コンクリート(丸形) $3 \times 5=15\text{m}^2$	
	狩俣ポンプ	1	多段渦巻ポンプ D=40 Q=0.1 m^3/m H=40m 2.2KW 予備エンジンヤンマーディーゼル 3.4PS 1,800RPM	
	大神配水池	1	鉄筋コンクリート(丸形) 4.0×5.0 60m^3 HWL=51.0m LWL=46.0m	
平良東部系	山中配水池	1	PCコンクリート(丸形) 12.0×9.0 $1,000\text{m}^3$ HWL=91.0m LWL=82.0m	
上野	野原配水池	1	PCコンクリート 18.0×10.0 $2,540\text{m}^3$ HWL=100.0m LWL=90.0m	
下地	宮星配水池	1	PCコンクリート(丸形) 12.7×4.0 500m^3 HWL=54.6m LWL=50.6m	
	前浜ポンプ場	1	鉄筋コンクリート平屋 $3.6 \times 3.6=12.96\text{m}^2$	
	前浜ポンプ井	1	鉄筋コンクリート $4.6 \times 4.6 \times 2=42\text{m}^3$	
	前浜ポンプ場	1	ヒューガルポンプ D=50 Q=0.35 m^3/m H=55m 7.5KW 200V 1,800RPM 予備エンジン1台 10HP	
	来間配水池	1	PCコンクリート(丸形) 7.0×2.6 100m^3 HWL=53.6m LWL=51.0m	
城辺	与並武岳配水池	1	PCコンクリート(丸形) $10.0 \times H=13.20$ $1,000\text{m}^3$ HWL=122.0m LWL=109.0m	
	新城配水池	1	PCコンクリート(丸形) 10.2×5.0 400m^3 HWL=87.0m LWL=82.0m	
伊良部	第3配水池(南区)	1	250m^3 鉄筋コンクリート HWL=42.8m LWL=39.7m	(減圧槽)
	第5配水池(北区)	1	800m^3 PCコンクリート HWL=70.2m LWL=60.0m	
	牧山配水池	1	PCコンクリート(丸形) 15.5×7 $1,300\text{m}^3$ HWL=89.5m LWL=82.5m 緊急遮断弁 $\phi 300$	H26年度 竣工

8. 宮古島市配水管延長(総括)

単位(m)

管 種 口径mm	ダクタイル鋳鉄管 (支管)	ダクタイル鋳鉄管 (本管)	鋳鉄管(支管)	塩化ビニール管	ポリエチレン管	合計
φ 50以下	0	0	0	136,833	10,121	146,954
75	21,711	0	2,391	342	0	24,444
100	131,165	0	14,293	1,253	0	146,711
125	106	0	10	0	0	116
150	50,562	0	5,837	0	0	56,399
200	53,302	0	7,058	0	0	60,360
250	9,754	0	755	0	0	10,509
300	10,283	0	950	0	0	11,233
350	8,124	0	1,122	0	0	9,246
400	3,068	0	416	0	0	3,484
500	0	1,024	0	0	0	1,024
600	0	1,067	0	0	0	1,067
合計	288,075	2,091	32,832	138,428	10,121	471,546

(1)平良地区

管 種 口径mm	ダクタイル鋳鉄管 (支管)	ダクタイル鋳鉄管 (本管)	鋳鉄管(支管)	塩化ビニール管	ポリエチレン管	合 計
φ 50以下	0	0	0	41,269	837	42,106
75	6,933	0	1,057	42	0	8,032
100	69,099	0	7,744	1,253	0	78,096
125	0	0	0	0	0	0
150	25,567	0	2,560	0	0	28,127
200	23,998	0	3,416	0	0	27,414
250	5,732	0	266	0	0	5,998
300	6,068	0	723	0	0	6,791
350	6,729	0	932	0	0	7,661
400	200	0	22	0	0	222
500	0	1,024	0	0	0	1,024
600	0	1,067	0	0	0	1,067
合計	144,326	2,091	16,720	42,564	837	206,538

(2)城辺地区

管 種 口径mm	ダクタイル鋳鉄管 (支管)	ダクタイル鋳鉄管 (本管)	鋳鉄管(支管)	塩化ビニール管	ポリエチレン管	合 計
φ 50以下	0	0	0	34,169	7,986	42,155
75	5,176	0	705	0	0	5,881
100	26,548	0	3,012	0	0	29,560
125	53	0	7	0	0	60
150	9,991	0	1,362	0	0	11,353
200	10,902	0	1,486	0	0	12,388
250	0	0	0	0	0	0
300	550	0	67	0	0	617
350	1,395	0	190	0	0	1,585
400	0	0	0	0	0	0
500	0	0	0	0	0	0
600	0	0	0	0	0	0
合計	54,615	0	6,829	34,169	7,986	103,599

(3)下地地区

管 種 口径mm	ダクトイル鋳鉄管 (支管)	ダクトイル鋳鉄管 (本管)	鋳鉄管(支管)	塩化ビニール管	ポリエチレン管	合 計
φ 50以下	0	0	0	20,378	337	20,715
75	2,560	0	35	300	0	2,895
100	10,418	0	893	0	0	11,311
125	0	0	0	0	0	0
150	6,501	0	826	0	0	7,327
200	2,182	0	25	0	0	2,207
250	1,708	0	232	0	0	1,940
300	0	0	0	0	0	0
350	0	0	0	0	0	0
400	2,868	0	394	0	0	3,262
500	0	0	0	0	0	0
600	0	0	0	0	0	0
合計	26,238	0	2,405	20,678	337	49,658


(4)上野地区

管 種 口径mm	ダクトイル鋳鉄管 (支管)	ダクトイル鋳鉄管 (本管)	鋳鉄管(支管)	塩化ビニール管	ポリエチレン管	合 計
φ 50以下	0	0	0	16,493	961	17,454
75	2,684	0	0	0	0	2,684
100	8,930	0	929	0	0	9,859
125	53	0	3	0	0	56
150	2,011	0	204	0	0	2,215
200	7,118	0	970	0	0	8,088
250	426	0	0	0	0	426
300	0	0	0	0	0	0
350	0	0	0	0	0	0
400	0	0	0	0	0	0
500	0	0	0	0	0	0
600	0	0	0	0	0	0
合計	21,222	0	2,106	16,493	961	40,782

(5)伊良部地区

管 種 口径mm	ダクトイル鋳鉄管 (支管)	ダクトイル鋳鉄管 (本管)	鋳鉄管(支管)	塩化ビニール管	ポリエチレン管	合 計
φ 50以下	0	0	0	24,523	0	24,523
75	4,358	0	594	0	0	4,952
100	16,170	0	1,715	0	0	17,885
125	0	0	0	0	0	0
150	6,491	0	885	0	0	7,376
200	9,103	0	1,161	0	0	10,264
250	1,888	0	257	0	0	2,145
300	3,665	0	160	0	0	3,825
350		0	0	0	0	0
400	0	0	0	0	0	0
500	0	0	0	0	0	0
600	0	0	0	0	0	0
合計	41,675	0	4,772	24,523	0	70,970

9. 全島配管、施設概観図

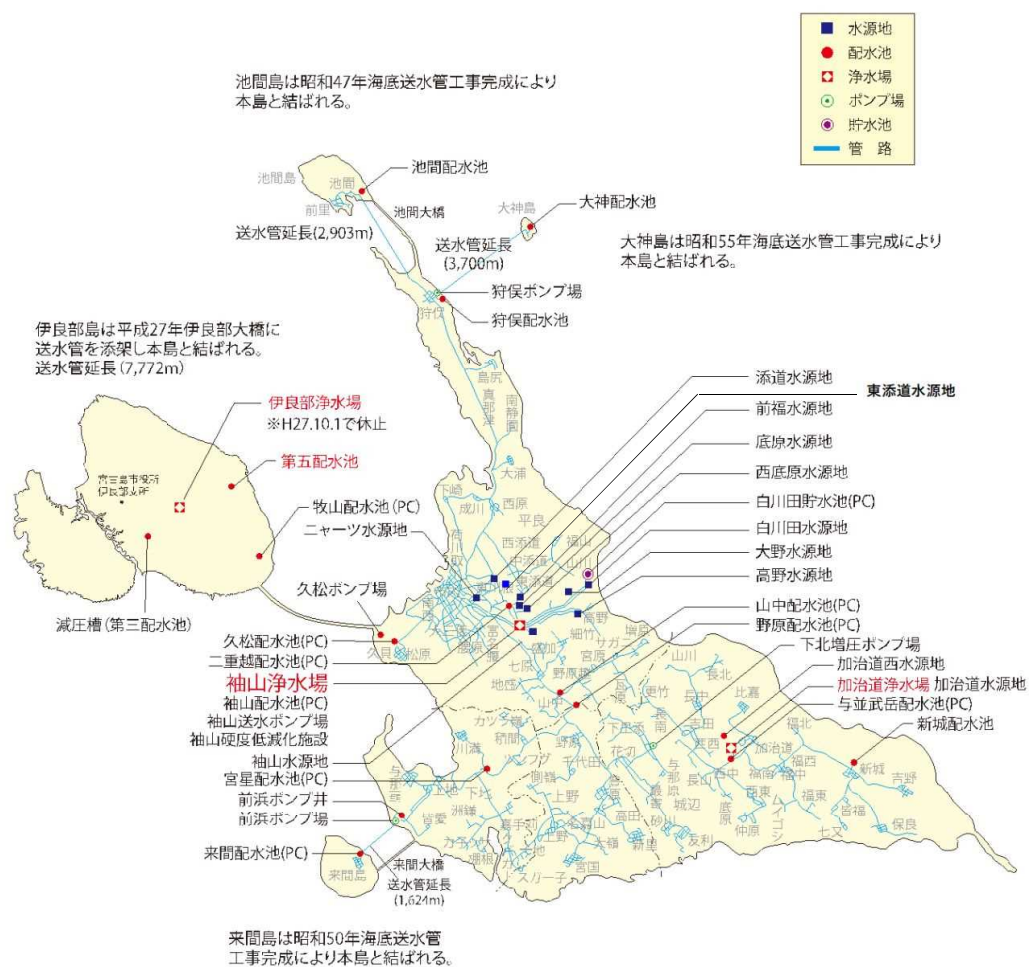

10. 水源地施設耐震化進捗状況

	水源地名	施設能力(m ³ /日)	(開発年度) 基幹改良年度		仕様	ケーシング径 深さ(H)	耐震性	耐震調査 年度
1	白川田水源地	11,250 m ³ /日	1953	S.28	取水ポンプ Q=7.0m ³ /m 132kw H=69.0m 3台 (H10(H11繰越))		○	
2	袖山水源地	2,500 m ³ /日	1972	S.47	鉄筋コンクリート造 2号取水ポンプ Q=1.5m ³ /min 30kw H=65m 1台	φ 300 φ 300 H= 35.0	○	
3	前福水源地	2,000 m ³ /日	1977	S.52	水中ポンプ Q=2.0m ³ /m 45kw H=85m 1台	φ 400 H= 40.0	×	
4	西底原水源地	2,500 m ³ /日	1981	S.56	水中ポンプ Q= 1.8m ³ /min 37kw H=80m 1台	φ 300 H= 35.0	○	H28(2016年)
5	高野水源地	2,000 m ³ /日	1984	S.59	1号取水ポンプ Q=3.0m ³ /min 45kw H=60m 1台	φ 400 φ 250 H= 36.0	○	
			2005	H.17	2号取水ポンプ Q=2.0m ³ /min 45kw H=80m 1台			
6	大野水源地	3,000 m ³ /日	1993	H.5	水中ポンプ Q=2.6m ³ /m 45kw H=70m 1台	φ 300 H= 28.5	○	
7	ニヤーツ水源地	3,000 m ³ /日	1994	H.6	1号水中ポンプ Q=3.0m ³ /m 55kw H=75m 1台 2号水中ポンプ Q=2.0m ³ /m 45kw H=75m 1台	φ 300 φ 400 H= 43.0	○	
8	底原水源地	2,000 m ³ /日	1994	H.6	1号水中ポンプ Q=3.0m ³ /m 55kw H=75m 1台 2号水中ポンプ Q=2.0m ³ /m 45kw H=75m 1台	φ 300 φ 400 H= 50.7	○	
9	添道水源地	1,650 m ³ /日	2001	H.13	取水ポンプ Q=2.0m ³ /m 45kw H=76 2台	φ 400 φ 400 H= 57.0	○	
10	東添道水源地	3,000 m ³ /日	2018	H.30	取水ポンプ Q=3.0m ³ /m 55kw H=67 1台 Q=2.0m ³ /m 45kw H=64 1台	φ 350 φ 350 H= 55.0	○	
11	加治道水源地	3,200 m ³ /日	1965	S.40	1号水中ポンプ Q=2.0m ³ /m 22kw H=45m 1台 2号水中ポンプ Q=2.0m ³ /m 22kw H=40m 1台	φ 300 φ 300 H= 37.0	×	
12	加治道西水源地	1,000 m ³ /日	1995	H.7	1号水中ポンプ Q=2.0m ³ /m 22kw H=40m 1台 2号水中ポンプ Q=2.0m ³ /m 22kw H=40m 1台	φ 300 φ 300 H= 35.9	○	
水源地総容量						37,100 m ³ /日	水源地耐震施設率	85.98%

※水源地耐震施設率(%)=(耐震対策の施されている水源地容量/水源地総容量)×100
→(28,900(m³/日)/34,100(m³/日))×100=84.75(%)

11. 浄水施設耐震化進捗状況

	浄水施設名	施設能力	(開発年度) 基幹改良年度		仕様	日浄水量	耐震性	耐震調査 年度
	袖山浄水場		1953 2005	S.28 H.17			○	
	硬度低減化施設	30,000 m ³ /日	1997	H.9	ペレットリアクターφ 2.3×8.3m 4基 10,000m ³ /日 4基	30,000 m ³ /日	○	
	着水井	滞留時間 1.5 /分間	1997	H.9	11.70×7.35×5.70m 有効容量 V= 31.0m ³		○	
	分水井	滞留時間 1.5 /分間	1997	H.9	11.70×7.35×5.70m 有効容量 V= 31.0m ³		○	
	ろ過池(1～4号)	ろ過速度 7.0 m/日・池	1965	S.40	17.25×27.60×2.6m /池 有効面積 476.1m ²	13,330.8 m ³ /日	×	
	ろ過池(5号)	ろ過速度 7.0 m/日	1977	S.52	17.25×27.60×2.6m /池 有効面積 476.1m ²	3,332.7 m ³ /日	○	
	ろ過池(6号)	ろ過速度 7.0 m/日	1979	S.54	17.25×27.60×2.6m /池 有効面積 476.1m ²	3,332.7 m ³ /日	○	
	ろ過池(7号)	ろ過速度 7.0 m/日	1981	S.56	23.70×20.00×2.6m 有効面積 474.0m ²	3,318.0 m ³ /日	○	H28(2016年)
	ろ過池(8号)	ろ過速度 7.0 m/日	1989	H.1	17.25×27.60×2.6m /池 有効面積 476.1m ²	3,332.7 m ³ /日	○	H28(2016年)
	ろ過池(9号)	ろ過速度 7.0 m/日	2000	H.12	17.25×27.60×2.6m /池 有効面積 476.1m ²	3,332.7 m ³ /日	○	
	浄水池	滞留時間 5.4 時間	1977	S.52	PCコンクリート(丸形) HWL=51.20m LWL=44.20m 有効容量 4,000 m ³		○	
全袖山浄水施設能力						29,980 m ³ /日	袖山浄水施設耐震率	55.53%

※袖山浄水場施設耐震率(%)=(耐震対策の施されている袖山浄水場施設能力/全袖山浄水場施設能力)×100

→(16,649(m³/日)/29,980(m³/日))×100=55.53(%)

	加治道浄水場		1965	S.40			×	
	硬度低減化施設	5,000 m ³ /日	1999	H.11	ペレットリアクターφ 1.2×7.2m 3基 2,500m ³ /日 3基	5,000 m ³ /日	○	
	着水井(原水槽)	滞留時間 30.0 分間	1999	H.11	6.00×5.50×2.00m 有効容量 V= 51.8m ³		○	
	ろ過池	ろ過速度 7.0 m/日・池	1986 1994	S.61 H.5	13.50×21.40×2.4m 有効面積 577.8m ² /池 3池	8,089 m ³ /日	○	
	浄水池	滞留時間 1.3 時間	2000	H.12	鉄筋コンクリート造 HWL=60.52m LWL=57.52m 有効容量 200 m ³		×	
全加治道浄水施設能力						8,089 m ³ /日	加治道浄水施設耐震率	100.0%

※加治道浄水場施設耐震率(%)=(耐震対策の施されている加治道浄水場施設能力/全加治道浄水場施設能力)×100

→(8,089(m³/日)/8,089(m³/日))×100=100(%)

浄水施設耐震率	77.77%
---------	--------

※浄水場施設耐震率(%)=(袖山浄水施設耐震率+加治道浄水施設耐震率)/2

→(55.53(%) + 100(%))/2=77.77(%)

12. 送水施設耐震化進捗状況

	送 水 施 設 名	施設能力	(開 発 年 度) 基 幹 改 良 年 度		仕 様	耐 震 性	耐 震 調 査 年 度
	袖 山 浄 水 場						
	東部ポンプ	Q=5.3 m ³ /分	1989 2005	H.1 H.17	鉄筋コンクリート 132kw H=87m 2台	○	
	北部ポンプ	Q=6.1 m ³ /分	1992 2005	H.4 H.17	鉄筋コンクリート 132kw H=50m 2台	○	
	加 治 道 浄 水 場						
	1号ポンプ	Q=2.0 m ³ /分	1965	S.40	55kw H=71m 1台	×	
	2号ポンプ	Q=3.0 m ³ /分	1965	S.40	45kw H=71m 1台	×	
	久 松 ポ ン プ 場	Q=2.54 m ³ /分・台	2012	H.24	鉄筋コンクリート 3.0×5.0 55kw H=73m 2台	○	
	狩 俣 ポ ン プ 場	Q=0.1 m ³ /分	1980 1998	S.55 H.10	鉄筋コンクリート 3.0×5.0 2.2kw H=40m 1台	×	
	前 浜 ポ ン プ 場	Q=0.35 m ³ /分	1974	S.49	鉄筋コンクリート 3.6×3.6 7.5kw H=55m 1台	×	
	前浜ポンプ井	滞留時間 6.0 時間	1974	S.49	鉄筋コンクリート 4.6×4.6×2.5 H=2.00m 容量 V=4.2 m ³	×	
	下 北 増 圧 ポ ン プ 場	Q=1.2 m ³ /分	1989 2018	H.1 H.30	鉄筋コンクリート 6.6×3.6×2.4 15kw H=45m 2台	○	
全ポンプ所能力					21 m ³ /分	ポンプ所耐震施設率	73.53%

※ポンプ所耐震施設率(%)=(耐震対策の施されているポンプ場能力/全ポンプ場能力)×100

→(15(m³/分)/21(m³/分))×100=73.53(%)

13. 配水施設耐震化進捗状況

		住 所	(開 発 年 度)		仕 様	日 給 水 量	耐 震 性	耐震調査 年 度
			基幹改良年度					
1	袖 山 配 水 池	西里1472-3	1986	S.61	PCコンクリート HWL=51.20m LWL=44.20m 有効容量 5,000 m ³	14,410 m ³ /日	○	H25(2013年)
2	久 松 配 水 池	久貝458-20	1996	H.8	PCコンクリート HWL=41.10m LWL=36.00m 有効容量 570 m ³	421 m ³ /日	○	H25(2013年)
3	二 重 越 配 水 池	東仲宗根968-1	1979	S.54	PCコンクリート HWL=71.00m LWL=65.00m 有効容量 1,500 m ³	4,940 m ³ /日	○	
4	二 重 越 第 2 配 水 池	"	2000	H.12	PCコンクリート HWL=76.00m LWL=66.00m 有効容量 1,600 m ³	2,663 m ³ /日	○	H25(2013年)
5	池 間 配 水 池	池間950	2001	H.13	PCコンクリート HWL=30.00m LWL=24.00m 有効容量 360 m ³	289 m ³ /日	○	
6	狩 俣 配 水 池	狩俣4417-2	1965	S.40	鉄筋コンクリート HWL=36.90m LWL=34.14m 有効容量 120 m ³	405 m ³ /日	×	
7	大 神 配 水 池	大神206	1965	S.40	鉄筋コンクリート HWL=51.00m LWL=46.00m 有効容量 60 m ³	33 m ³ /日	×	
8	山 中 配 水 池	下里3107-911	1996	H.8	PCコンクリート HWL=91.00m LWL=82.00m 有効容量 1,000 m ³	1,393 m ³ /日	○	
9	野 原 配 水 池	野原457-2	1979	S.54	PCコンクリート HWL=100.00m LWL=90.00m 有効容量 2,540 m ³	2,473 m ³ /日	○	H25(2013年)
10	宮 星 配 水 池	上地997-5	1991	H.3	PCコンクリート HWL=54.60m LWL=50.60m 有効容量 500 m ³	3,227 m ³ /日	△ (※レベル2要補強)	H26(2014年)
11	来 間 配 水 池	来間71-2	1983	S.58	PCコンクリート HWL=53.60m LWL=51.00m 有効容量 100 m ³	119 m ³ /日	○	H26(2014年)
12	与 並 武 岳 配 水 池	比嘉988-3	1981	S.56	PCコンクリート HWL=122.00m LWL=109.00m 有効容量 1,000 m ³	3,527 m ³ /日	○	H25(2013年)
13	新 城 配 水 池	新城1124-2	2001	H.13	PCコンクリート HWL=87.00m LWL=82.00m 有効容量 400 m ³	300 m ³ /日	○	
14	第 3 配 水 池	国仲397-2	1983	S.58	鉄筋コンクリート HWL=42.80m LWL=39.75m 有効容量 250 m ³	1,600 m ³ /日	×	
15	第 5 配 水 池	池間添723-2	1993	H.5	PCコンクリート HWL=70.20m LWL=60.00m 有効容量 800 m ³	1,270 m ³ /日	○	H26(2014年)
16	牧 山 配 水 池	池間添923-1	2014	H.26	PCコンクリート HWL=89.50m LWL=82.50m 有効容量 1,300 m ³	720 m ³ /日	○	
配水池総容量						17,100 m ³	配水池耐震施設率	94.56%
日給水総量						37,790 m ³ /日	日給水耐震率	86.07%

※配水池耐震施設率(%)=(耐震対策の施されている配水池容量/配水池総容量)×100

→(16,170(m³)/17,100(m³))×100=94.56(%)

※日給水耐震率(%)=(耐震対策の施されている配水池日給水量/配水池総日給水量)×100


→(32,525(m³/日)/37,790(m³/日))×100=86.07(%)

第4章 浄水統計


第4章 浄水統計

1. 配水量・有収水量分析

(1) 配水量の内訳 (単位: m³)

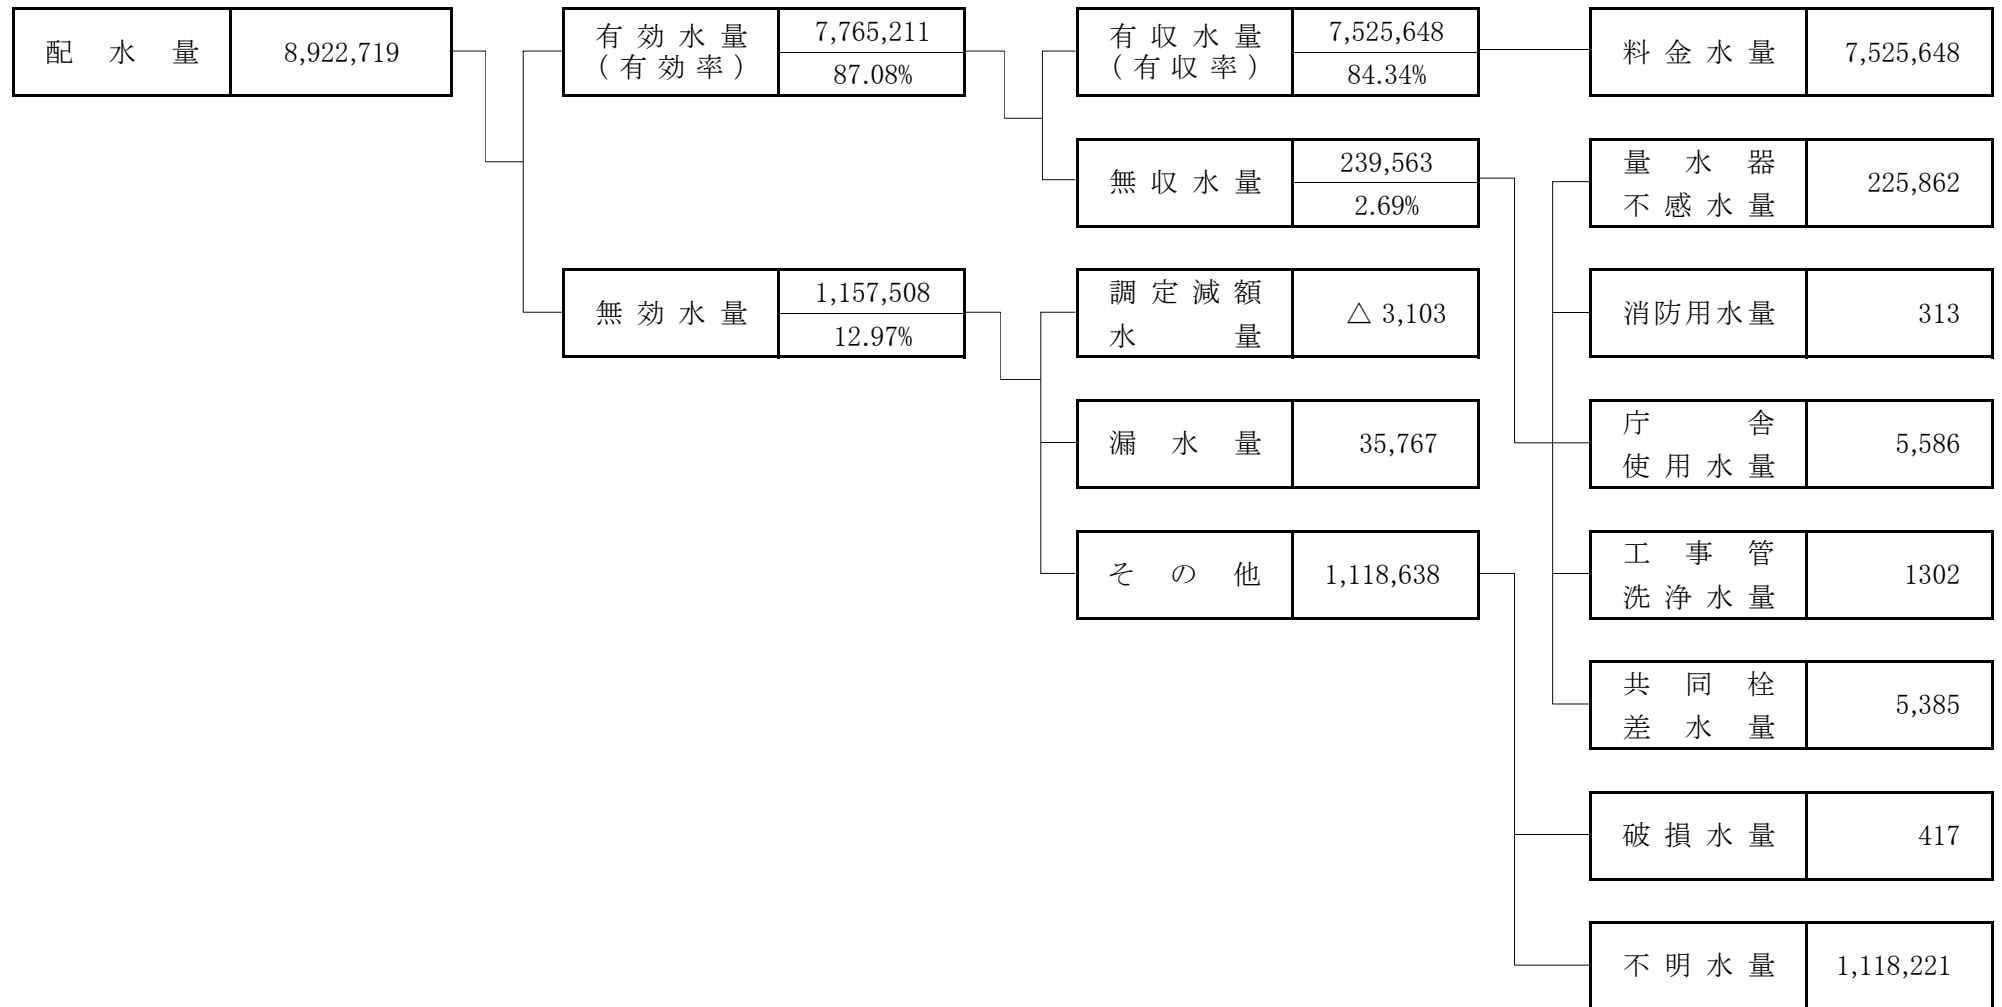


平成 27 年度

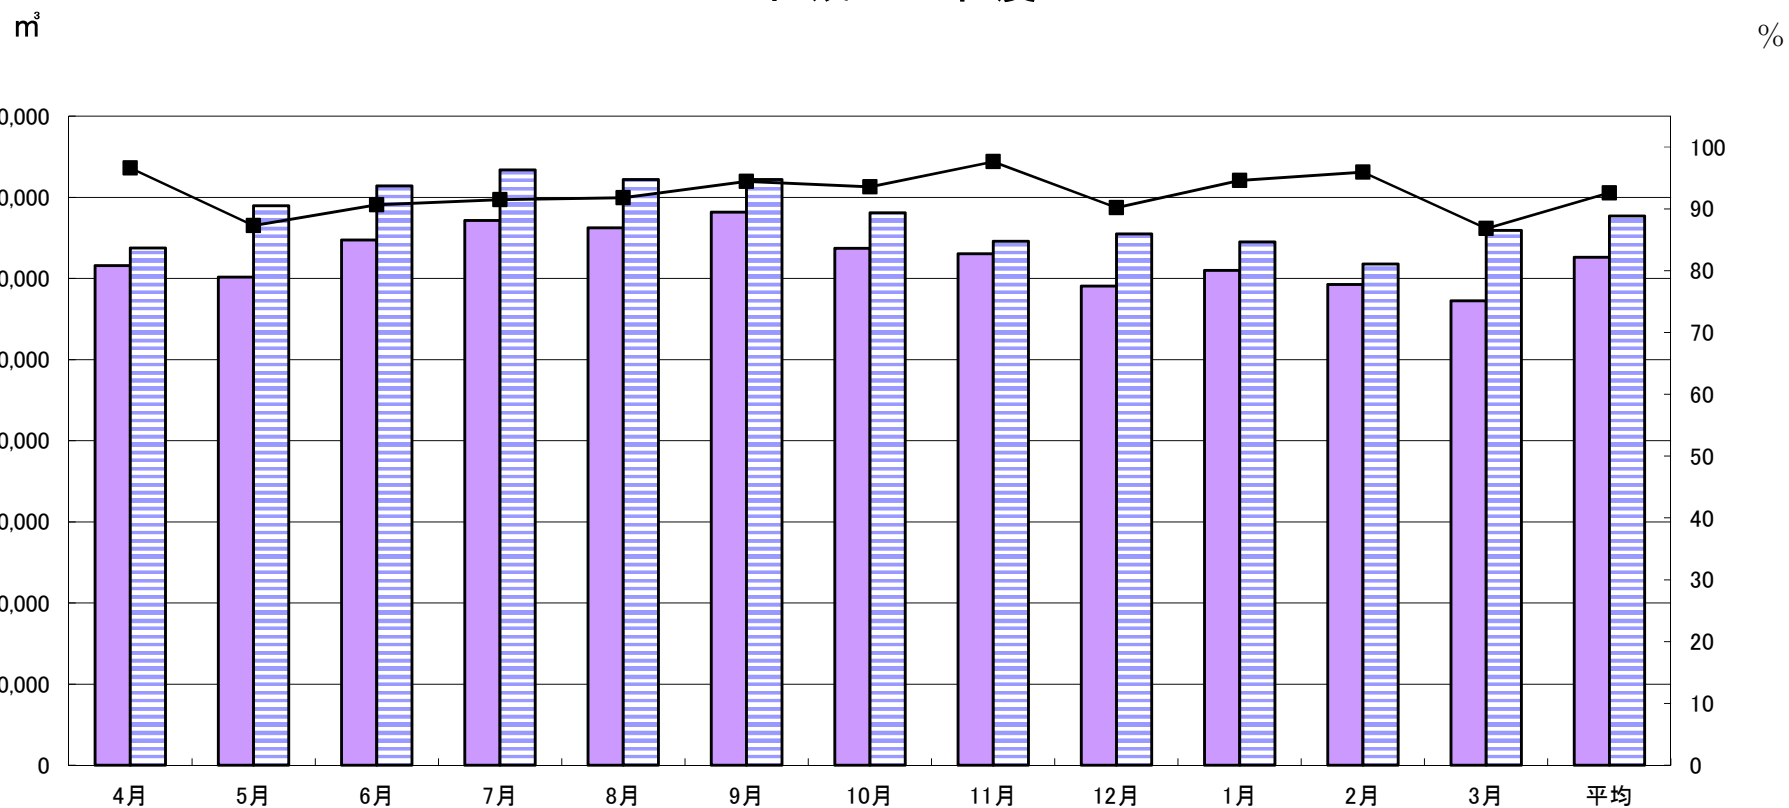

	4 月	5 月	6 月	7 月	8 月	9 月	10 月	11 月	12 月	1 月	2 月	3 月	平 均
■ 有効水量	615,676	601,740	647,329	671,338	662,418	681,587	636,998	630,503	590,654	610,055	592,687	572,439	626,119
▨ 配 水 量	637,387	689,387	713,908	733,755	721,741	721,789	680,732	645,831	655,026	644,865	617,918	659,334	676,806
■ 有 効 率	96.59	87.29	90.67	91.49	91.78	94.43	93.58	97.63	90.17	94.60	95.92	86.82	92.58

平成 28 年度

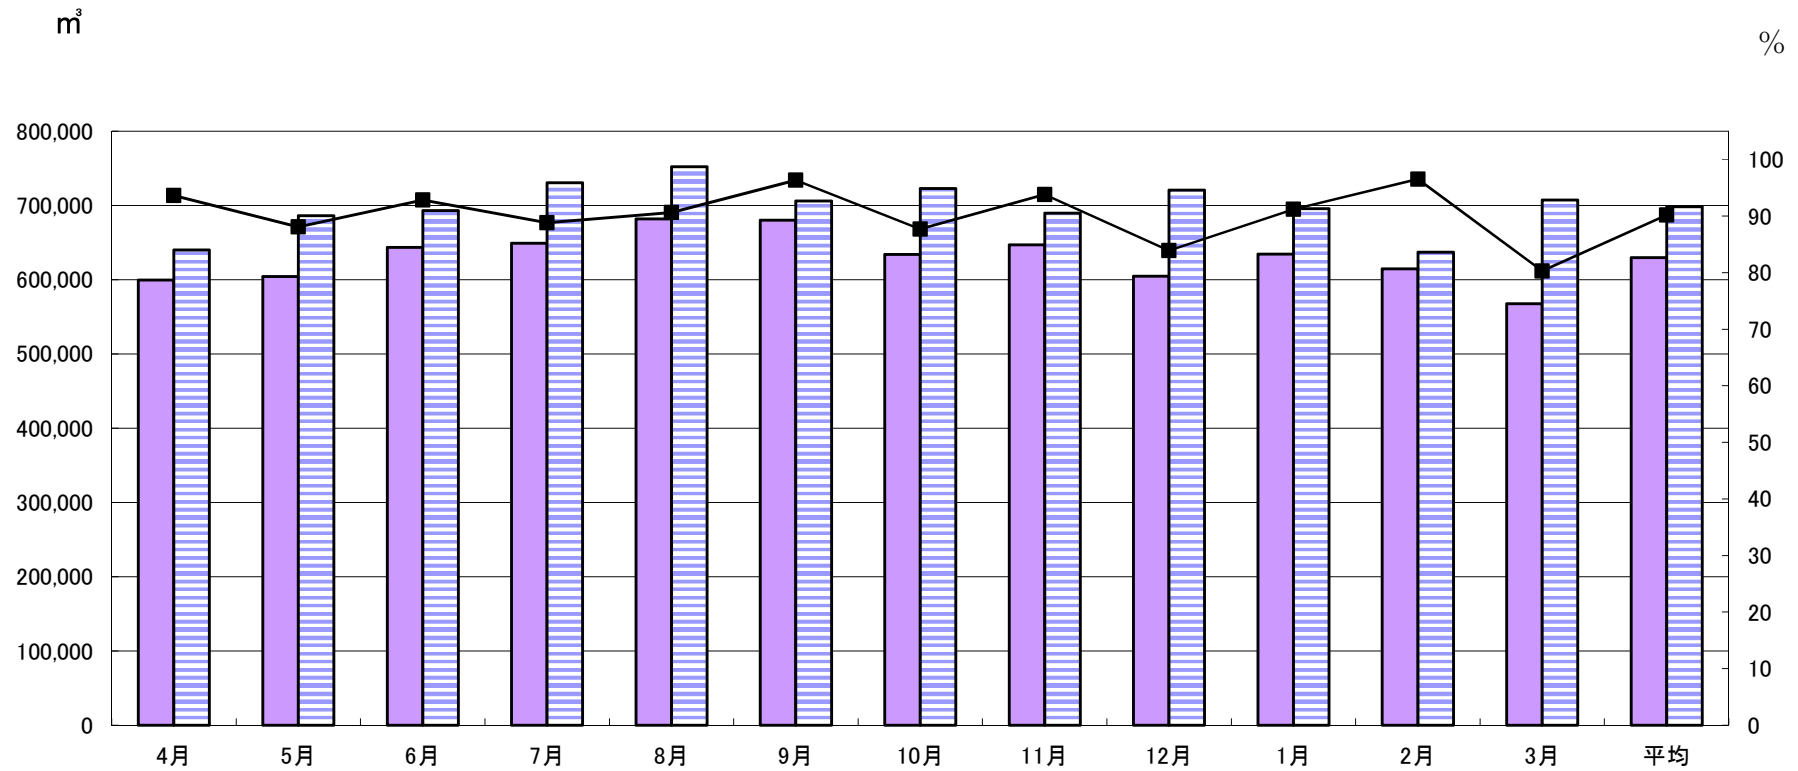


	4 月	5 月	6 月	7 月	8 月	9 月	10 月	11 月	12 月	1 月	2 月	3 月	平 均
■有効水量	599,471	604,332	643,544	648,928	681,731	680,253	634,031	646,770	604,666	634,419	614,709	567,830	629,800
▨配水量	640,236	686,243	693,140	730,532	752,118	706,064	722,864	689,701	720,716	695,504	636,855	707,110	698,424
■有 効 率	93.63	88.06	92.84	88.83	90.64	96.34	87.71	93.78	83.90	91.22	96.52	80.30	90.17

平成 29 年度

m³

%

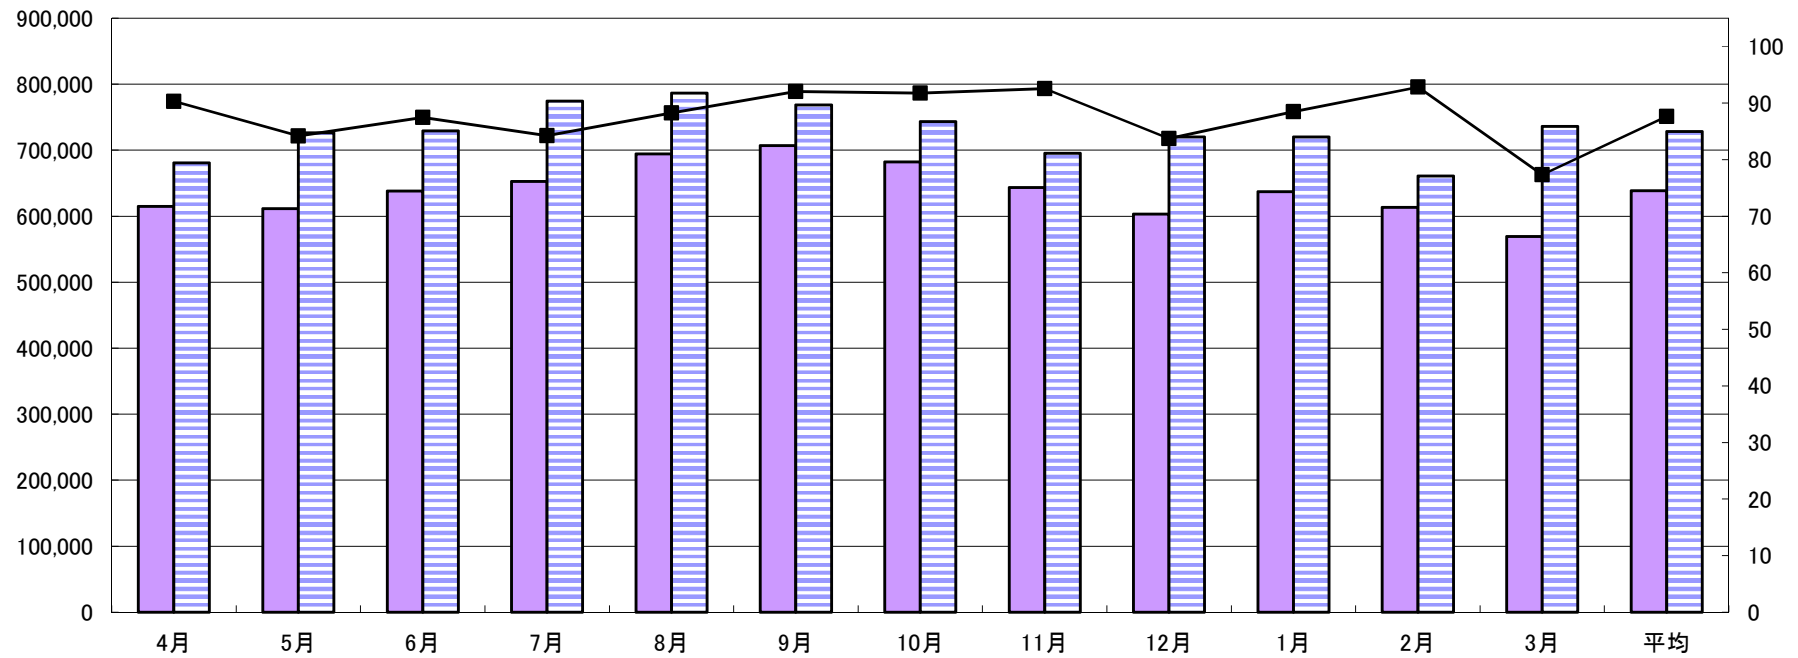


	4 月	5 月	6 月	7 月	8 月	9 月	10 月	11 月	12 月	1 月	2 月	3 月	平 均
■有効水量	614,833	611,622	637,913	652,507	694,309	707,150	682,447	643,647	603,050	637,053	613,638	569,104	638,624
▨配水量	680,832	726,504	729,358	774,582	786,590	768,352	743,554	695,580	720,179	720,199	661,049	735,873	728,554
■有 効 率	90.31	84.19	87.46	84.24	88.27	92.03	91.78	92.53	83.74	88.46	92.83	77.34	87.66

平成 30 年度

m³

%

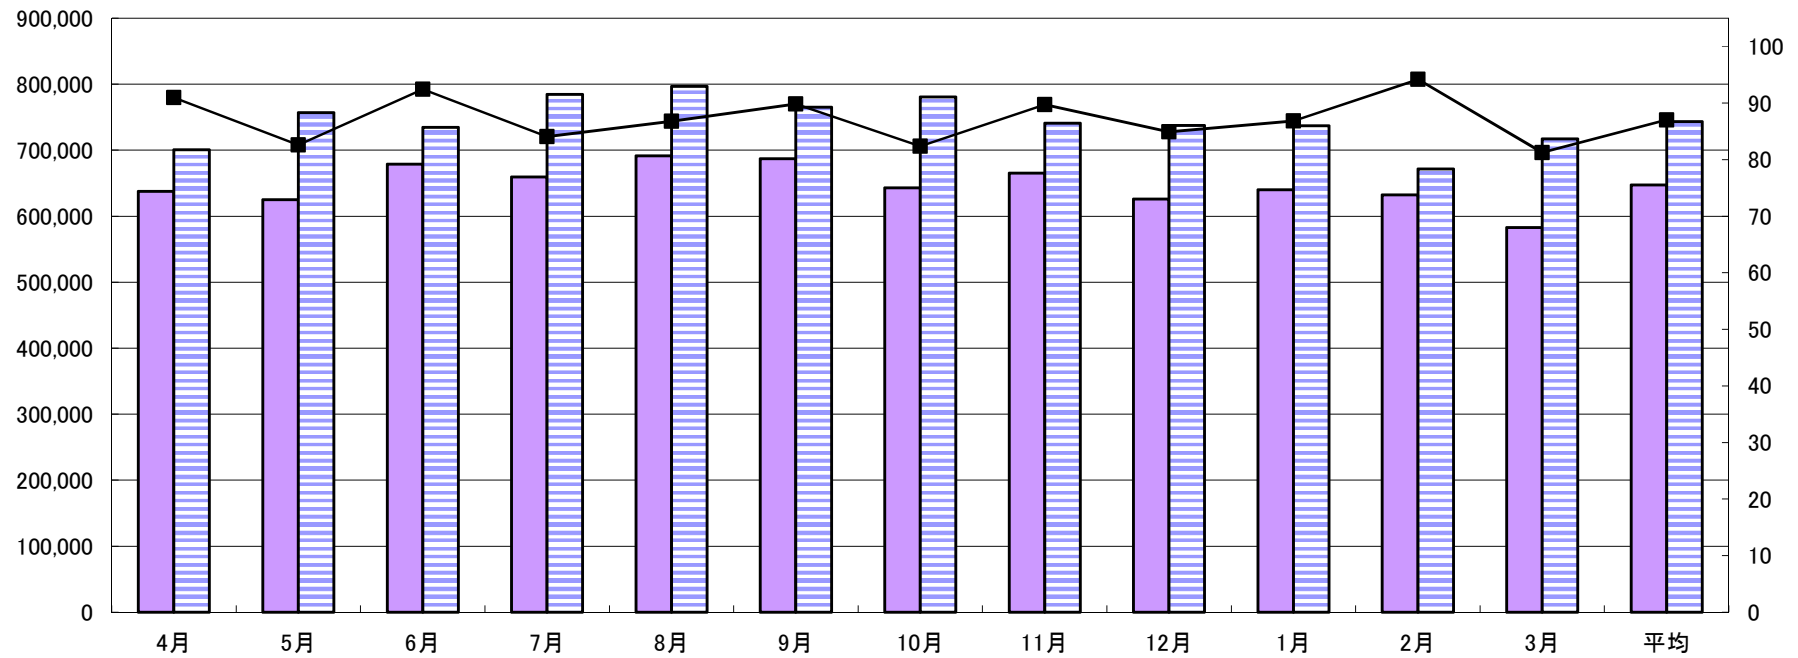

	4 月	5 月	6 月	7 月	8 月	9 月	10 月	11 月	12 月	1 月	2 月	3 月	平 均
■有効水量	637,418	624,917	678,871	659,466	691,580	687,212	642,904	665,094	625,985	639,977	632,224	582,667	647,101
▨配水量	700,734	756,782	734,598	784,481	796,802	765,089	780,512	741,071	737,416	736,862	671,366	717,006	743,560
■有 効 率	90.96	82.58	92.41	84.06	86.79	89.82	82.37	89.75	84.89	86.85	94.17	81.26	87.03

3. 系統別配水量

(単位: m³)

系統 月別	袖 山 淨 水 場 系						加 治 道 淨 水 場 系			伊良部 浄水場系	合 計	一 日 最 大 配 水 量			一 日 平 均 配 水 量			
	市 内			東部地区	北部地区	袖山浄 水場計	南部地区	北部地区	加治道浄 水場計	伊良部 浄水場計		袖山 浄水場	加治道 浄水場	伊良部 浄水場	袖山 浄水場	加治道 浄水場	伊良部 浄水場	計
	市街地	高台	計															
平成30年 4 月	266,973	136,893	403,866	154,914	74,988	633,768	34,572	32,394	66,966		700,734	22,681	2,365		21,126	2,232		23,358
5 月	291,314	141,605	432,919	167,660	82,715	683,294	37,656	35,832	73,488		756,782	23,036	2,707		22,042	2,371		24,413
6 月	281,684	142,291	423,975	160,891	79,281	664,147	34,946	35,505	70,451		734,598	23,993	2,675		22,138	2,348		24,486
7 月	299,377	158,261	457,638	173,274	82,452	713,364	36,195	34,922	71,117		784,481	28,164	2,958		23,012	2,294		25,306
8 月	302,881	153,349	456,230	193,094	81,618	730,942	30,256	35,604	65,860		796,802	24,884	2,405		23,579	2,125		25,704
9 月	293,062	149,579	442,641	185,816	78,520	706,977	24,460	33,652	58,112		765,089	26,240	2,958		23,566	1,937		25,503
1 0 月	302,514	153,474	455,988	192,181	79,777	727,946	20,092	32,474	52,566		780,512	24,430	1,863		23,482	1,696		25,178
1 1 月	285,966	148,834	434,800	174,629	77,649	687,078	23,384	30,609	53,993		741,071	23,949	2,181		22,903	1,800		24,703
1 2 月	290,884	139,331	430,215	162,254	78,390	670,859	34,353	32,204	66,557		737,416	23,147	2,509		21,641	2,147		23,788
平成31年 1 月	286,429	140,894	427,323	166,877	76,914	671,114	33,008	32,740	65,748		736,862	23,260	2,509		21,649	2,121		23,770
2 月	250,097	129,762	379,859	169,843	69,412	619,114	21,631	30,621	52,252		671,366	23,714	2,170		22,111	1,866		23,977
3 月	245,434	139,075	384,509	194,877	77,021	656,407	21,858	38,741	60,599		717,006	22,285	2,156		21,174	1,955		23,129
計	3,396,615	1,733,348	5,129,963	2,096,310	938,737	8,165,010	352,411	405,298	757,709		8,922,719							
月平均	283,051	144,446	427,497	174,693	78,228	680,418	29,368	33,775	63,142		743,560							
日平均	9,306	4,749	14,055	5,743	2,572	22,370	966	1,110	2,076		24,446							

4. 浄水場別稼働状況

区 分 月 別	袖 山 浄 水 場 (29,961 m ³ / 日)			加 治 道 浄 水 場 (4,044 m ³ / 日)			伊 良 部 浄 水 場 (3,600 m ³ / 日)			合 計 (34,005 m ³ / 日)		
	取 水 量	日最大配水量	稼 働 率	取 水 量	日最大配水量	稼 働 率	取 水 量	日最大配水量	稼 働 率	取 水 量	日最大配水量	稼 働 率
平成30年4月	660,456	22,681	75.7	77,801	2,365	58.5				738,257	25,046	73.7
5	719,614	23,036	76.9	78,801	2,707	66.9				798,415	25,743	75.7
6	687,648	23,993	80.1	76,286	2,675	66.1				763,934	26,668	78.4
7	729,047	28,164	94.0	76,262	2,958	73.1				805,309	31,122	91.5
8	756,216	24,884	83.1	49,794	2,405	59.5				806,010	27,289	80.2
9	715,574	26,240	87.6	58,969	2,958	73.1				774,543	29,198	85.9
10	743,023	24,430	81.5	60,446	1,863	46.1				803,469	26,293	77.3
11	702,668	23,949	79.9	65,988	2,181	53.9				768,656	26,130	76.8
12	697,736	23,147	77.3	68,152	2,509	62.0				765,888	25,656	75.4
平成31年1月	699,742	23,260	77.6	70,444	2,509	62.0				770,186	25,769	75.8
2	650,765	23,714	79.1	56,727	2,170	53.7				707,492	25,884	76.1
3	725,512	22,285	74.4	64,878	2,156	53.3				790,390	24,441	71.9
計	8,488,001	289,783		804,548	29,456					9,292,549	319,239	
平 均	707,333	24,149	80.6	67,046	2,455	60.7				774,379	26,603	78.2

5. 電力消費量

単位:Kw

種 別 月 別	水 源 地										浄 水 場			白 川 田 貯 水 池	下 北 ポ ン プ	久 松 ポ ン プ 場	総 合 計
	白 川 田	袖 山	高 野	西 底 原	大 野	底 原	ニ ャ ー ツ	添 道	東 添 道	合 計	袖 山	加 治 道	合 計				
平成30年4月	66,937	19,115	18,262	11,784	7,133	9,291	20,466	9,696	0	162,684	159,747	49,668	209,415	24,862	102	21,224	418,287
5	60,074	21,120	16,081	10,952	9,982	15,581	17,412	5,370	0	156,572	153,845	48,981	202,826	19,151	87	20,511	399,147
6	58,043	18,459	12,952	17,069	8,830	16,405	25,196	11,488	0	168,442	169,251	52,711	221,962	32,557	92	22,851	445,904
7	53,120	18,805	5,605	20,778	6,411	25,835	27,774	16,919	0	175,247	164,839	51,790	216,629	25,952	89	22,052	439,969
8	82,992	10,724	6,068	12,574	7,646	13,474	14,444	17,421	0	165,343	175,005	50,160	225,165	23,353	88	24,576	438,525
9	131,827	4,931	2,999	6,814	1,378	4,703	6,414	2,483	0	161,549	184,691	33,644	218,335	18,920	4,622	24,963	428,389
10	125,103	4,911	2,475	5,149	851	5,750	9,814	4,770	0	158,823	171,633	38,969	210,602	15,645	723	23,667	409,460
11	116,705	7,300	6,414	7,399	5,928	6,220	12,295	6,735	0	168,996	176,145	40,808	216,953	18,743	204	23,972	428,868
12	82,731	14,697	14,326	11,732	4,411	13,278	16,079	7,185	0	164,439	167,538	45,771	213,309	23,993	0	22,895	424,636
平成31年1月	127,551	6,231	2,628	12,892	3,430	6,678	5,749	3,490	0	168,649	163,979	50,079	214,058	17,780	0	22,154	422,641
2	105,265	10,794	171	4,073	4,284	4,888	10,997	3,655	0	144,127	162,367	50,807	213,174	16,601	54	22,076	396,032
3	117,196	6,719	1,427	7,583	55	2,305	2,876	1,050	446	139,657	153,488	38,193	191,681	15,494	26	20,260	367,118
計	1,127,544	143,806	89,408	128,799	60,339	124,408	169,516	90,262	446	1,934,528	2,002,528	551,581	2,554,109	253,051	6,087	271,201	5,018,976
月 平 均	93,962	11,984	7,451	10,733	5,028	10,367	14,126	7,522	37	161,211	166,877	45,965	212,842	21,088	507	22,600	395,648
日 平 均	3,089	394	245	353	165	341	464	247	1	5,300	5,486	1,511	6,998	693	17	743	13,751

電力消費量（伊良部）

単位:Kw

種 別 月別	各 水 源 地									浄 水 場	第3配水池	第5配水池	月 計
	3号井戸	4号井戸	5号井戸	6号井戸	7号井戸	8号井戸	9号井戸	10号井戸	11号井戸	2号井戸			
平成30年4月	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	57	59	116
5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	54	53	107
6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	90	59	149
7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	55	60	115
8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	53	59	112
9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	55	63	118
10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	53	60	113
11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	57	56	113
12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	55	55	110
平成31年1月	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	63	63	126
2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	52	51	103
3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	52	57	109
計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	696	695	1,391

6. 次亜塩素酸ソーダ消費量

単位: Kg

種別 月別	袖 山 浄 水 場			加 治 道 浄 水 場			伊 良 部 浄 水 場			合 計	備 考
	前 塩 素	後 塩 素	計	前 塩 素	後 塩 素	計	前 塩 素	後 塩 素	計		
平成30年4月		40,299	40,299		4,244	4,244				44,543	
5		32,072	32,072		4,680	4,680				36,752	
6		33,048	33,048		4,486	4,486				37,534	
7		34,894	34,894		4,573	4,573				39,467	
8		35,066	35,066		2,705	2,705				37,771	
9		33,700	33,700		3,607	3,607				37,307	
10		34,334	34,334		3,688	3,688				38,022	
11		30,902	30,902		4,083	4,083				34,985	
12		32,123	32,123		4,657	4,657				36,780	
平成31年1月		31,829	31,829		4,430	4,430				36,259	
2		25,691	25,691		2,754	2,754				28,445	
3		30,288	30,288		2,929	2,929				33,217	
計		394,246	394,246		46,836	46,836				441,082	
月 平 均		32,854	32,854		3,903	3,903				36,757	
日 平 均		1,080.1	1,080.1		128.3	128.3				1,208.4	

浄水場薬品量 (伊良部浄水場)

単位 (Kg)

種 別 月 別	フロコン285	硫酸銅	液体苛性ソーダ	クエン酸	次亜塩素酸ソーダ (12%)	濃硫酸(98%)	備 考
平成30年4月							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
平成31年1月							
2							
3							
計							

7. 燃料消費量

単位: ℓ

種 別 月 別	水 源 地								白川田	浄 水 場			総合計
	白 川 田	袖 山	高 野	添 道	東 添 道	底 原	ニ ャ ー ツ	合 計	貯水池	袖山	加 治 道	合 計	
平成30年4月								0				0	0
5								0				0	0
6								0				0	0
7	1,250							1,250		7,000	261	7,261	8,511
8								0				0	0
9								0			325	325	325
10								0				0	0
11								0				0	0
12								0				0	0
平成31年1月								0				0	0
2								0				0	0
3								0				0	0
計	1,250	0	0	0		0	0	1,250	0	7,000	586	7,586	8,836
月 平 均	104	0	0	0		0	0	104	0	583	49	632	736
日 平 均	3	0	0	0		0	0	3	0	19	2	21	22

8 . 原 淨 水 水 質 試 験 成 績

採 水 位 置			原 水						
区 分	項 目	水 質 基 準 値	単 位	白 川 田 水 源 地	袖 山 水 源 地	西 底 原 水 源 地	高 野 水 源 地	加 治 道 水 源 地	大 野 水 源 地
一 般 細 菌	100個/ml 以下	個/ml		25	0	0	0	0	3
大 腸 菌	検出されないこと			検出回数:7回/24回	検出回数:0回/24回	検出回数:0回/24回	検出回数:0回/23回	検出回数:0回/24回	検出回数:5回/24回
カドミウム及びその化合物	0.003mg/l 以下	mg/l		0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満
水 銀 及 び そ の 化 合 物	0.0005mg/l 以下	〃		0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満
セ レ ン 及 び そ の 化 合 物	0.01mg/l 以下	〃		0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
鉛 及 び そ の 化 合 物	0.01mg/l 以下	〃		0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
ヒ 素 及 び そ の 化 合 物	0.01mg/l 以下	〃		0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
六 価 ク ロ ム 化 合 物	0.05mg/l 以下	〃		0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満
亜 硝 酸 態 窒 素	0.04mg/l 以下	〃		0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満
シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/l 以下	〃		0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/l 以下	〃		4.03	4.65	5.44	3.90	4.02	4.19
フッ素及びその化合物	0.8mg/l 以下	〃		0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満
ホウ素及びその化合物	1.0mg/l 以下	〃		0.026	0.018	0.017	0.022	0.018	0.040
四 塩 化 炭 素	0.002mg/l 以下	〃		0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満
1,4- ジ オ キ サ ン	0.05mg/l 以下	〃		0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満
シス-1,2-シクロクロエチレン及び トランス-1,2-シクロクロエチレン	0.04mg/l 以下	〃		0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満
ジ ク ロ ロ メ タ ン	0.02mg/l 以下	〃		0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満
テトラクロロエチレン	0.01mg/l 以下	〃		0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満
トリクロロエチレン	0.01mg/l 以下	〃		0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満
ベンゼン	0.01mg/l 以下	〃		0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満
塩 素 酸	0.6mg/l 以下	〃							
ク ロ ロ 酢 酸	0.02mg/l 以下	〃							
ク ロ ロ ホ ル ム	0.06mg/l 以下	〃							
ジ ク ロ ロ 酢 酸	0.03mg/l 以下	〃							
ジブロモクロロメタン	0.1mg/l 以下	〃							
臭 素 酸	0.01mg/l 以下	〃							
総トリハロメタン	0.1mg/l 以下	〃							
トリクロロ酢酸	0.3mg/l 以下	〃							
ブロモジクロロメタン	0.03mg/l 以下	〃							
ブ ロ モ ホ ル ム	0.09mg/l 以下	〃							
ホルムアルデヒド	0.08mg/l 以下	〃							
亜鉛及びその化合物	1.0mg/l 以下	〃		0.028	0.005	0.005未満	0.007	0.008	0.006
アルミニウム及びその化合物	0.2mg/l 以下	〃		0.005未満	0.005未満	0.03	0.005未満	0.005未満	0.007
鉄 及 び そ の 化 合 物	0.3mg/l 以下	〃		0.01未満	0.01未満	0.02	0.01未満	0.01未満	0.07
銅 及 び そ の 化 合 物	1.0mg/l 以下	〃		0.001未満	0.002	0.001未満	0.002	0.002	0.003
ナトリウム及びその化合物	200mg/l 以下	〃		35.0	25.3	18.8	28.5	22.4	37.1
マンガン及びその化合物	0.05mg/l 以下	〃		0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001
塩 化 物 イ オ ン	200mg/l 以下	〃		53.5	36.3	33.4	41.5	32.0	51.9
カルシウム,マグネシウム等(硬度)	300mg/l 以下	〃		288	241	254	268	234	259
蒸 発 残 留 物	500mg/l 以下	〃		421	350	371	390	333	395
陰イオン界面活性剤	0.2mg/l 以下	〃		0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満
ジエオスミン	0.00001mg/l 以下	〃		0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満
2-メチルイソホールネオール	0.00001mg/l 以下	〃		0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満
非イオン界面活性剤	0.02mg/l 以下	〃		0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満
フェノール類	0.005mg/l 以下	〃		0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/l 以下	〃		0.3	0.1	0.1	0.1	0.1未満	0.2
p H 値	5.8以上8.6以下			7.1	7.2	7.2	7.5	7.3	7.2
味	異常でないこと			――	――	――	――	――	――
臭 気	異常でないこと			異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
色 度	5度以下	度		0.5未満	0.5未満	0.8	0.5未満	0.5未満	0.5
濁 度	2度以下	度		0.1未満	0.1未満	0.4	0.1未満	0.1未満	0.2

原 淨 水 水 質 試 験 成 績

採 水 位 置			原 水					
区 分	項 目	水 質 基 準 値	単 位	山 川 水 源 地	底 原 水 源 地	ニ ャ ー ツ 水 源 地	加 治 道 西 水 源 地	添 道 水 源 地
一 般	細 菌	100個/ml 以下	個/ml	87	137	0	1	13
大	腸 菌	検出されないこと		検出回数:20回/24回	検出回数:2回/24回	検出回数:0回/24回	検出回数:0回/18回	検出回数:1回/24回
	カドミウム及びその化合物	0.003mg/l 以下	mg/l	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満
	水 銀 及 び そ の 化 合 物	0.0005mg/l 以下	〃	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満
	セ レ ン 及 び そ の 化 合 物	0.01mg/l 以下	〃	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
	鉛 及 び そ の 化 合 物	0.01mg/l 以下	〃	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
	ヒ 素 及 び そ の 化 合 物	0.01mg/l 以下	〃	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
	六 価 ク ロ ム 化 合 物	0.05mg/l 以下	〃	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満
	亜 硝 酸 態 窒 素	0.04mg/l 以下	〃	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満
	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/l 以下	〃	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/l 以下	〃	4.60	5.60	5.20	4.59	6.10
	フッ素及びその化合物	0.8mg/l 以下	〃	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満
	ホウ素及びその化合物	1.0mg/l 以下	〃	0.025	0.017	0.018	0.02	0.019
四	塩 化 炭 素	0.002mg/l 以下	〃	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満
	1,4- ジ オ キ サ ン	0.05mg/l 以下	〃	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満
	シス-1,2-シクロエチレン及び トランス-1,2-シクロエチレン	0.04mg/l 以下	〃	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満
	ジ ク ロ ロ メ タ ン	0.02mg/l 以下	〃	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満
	テトラクロロエチレン	0.01mg/l 以下	〃	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満
	トリクロロエチレン	0.01mg/l 以下	〃	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満
	ベ ン ゼ ン	0.01mg/l 以下	〃	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満
	塩 素 酸	0.6mg/l 以下	〃					
	ク ロ ロ 酢 酸	0.02mg/l 以下	〃					
	ク ロ ロ ホ ル ム	0.06mg/l 以下	〃					
	ジ ク ロ ロ 酢 酸	0.03mg/l 以下	〃					
	ジブロモクロロメタン	0.1mg/l 以下	〃					
	臭 素 酸	0.01mg/l 以下	〃					
	総 ト リ ハ ロ メ タ ン	0.1mg/l 以下	〃					
	トリクロロ酢酸	0.3mg/l 以下	〃					
	ブロモジクロロメタン	0.03mg/l 以下	〃					
	ブ ロ モ ホ ル ム	0.09mg/l 以下	〃					
	ホルムアルデヒド	0.08mg/l 以下	〃					
	亜鉛及びその化合物	1.0mg/l 以下	〃	0.014	0.009	0.014	0.005未満	0.092
	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/l 以下	〃	0.011	0.006	0.005未満	0.005未満	0.008
	鉄 及 び そ の 化 合 物	0.3mg/l 以下	〃	0.01	0.01	0.01未満	0.01未満	0.01
	銅 及 び そ の 化 合 物	1.0mg/l 以下	〃	0.001	0.001	0.002	0.002	0.002
	ナトリウム及びその化合物	200mg/l 以下	〃	32.5	21.8	24.8	22.2	25.6
	マンガン及びその化合物	0.05mg/l 以下	〃	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
	塩 化 物 イ オ ン	200mg/l 以下	〃	51.3	34.0	37.1	38.2	40.0
	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	300mg/l 以下	〃	284	258	256	273	278
	蒸 発 残 留 物	500mg/l 以下	〃	422	370	368	385	408
	陰 イ オ ン 界 面 活 性 剤	0.2mg/l 以下	〃	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満
	ジ エ オ ス ミ ン	0.00001mg/l 以下	〃	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満
	2-メチルイソホールネオール	0.00001mg/l 以下	〃	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満
	非 イ オ ン 界 面 活 性 剤	0.02mg/l 以下	〃	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満
	フ ェ ノ ー ル 類	0.005mg/l 以下	〃	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満
	有機物（全有機炭素（TOC）の量）	3mg/l 以下	〃	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1
	p H 値	5.8以上8.6以下		7.1	7.3	7.4	7.1	7.2
	味	異常でないこと		――	――	――	――	――
	臭 気	異常でないこと		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
	色 度	5度以下	度	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.8
	濁 度	2度以下	度	0.2	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.91

原 浄 水 水 質 試 験 成 績

採 水 位 置			浄 水		
区 分			袖山浄水場系池間地区給水栓	加治道浄水場系保良地区給水栓	袖山浄水場系伊良部地区給水栓
項 目	水 質 基 準 値	単 位			
一 般 細 菌	100個/ml 以下	個/ml	0	0	0
大 腸 菌	検出されないこと		検出回数 0回/12回	検出回数 0回/12回	検出回数 0回/12回
カドミウム及びその化合物	0.003mg/l 以下	mg/l	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満
水 銀 及 び そ の 化 合 物	0.0005mg/l 以下	〃	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満
セレン及びその化合物	0.01mg/l 以下	〃	0.001未満	0.001未満	0.001未満
鉛 及 び そ の 化 合 物	0.01mg/l 以下	〃	0.001未満	0.001未満	0.001未満
ヒ素及びその化合物	0.01mg/l 以下	〃	0.001未満	0.001未満	0.001未満
六 価 ク ロ ム 化 合 物	0.05mg/l 以下	〃	0.005未満	0.005未満	0.005未満
亜 硝 酸 態 窒 素	0.04mg/l 以下	〃	0.004未満	0.004未満	0.004未満
シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/l 以下	〃	0.001未満	0.001未満	0.001未満
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/l 以下	〃	4.22	4.01	4.24
フッ素及びその化合物	0.8mg/l 以下	〃	0.05未満	0.05未満	0.05未満
ホウ素及びその化合物	1.0mg/l 以下	〃	0.028	0.020	0.026
四 塩 化 炭 素	0.002mg/l 以下	〃	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満
1,4- ジ オ キ サ ン	0.05mg/l 以下	〃	0.005未満	0.005未満	0.005未満
シス-1,2-シ [〃] クロロエチレン及び トランス-1,2-シ [〃] クロロエチレン	0.04mg/l 以下	〃	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満
ジ ク ロ ロ メ タ ン	0.02mg/l 以下	〃	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満
テトラクロロエチレン	0.01mg/l 以下	〃	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満
トリクロロエチレン	0.01mg/l 以下	〃	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満
ベンゼン	0.01mg/l 以下	〃	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満
塩 素 酸	0.6mg/l 以下	〃	0.06未満	0.06未満	0.06未満
ク ロ ロ 酢 酸	0.02mg/l 以下	〃	0.002未満	0.002未満	0.002未満
ク ロ ロ ホ ル ム	0.06mg/l 以下	〃	0.0002	0.0002	0.0001未満
ジ ク ロ ロ 酢 酸	0.03mg/l 以下	〃	0.002未満	0.002未満	0.002未満
ジブロモクロロメタン	0.1mg/l 以下	〃	0.0040	0.0032	0.0027
臭 素 酸	0.01mg/l 以下	〃	0.001未満	0.001未満	0.001未満
総 ト リ ハ ロ メ タ ン	0.1mg/l 以下	〃	0.0141	0.0095	0.0110
ト リ ク ロ ロ 酢 酸	0.3mg/l 以下	〃	0.002未満	0.002未満	0.002未満
ブ ロ モ ジ ク ロ ロ メ タ ン	0.03mg/l 以下	〃	0.0009	0.0009	0.0004
ブ ロ モ ホ ル ム	0.09mg/l 以下	〃	0.0088	0.0053	0.0079
ホ ル ム ア ル デ ヒ ド	0.08mg/l 以下	〃	0.001未満	0.001未満	0.001未満
亜鉛及びその化合物	1.0mg/l 以下	〃	0.005未満	0.005未満	0.005未満
アルミニウム及びその化合物	0.2mg/l 以下	〃	0.011	0.009	0.010
鉄 及 び そ の 化 合 物	0.3mg/l 以下	〃	0.01未満	0.01未満	0.01未満
銅 及 び そ の 化 合 物	1.0mg/l 以下	〃	0.004	0.019	0.005
ナトリウム及びその化合物	200mg/l 以下	〃	93.1	65.2	94.2
マンガン及びその化合物	0.05mg/l 以下	〃	0.001未満	0.001未満	0.001未満
塩 化 物 イ オ ン	200mg/l 以下	〃	50.7	37.1	50.2
カルシウム,マグネシウム等（硬度）	300mg/l 以下	〃	111	132	113
蒸 発 残 留 物	500mg/l 以下	〃	380	324	376
陰 イ オ ン 界 面 活 性 剤	0.2mg/l 以下	〃	0.02未満	0.02未満	0.02未満
ジ エ オ ス ミ ン	0.00001mg/l 以下	〃	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満
2- メ チ ル イ ソ ホ 〃 ル ネ オ ー ル	0.00001mg/l 以下	〃	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満
非 イ オ ン 界 面 活 性 剤	0.02mg/l 以下	〃	0.002未満	0.002未満	0.002未満
フ ェ ノ ー ル 類	0.005mg/l 以下	〃	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/l 以下	〃	0.2	0.2	0.1
p H 値	5.8以上8.6以下		7.9	7.6	8.1
味	異常でないこと		異常なし	異常なし	異常なし
臭 気	異常でないこと		異常なし	異常なし	異常なし
色 度	5度以下	度	0.5未満	0.5未満	0.5未満
濁 度	2度以下	度	0.1未満	0.1未満	0.1未満

9. 浄水水質の推移

年 度	袖 山 浄 水								加 治 道 浄 水							
	硝酸態及亜硝酸態窒素	総トリハロメタン	塩素イオン	総 硬 度	蒸 発 残 留 物	有機物等	p H 値	濁 度	硝酸態及亜硝酸態窒素	総トリハロメタン	塩素イオン	総 硬 度	蒸 発 残 留 物	有機物等	p H 値	濁 度
H10	6.22	0.0120	58.1	295	447	1.0	7.5	0.1未満	8.15	0.0078	57.1	236	408	0.7	7.7	0.1未満
11	5.45	0.019	51.4	119	376	0.5	8.1	0.1未満	6.94	0.0089	50.4	237	382	0.5	7.8	0.1未満
12	5.26	0.010	43.3	108	377	0.4	7.9	0.1未満	6.38	0.0062	44.5	104	319	0.3	7.9	0.1未満
13	5.03	0.0100	39.7	101	358	0.5	7.8	0.1未満	6.73	0.0039	37.4	100	290	0.5	7.9	0.1未満
14	5.32	0.010	37.9	99	358	0.5	7.9	0.1未満	6.21	0.0062	36.8	109	308	0.5	7.9	0.1未満
15	5.09	0.0120	35.1	99	337	0.9	7.9	0.1未満	5.40	0.0079	34.0	116	305	1.0	7.7	0.1未満
16	4.95	0.012	44.9	112	377	0.6	7.1	0.1未満	5.59	0.0093	41.3	107	330	0.7	7.1	0.1未満
17	4.96	0.010	82.3	104	392	0.2	7.6	0.1未満	5.78	0.0052	58.8	108	317	0.2	7.7	0.1未満
18	4.81	0.013	88.6	110	428	0.2	7.7	0.1未満	5.74	0.0059	59.2	105	333	0.1	7.7	0.1未満
19	4.89	0.013	79.9	110	413	0.2	7.6	0.1未満	5.91	0.0074	55.6	115	333	0.2	7.6	0.1未満
20	4.78	0.011	67.0	105	394	0.1	7.5	0.1未満	5.63	0.0076	49.0	107	324	0.1	7.7	0.1未満
21	5.01	0.012	61.2	98	371	0.1	7.6	0.1未満	5.68	0.0050	44.1	112	319	0.1	7.7	0.1未満
22	4.93	0.014	64.8	97	358	0.1	7.5	0.1未満	5.62	0.005	39.0	113	311	0.1未満	7.7	0.1未満
23	4.68	0.015	57.5	92	360	0.1	7.5	0.1未満	5.34	0.0076	36.1	113	302	0.1未満	7.6	0.1未満
24	4.64	0.019	51.5	96	370	0.1	7.4	0.1未満	5.16	0.0082	34.6	119	301	0.1	7.5	0.1未満
25	4.58	0.011	52.5	101	376	0.1	7.3	0.1未満	4.86	0.0091	35.1	120	309	0.1未満	7.3	0.1未満
26	4.60	0.0117	53.5	97	369	0.1	7.5	0.1未満	4.76	0.0103	38.0	125	319	0.1未満	7.4	0.1未満
27	4.61	0.0100	57.1	105	387	0.1	7.9	0.1未満	4.85	0.0088	42.2	124	329	0.1未満	7.6	0.1未満
28	4.68	0.0140	54.7	97	347	0.2	7.8	0.1未満	4.68	0.0105	41.2	122	314	0.1未満	7.6	0.1未満
29	4.84	0.0125	52.9	105	374	0.2	7.8	0.1未満	4.56	0.0123	41.4	124	329	0	7.6	0.1未満
30	4.22	0.0141	50.7	111	380	0.2	7.9	0.1未満	4.01	0.0095	37.1	132	324	0	7.6	0.1未満

第 5 章 工事施工状況

第5章 工事施工状況

1. 月別、地区別給水装置工事施工状況

(平成30年4月1日～平成31年3月31日)

種 別 地区別 年月	新 設						増 設						改 造						合計
	平良	城辺	下地	上野	伊良部	計	平良	城辺	下地	上野	伊良部	計	平良	城辺	下地	上野	伊良部	計	
平成30年4月	23	0	1	1	0	25	5	0	1	0	0	6	1	0	0	0	1	2	33
5	12	3	0	1	0	16	4	0	0	0	0	4	1	0	0	0	0	1	21
6	50	0	1	4	2	57	6	1	0	4	0	11	1	0	0	0	1	2	70
7	14	0	3	1	0	18	4	0	0	0	0	4	2	0	0	0	0	2	24
8	18	12	1	2	3	36	5	1	3	0	1	10	2	0	0	3	0	5	51
9	15	2	1	2	1	21	6	0	0	0	0	6	4	1	1	0	3	9	36
10	16	0	1	0	1	18	5	0	0	1	0	6	2	1	0	0	1	4	28
11	10	1	2	0	1	14	2	1	1	0	1	5	0	0	0	0	0	0	19
12	16	0	1	5	1	23	5	0	0	1	1	7	2	0	0	1	0	3	33
平成31年1月	6	0	1	2	0	9	3	0	0	1	1	5	2	0	0	0	0	2	16
2	14	1	3	3	1	22	5	0	1	1	0	7	0	0	0	0	0	0	29
3	20	0	2	1	1	24	12	1	0	2	3	18	2	0	1	0	0	3	45
計	214	19	17	22	11	283	62	4	6	10	7	89	19	2	2	4	6	33	405

2. 給水装置停止、開始、量水器取替状況

(滞納停止、開始含む)

種 別	給 水 停 止						給 水 開 始						量 水 器 取 替					
地区別 年月	平良	城辺	下地	上野	伊良部	計	平良	城辺	下地	上野	伊良部	計	平良	城辺	下地	上野	伊良部	計
平成30年4月	105	6	3	3	7	124	166	11	7	4	8	196	0	0	0	0	0	0
5	264	28	6	6	37	341	241	20	2	6	30	299	1	0	0	0	0	1
6	228	27	10	5	29	299	219	26	11	5	32	293	1	1	0	0	0	2
7	210	29	8	9	28	284	235	24	14	12	25	310	1	0	0	0	0	1
8	206	28	3	2	26	265	230	32	3	3	30	298	25	0	0	1	0	26
9	54	8	6	4	9	81	46	12	2	3	9	72	0	0	0	0	0	0
10	57	25	3	8	12	105	82	10	13	7	12	124	62	295	57	0	5	419
11	289	36	21	18	46	410	258	27	11	13	45	354	89	155	8	16	9	277
12	50	8	1	2	7	68	74	14	6	5	11	110	595	7	0	0	2	604
平成31年1月	230	21	13	11	37	312	207	21	12	7	28	275	538	28	5	14	16	601
2	223	27	8	5	22	285	217	29	7	11	23	287	572	1	1	0	0	574
3	177	17	4	7	8	213	142	13	5	7	13	180	33	0	0	0	1	34
計	2,093	260	86	80	268	2,787	2,117	239	93	83	266	2,798	1,917	487	71	31	33	2,539
月平均	174.4	21.7	7.2	6.7	22.3	232.3	176.4	19.9	7.8	6.9	22.2	233.2	159.8	40.6	5.9	2.6	2.8	211.6
日平均	5.7	0.7	0.2	0.2	0.7	7.6	5.8	0.7	0.3	0.2	0.7	7.7	5.3	1.3	0.2	0.1	0.1	7.0

3. 配水施設修理状況

地区別 種別 月別	平 良 地 区				城 辺 地 区				下 地 地 区				上 野 地 区				伊 良 部 地 区				計
	鋳鉄管	鋼 管	塩ビ管	弁 栓 類	鋳鉄管	鋼 管	塩ビ管	弁 栓 類	鋳鉄管	鋼 管	塩ビ管	弁 栓 類	鋳鉄管	鋼 管	塩ビ管	弁 栓 類	鋳鉄管	鋼 管	塩ビ管	弁 栓 類	
平成30年4月	0	0	5	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	7
5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	2	0	3
6	0	0	2	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	1	0	7
7	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	4
8	0	0	2	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	5
9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
10	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	3
11	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
12	0	0	0	0	0	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	4
平成31年1月	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
2	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
3	0	0	2	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4
計	0	0	12	0	0	2	12	0	0	1	1	0	0	0	8	0	0	0	5	0	41
合 計	12				14				2				8				5				
月 平 均	1				1.17				0.17				0.67				0.42				
日 平 均	0.03				0.04				0.01				0.02				0.01				

4. 工 事

(1) 国庫補助事業(工事契約)

工 事 名	内 容		着工年月日	竣工年月日	請負金額(円)
	口 径 (mm)	延 長 (m)			
上水道施設整備事業 東添道水源開発工事(H29繰 建築)	-	-	平成30年7月3日	平成31年1月11日	45,396,936
上水道施設整備事業 配水管布設工事(H29繰 1工区)	DCIPφ150	259.54	平成30年7月7日	平成30年10月31日	13,491,900
上水道施設整備事業 配水管布設工事(H29繰 2工区)	DCIPφ150	229.45	平成30年8月17日	平成30年12月28日	16,647,164
上水道施設整備事業 下北ポンプ場改良工事	-	-	平成30年7月26日	平成31年1月31日	62,856,000
上水道施設整備事業 東添道水源開発工事(ポンプ・計装)	-	-	平成30年8月8日	平成31年2月22日	214,012,800
上水道施設整備事業 配水管布設工事(1工区)	DCIPφ100	777.07	平成30年9月13日	平成31年1月11日	32,985,900
上水道施設整備事業 東添道水源開発(導水管)	DCIPφ300	90.72	平成30年10月19日	平成31年3月8日	19,375,200
合 計					404,765,900

(2) 国庫補助事業(委託契約)

工 事 名	内 容	着工年月日	竣工年月日	請負金額(円)
上水道施設整備事業 調査設計業務(H29繰 野原送水管)	設計業務一式 測量業務一式	平成30年6月29日	平成30年11月30日	11,664,000
上水道施設整備事業 調査設計業務(H29繰 牧山配水管)	設計業務一式 測量業務一式	平成30年7月28日	平成31年1月11日	10,800,000
合 計				22,464,000

(3) 市負担工事

工 事 名	内 容	着工年月日	竣工年月日	請負金額(円)
消火栓設置工事(その1)	宮古島市上野(大嶺)地内	平成30年7月28日	平成30年9月18日	769,500
消火栓設置工事(その2)	宮古島市平良(池間)地内	平成30年10月11日	平成31年2月12日	756,000
消火栓設置工事(その3)	宮古島市上野(大嶺)地内	平成30年11月1日	平成31年1月25日	767,880
合 計				2,293,380

(4) 単独工事(工事契約)

工 事 名	内 容	着工年月日	竣工年月日	請負金額(円)
前浜ポンプ場改良工事	宮古島市下地(前浜)地内	平成29年11月14日	平成30年4月13日	6,447,600
前浜ポンプ場・来間配水池電気設備改良工事	宮古島市下地地内	平成29年11月15日	平成30年6月15日	46,440,000
来間配水池配水管布設工事	宮古島市下地(来間・前浜)地内	平成29年11月15日	平成30年5月31日	46,224,000
狩俣地区配水管布設工事	宮古島市平良狩俣地内	平成30年7月7日	平成30年11月30日	14,688,000
アスファルト路面復旧工事	宮古島市一円	平成30年6月22日	平成30年8月20日	8,564,400
富名腰12号線配水管改良工事	宮古島市平良(富名腰)地内	平成30年6月29日	平成30年9月30日	3,242,621
袖山浄水場ろ過池(1～6・8・9号)補砂工事	袖山浄水場内	平成30年7月3日	平成30年11月30日	32,940,000
乗瀬橋取付道路整備に伴う配水管布設工事	宮古島市伊良部地内	平成30年10月31日	平成31年3月15日	2,050,000
仲原地区配水管改良工事(その1)	宮古島市城辺仲原地内	平成30年10月5日	平成31年2月28日	26,190,000
仲原地区配水管改良工事(その2)	宮古島市城辺仲原地内	平成30年9月21日	平成31年3月31日	24,192,000
来間送水管及びポンプ小屋撤去工事	宮古島市下地(来間)地内	平成30年9月11日	平成31年1月31日	10,405,800
加治道西水源地井戸改修工事	加治道水源地	平成30年9月28日	平成30年11月30日	15,012,000
給水管切替工事(H29線 1工区)	宮古島市上野(大嶺)地内	平成30年9月21日	平成30年10月31日	534,600
底原水源地井戸改修工事	底原水源地	平成30年10月2日	平成31年1月31日	21,438,000
前浜ポンプ送水管布設工事来間配水池配水管布設工事(翌年度繰越分)	宮古島市下地(前浜)地内	平成30年10月19日	平成31年2月28日	18,468,000
給水管切替工事(1工区)	宮古島市上野(大嶺)地内	平成30年10月5日	平成31年1月25日	799,200
加治道浄水場・硬度低減化施設計装機器更新工事	宮古島市城辺地内	平成30年10月23日	平成31年3月15日	49,680,000
小 計				327,316,221

(5)単独事業(委託契約)

工 事 名	内 容	着工年月日	竣工年月日	請負金額(円)
水道施設資機材価格調査業務	宮古島市平良(東添道)及び城辺(下北)地内	平成30年4月13日	平成30年6月22日	3,002,400
平成30年度水道水源流域等地下水観測業務	白川田・東添道及び平良水源流域	平成30年4月25日	平成30年12月31日	6,976,800
配水管調査設計委託業務(上野地区)	宮古島市上野地内	平成30年5月25日	平成30年8月22日	9,504,000
伊良部地区水道施設検討業務	宮古島市地内	平成30年6月2日	平成30年10月31日	7,560,000
前浜ポンプ場ポンプ井改良及び配水管調査設計業務	宮古島市下地(前浜)地内	平成30年6月12日	平成30年9月30日	831,600
宮古島市管路情報管理システムデータ修正業務	宮古島市全域	令和90年6月19日	平成31年3月8日	9,525,600
前福・大野水源地改良調査設計業務	宮古島市平良地内	平成30年9月11日	平成31年1月31日	9,612,000
東添道水源開発工事監理業務	宮古島市平良字(東添道)地内	平成30年8月2日	平成31年2月7日	2,376,000
調査設計業務(導水管・配水管)	宮古島市地内	平成30年9月7日	平成31年1月18日	11,016,000
宮古島市管内海底送水管調査業務	与那覇～来間・狩俣～池間・狩俣～大神島	平成30年9月4日	平成30年12月21日	13,284,000
伊良部南区漏水調査業務	南区(伊良部・仲地・佐和田・長浜・ブロック外)	平成30年10月12日	平成30年11月30日	1,285,200
アセットマネジメント・経営戦略及び水道ビジョンの業務委託	宮古島市上下水道部総務課	平成30年12月6日	平成31年3月25日	3,024,000
合 計				77,997,600

(5)単独事業(調査委託契約)

工 事 名	内 容	着工年月日	竣工年月日	請負金額(円)
硬度低減化施設薬品費低減実証実験	袖山浄水場内	平成30年4月24日	平成31年2月28日	15,444,000
福里・東添道流域内新水源候補地調査設計検討業務	宮古島市地内	平成30年9月13日	平成31年3月20日	10,342,000
平成30年度地下水保全調査業務	宮古島市地内	平成30年10月25日	平成31年3月15日	34,560,000
合 計				60,346,000

(5)単独事業(土地売買契約)

所 在	地 番	地 目	地 積 (㎡)	所有権転移年月日	金 額 (円)
合 計					0

第6章 業務統計

第 6 章 業 務 統 計

1. 月別、用途別加入状況

単位:件

種 別 月 別	一 般 用	営 業 用	官 庁 用	臨 時 用	船 舶 用	連 合 栓	合 計	摘 要
平成30年4月	22,556	3,099	394	96	10	200	26,355	
5	22,802	3,110	397	94	10	202	26,615	
6	22,782	3,093	397	114	9	203	26,598	
7	22,775	3,103	397	114	9	206	26,604	
8	22,832	3,113	397	122	9	210	26,683	
9	22,841	3,112	397	124	9	214	26,697	
10	22,868	3,114	400	132	9	216	26,739	
11	22,917	3,131	400	141	9	218	26,816	
12	22,778	3,121	400	146	9	219	26,673	
平成31年1月	22,887	3,138	401	152	9	224	26,811	
2	22,811	3,170	400	156	9	224	26,770	
3	23,045	3,174	404	169	9	226	27,027	
合 計	273,894	37,478	4,784	1,560	110	2,562	320,388	

2. 月別、用途別使用状況

(イ) 使用水量

単位: m³

種別 月別	一般用		営業用		官庁用		臨時用		船舶用		連合栓		合計	
	件数	水量	件数	水量	件数	水量	件数	水量	件数	水量	件数	水量	件数	水量
平成30年4月	22,556	377,897	3,099	167,649	394	34,405	96	1,337	10	980	200	34,946	26,355	617,214
5	22,802	365,716	3,110	164,513	397	36,594	94	1,592	10	1,089	202	36,466	26,615	605,970
6	22,782	394,313	3,093	166,961	397	55,457	114	2,599	9	1,165	203	37,682	26,598	658,177
7	22,775	379,601	3,103	171,898	397	47,368	114	2,575	9	1,103	206	36,749	26,604	639,294
8	22,832	400,402	3,113	182,936	397	43,401	122	3,720	9	1,031	210	38,483	26,683	669,973
9	22,841	399,229	3,112	186,917	397	34,679	124	4,468	9	1,486	214	38,335	26,697	665,114
10	22,868	380,662	3,114	164,400	400	34,796	132	4,615	9	964	216	37,055	26,739	622,492
11	22,917	383,003	3,131	177,772	400	37,649	141	6,151	9	959	218	38,972	26,816	644,506
12	22,778	367,383	3,121	159,054	400	36,046	146	6,073	9	753	219	37,227	26,673	606,536
平成31年1月	22,887	386,982	3,138	155,009	401	32,075	152	5,940	9	827	224	38,477	26,811	619,310
2	22,811	377,933	3,170	153,530	400	32,751	156	7,502	9	863	224	40,005	26,770	612,584
3	23,045	344,112	3,174	146,803	404	30,699	169	5,976	9	642	226	36,364	27,027	564,596
計	273,894	4,557,233	37,478	1,997,442	4,784	455,920	1,560	52,548	110	11,862	2,562	450,761	320,388	7,525,766
月平均		379,769		166,454		37,993		4,379		989		37,563		627,147
日平均		12,486		5,472		1,249		144		32		1,235		20,619

3. 有効、無効水量

種 別 月 別	配 水 量	有 効 水 量					無 効 水 量		摘 要
		有 収 水 量	有 収 率	有効無収水量	計	有 効 率	水量	比 率	
平成30年4月	700,734	617,415	88.11	20,003	637,418	90.96	63,316	9.04	
5	756,782	606,046	80.08	18,871	624,917	82.58	131,865	17.42	
6	734,598	658,337	89.62	20,534	678,871	92.41	55,727	7.59	
7	784,481	639,557	81.53	19,909	659,466	84.06	125,015	15.94	
8	796,802	670,862	84.19	20,718	691,580	86.79	105,222	13.21	
9	765,089	666,388	87.10	20,824	687,212	89.82	77,877	10.18	
10	780,512	622,601	79.77	20,303	642,904	82.37	137,608	17.63	
11	741,071	644,486	86.97	20,608	665,094	89.75	75,977	10.25	
12	737,416	606,529	82.25	19,456	625,985	84.89	111,431	15.11	
平成31年1月	738,257	619,312	83.89	20,665	639,977	86.69	98,280	13.31	
2	669,194	612,622	91.55	19,602	632,224	94.48	36,970	5.52	
3	717,783	564,596	78.66	18,071	582,667	81.18	135,116	18.82	
計	8,922,719	7,525,648	84.34	239,564	7,765,212	87.03	1,154,404	12.94	
月 平 均	743,560	627,137		19,964	647,101		96,200		
日 平 均	24,379	20,562		655	21,216		3,154		

4. 地区別、用途別使用水量及び水道使用料金

※消費税を含む

栓 種 別	市町村別 区分 単位		平 良	城 辺	下 地	上 野	伊 良 部	合 計
	水量	単位						
一 般 用	水量	m ³	2,968,179	551,996	263,317	266,202	507,539	4,557,233
	金額	円	582,774,309	109,568,506	51,900,598	53,042,716	101,246,981	898,533,110
営 業 用	水量	m ³	1,204,333	121,382	216,988	341,694	113,045	1,997,442
	金額	円	376,042,284	39,625,864	77,233,328	124,425,254	34,325,474	651,652,204
官 庁 用	水量	m ³	294,449	49,830	34,932	39,754	36,955	455,920
	金額	円	106,337,638	17,882,642	12,576,437	14,405,265	13,346,473	164,548,455
臨 時 用	水量	m ³	8,316	5,195	2,655	31,334	5,048	52,548
	金額	円	4,956,512	2,438,507	1,323,673	14,321,603	2,412,848	25,453,143
船 舶 用	水量	m ³	9,494	0	0	0	2,368	11,862
	金額	円	4,397,163	0	0	0	1,102,195	5,499,358
連 合 栓	水量	m ³	411,188	2,281	2,511	9,181	25,600	450,761
	金額	円	78,857,296	436,333	492,412	1,789,239	5,021,526	86,596,806
合 計	水量	m ³	4,895,959	730,684	520,403	688,165	690,555	7,525,766
	金額	円	1,153,365,202	169,951,852	143,526,448	207,984,077	157,455,497	1,832,283,076
比 率	水量	%	65.06	9.71	6.91	9.14	9.18	100.00
	金額	%	62.95	9.28	7.83	11.35	8.59	100.00

5. 月別料金徴収状況

※消費税を含む

区分 年月	調 定 額	収入済額	未 収 額	比率(%)	備 考
平成 30 年 4 月	149,520,534	149,431,603	88,931	99.94	
5	147,220,399	147,145,070	75,329	99.95	
6	161,319,083	161,145,466	173,617	99.89	
7	156,799,645	156,634,704	164,941	99.89	
8	164,445,380	164,308,930	136,450	99.92	
9	163,071,714	162,934,283	137,431	99.92	
10	150,853,245	150,629,280	223,965	99.85	
11	158,441,462	158,162,218	279,244	99.82	
12	147,407,062	146,899,218	507,844	99.66	
平成 31 年 1 月	148,883,725	144,537,409	4,346,316	97.08	
2	148,038,511	134,970,763	13,067,748	91.17	
3	136,282,316	6,333,690	129,948,626	4.65	
計	1,832,283,076	1,683,132,634	149,150,442	91.86	

第 7 章 財 務

第 7 章 財 務

1. 平成30年度宮古島市水道事業決算報告書

(1)収益的收入及び支出

収 入

(単位:円)

区 分	予 算 額				決 算 額	予算額に比べ決算額の増減	備 考
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	地方公営企業法第24条 第3項の規定による支出 額に係る財源充当額	合 計			
第1款 水道事業収益	2,054,369,000	29,018,000	0	2,083,387,000	2,140,538,198	57,151,198	うち、仮受消費税及び地方消費税 137,036,910
第1項 営業収益	1,792,918,000	0	0	1,792,918,000	1,850,119,732	57,201,732	うち、仮受消費税及び地方消費税 136,800,672
第2項 営業外収益	261,446,000	29,018,000	0	290,464,000	290,418,466	△45,534	うち、仮受消費税及び地方消費税 236,238
第3項 特別利益	5,000	0	0	5,000	0	△5,000	

支 出

(単位:円)

区 分	予 算 額								決 算 額	地方公営企業法 第26条第2項の 規定による繰越額	不 用 額	備 考
	当 初 予 算 額	補 正 予算額	予 備 費 支 出 額	流用増減額	地方公営企 業法第24条 第3項の規定 による支出額	小 計	地方公営企業法 第26条第2項の 規定による繰越額	合 計				
第1款 水道事業費用	2,054,369,000	29,600,000	0	0	0	2,083,969,000	0	2,083,969,000	1,844,514,356	30,294,000	239,454,644	うち、仮払消費税 及び地方消費税 67,412,616
第1項 営業費用	1,884,001,000	2,585,000	0	0	0	1,886,586,000	0	1,886,586,000	1,656,587,410	30,294,000	229,998,590	うち、仮払消費税 及び地方消費税 62,942,542
第2項 営業外費用	155,360,000	37,000,000	0	0	0	192,360,000	0	192,360,000	187,926,946	0	4,433,054	うち、仮払消費税 及び地方消費税 4,470,074
第3項 特別損失	8,000	0	0	0	0	8,000	0	8,000	0	0	8,000	0
第4項 予備費	15,000,000	△9,985,000	0	0	0	5,015,000	0	20,000,000	0	0	20,000,000	

(2) 資本的収入及び支出

区 分	予 算 額						決 算 額	予算額に比べ決算額の増減	備 考
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	小 計	地方公営企業法第26条の規定による繰越額に係る財源充当額	継続費通次繰越額に係る財源充当額	合 計			
第1款 資本的収入	364,403,000	0	364,403,000	49,000,000	0	413,403,000	382,321,380	△31,081,620	
第1項 企 業 債	180,001,000	0	180,001,000	0	0	180,001,000	165,500,000	△14,501,000	
第2項 補 助 金	180,000,000	0	180,000,000	49,000,000	0	229,000,000	214,528,000	△14,472,000	
第3項 負 担 金	4,401,000	0	4,401,000	0	0	4,401,000	2,293,380	△2,107,620	
第4項 その他資本的収入	1,000	0	1,000	0	0	1,000	0	△1,000	

区 分	予 算 額							決 算 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	流 用 増 減 額	小 計	地方公営企業法第26条の規定による繰越額	継続費通次繰越額	合 計		地方公営企業法第26条の規定による繰越額	継続費通次繰越額	合 計		
第1款 資本的支出	807,523,000	6,791,000	0	814,314,000	197,111,600	0	1,011,425,600	956,669,780	30,593,970	0	30,593,970	24,161,850	うち、仮払消費税及び地方消費税 43,847,156
第1項 建設改良費	470,109,000	6,791,000	0	476,900,000	197,111,600	0	674,011,600	619,258,953	30,593,970	0	30,593,970	24,158,677	うち、仮払消費税及び地方消費税 43,847,156
第2項 企業債償還金	337,413,000	0	0	337,413,000	0	0	337,413,000	337,410,827	0	0	0	2,173	
第3項 予 備 費	1,000	0	0	1,000	0	0	1,000	0	0	0	0	1,000	

(注) 資本的収入額が資本的支出額に不足する額 574,348,400円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額 27,786,314円、減債積立金 256,416,210円及び、当年度損益勘定留保資金 290,145,876円で補てんした。

2. 平成30年度宮古島市水道事業損益計算書

(平成30年4月1日から平成31年3月31日まで)

1. 営業収益	(単位:円)		
(1) 給水収益	1,696,688,422		
(2) その他営業収益	16,630,638	1,713,319,060	
2. 営業費用			
(1) 原水及び浄水費	535,471,705		
(2) 配水及び給水費	288,473,763		
(3) 総係費	239,213,732		
(4) 減価償却費	530,485,668		
(5) 資産減耗費	0	1,593,644,868	
営業利益			119,674,192
3. 営業外収益			
(1) 受取利息及び配当金	160		
(2) 他会計負担金	45,196,446		
(3) 長期前受金戻入	240,339,792		
(4) 雑収益	4,645,830	290,182,228	
4. 営業外費用			
(1) 調査費	55,875,926		
(2) 支払利息	82,941,046		
(3) 雑支出	3,446,220		
(4) その他営業外費用	0	142,263,192	147,919,036
経常利益			267,593,228
5. 特別利益			
(1) 固定資産売却益	0		
(2) その他特別利益	0	0	
6. 特別損失			
(1) 過年度損益修正損	0		0
(2) その他特別損失	0	0	0
当年度純利益			267,593,228
前年度繰越利益剰余金			50,000,000
その他未処分利益剰余金変動額			256,416,210
当年度未処分利益剰余金			574,009,438

3. 平成30年度宮古島市水道事業剰余金計算書

(平成30年4月1日から平成31年3月31日まで)

(単位:円)

	資 本 金		剰 余 金										資本合計
	自己資本金		資 本 剰 余 金						利 益 剰 余 金				
	引継資本金	組入資本金	受贈財産 評 価 額	補助金	寄付金	負担金	資本剰余金 合 計	減債積立金	建設改良 積 立 金	未処分利益 剰 余 金	利益剰余金 合 計		
前 年 度 末 残 高	583,522,153	1,098,490,779	1,937,342	790,532,713	3,752,825	41,023,969	837,246,849	0	324,264,859	733,429,567	1,057,694,426	3,576,954,207	
前 年 度 処 分 額	0	318,491,051	0	0	0	0	0	289,203,375	75,735,141	△683,429,567	△318,491,051	0	
議会の議決による処分額	0	318,491,051	0	0	0	0	0	289,203,375	75,735,141	△683,429,567	△318,491,051	0	
減 債 積 立 金	0		0	0	0	0	0	289,203,375	0	△289,203,375	0	0	
建 設 改 良 積 立 金	0	0	0	0	0	0	0	0	75,735,141	△75,735,141	0	0	
資 本 金 へ の 組 入	0	318,491,051	0	0	0	0	0	0	0	△318,491,051	△318,491,051	0	
処 分 後 残 高	583,522,153	1,416,981,830	1,937,342	790,532,713	3,752,825	41,023,969	837,246,849	289,203,375	400,000,000	(繰越利益剰余金) 50,000,000	739,203,375	3,576,954,207	
当 年 度 変 動 額	0	0	0	0	0	0	0	△256,416,210	0	524,009,438	267,593,228	267,593,228	
自 己 資 金 へ の 組 入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
企業債（負担）への振替	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
他 会 計 借 入 金 （ 負 債 ） へ の 受 入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
長期前受金への振替	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
未処分利益剰余金 変 動 額 へ の 振 替	0	0	0	0	0	0	0	△256,416,210	0	256,416,210	0	0	
当 年 度 純 利 益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	267,593,228	267,593,228	267,593,228	
当 年 度 末 残 高	583,522,153	1,416,981,830	1,937,342	790,532,713	3,752,825	41,023,969	837,246,849	32,787,165	400,000,000	(当年度未処分利益剰余金) 574,009,438	1,006,796,603	3,844,547,435	

4. 平成30年度宮古島市水道事業剰余金処分計算書

(単位:円)

1. 当年度未処分利益剰余金		574,009,438
2. 利益剰余金処分額		
(1) 減債積立金	217,593,228	
(2) 建設改良積立金	<u>50,000,000</u>	
(3) 資本金への組入	<u>256,416,210</u>	<u>524,009,438</u>
3. 翌年度繰越利益剰余金		<u><u>50,000,000</u></u>

5.平成30年度宮古島市水道事業貸借対照表
(平成31年3月31日)

(単位:円)

資 産 の 部

1. 固定資産

(1) 有形固定資産

イ 土 地		648,966,482	
ロ 建 物	1,214,756,754		
減価償却累計額	<u>△ 517,963,359</u>	696,793,395	
ハ 構 築 物	20,848,603,065		
減価償却累計額	<u>△ 10,074,594,332</u>	10,774,008,733	
ニ 機 械 及 び 装 置	5,439,460,081		
減価償却累計額	<u>△ 4,781,729,811</u>	657,730,270	
ホ 車 両 運 搬 具	11,728,642		
減価償却累計額	<u>△ 9,765,069</u>	1,963,573	
ヘ 器 具 及 び 備 品	65,938,996		
減価償却累計額	<u>△ 50,094,070</u>	15,844,926	
ト リ ー ス 資 産	6,003,497		
減価償却累計額	<u>△ 4,989,145</u>	1,014,352	
チ 建 設 仮 勘 定		<u>29,990,943</u>	
有形固定資産合計			12,826,312,674

(2) 無形固定資産

イ 電 話 加 入 権		<u>174,930</u>	
無形固定資産合計			<u>174,930</u>
固定資産合計			12,826,487,604

2. 流動資産

(1) 現 金 預 金		942,791,595	
(2) 未 収 金	190,265,566		
貸 倒 引 当 金	<u>△ 4,093,830</u>	186,171,736	
(3) 貯 蔵 品		10,375,430	
(4) 仮 払 金		480,810	
(5) その他流動資産		<u>0</u>	
流動資産合計			<u>1,139,819,571</u>
資 産 合 計			<u><u>13,966,307,175</u></u>

負 債 の 部

(単位:円)

3. 固定負債

(1) 企 業 債		
イ 建設改良費等の財源に 充てるための企業債	3,512,810,088	
企 業 債 合 計		3,512,810,088
(2) 他 会 計 借 入 金		88,583,724
イ 建設改良費等の財源に 充てるための長期借入金		
他会計借入金合計		
(3) リ ー ス 債 務		
(4) 引 当 金		
イ 修 繕 引 当 金	196,180,000	
引 当 金 合 計		196,180,000
固 定 負 債 合 計		3,797,573,812

4. 流動負債

(1) 一 時 借 入 金		165,500,000
(2) 企 業 債		
イ 建設改良費等の財源に 充てるための企業債	313,960,249	
企 業 債 合 計		313,960,249
(3) 他 会 計 借 入 金		
イ 建設改良費等の財源に 充てるための長期借入金	6,318,314	
他会計借入金合計		6,318,314
(4) リ ー ス 債 務		198,062
(5) 未 払 金		170,964,038
(6) 前 受 金		202,102
(6) 引 当 金		
イ 賞 与 引 当 金	16,246,542	
ロ 法定福利費引当金	3,325,386	
ハ 修 繕 引 当 金	2,900,000	
引 当 金 合 計		22,471,928
(6) そ の 他 流 動 負 債		22,485
流 動 負 債 合 計		679,637,178

5. 繰延収益

(1) 長 期 前 受 金	12,542,746,849	
(2) 長 期 前 受 金 収益化累計額	△ 6,898,198,099	
繰 延 収 益 合 計		5,644,548,750
負 債 合 計		10,121,759,740

資 本 の 部

(単位:円)

6. 資 本 金

(1) 自 己 資 本 金

イ 引 継 資 本 金	583,522,153		
ロ 組 入 資 本 金	1,416,981,830		
自己資本金合計		2,000,503,983	
資 本 金 合 計			2,000,503,983

7. 剰 余 金

(1) 資 本 剰 余 金

イ 受 贈 財 産 評 価 額	1,937,342		
ロ 補 助 金	790,532,713		
ハ 寄 附 金	3,752,825		
ニ 工 事 負 担 金	41,023,969		
資本剰余金合計		837,246,849	

(2) 利 益 剰 余 金

イ 減 債 積 立 金	32,787,165		
ロ 建 設 改 良 積 立 金	400,000,000		
ハ 当 年 度 未 処 分 利 益 剰 余 金	574,009,438		
利益剰余金合計		1,006,796,603	
剰 余 金 合 計			1,844,043,452
資 本 合 計			3,844,547,435
負 債 資 本 合 計			13,966,307,175

6. 平成30年度 宮古島市水道事業会計キャッシュ・フロー計算書(間接法)

(平成30年4月1日から平成31年3月31日)

(単位:円)

1. 業務活動によるキャッシュ・フロー

当 年 度 純 利 益	267,593,228
減 価 償 却 費	530,485,668
資 産 減 耗 費 等	0
貸 倒 引 当 金 の 増 加 額	△588,667
引 当 金 等 の 増 加 額	△44,305,409
長 期 前 受 金 戻 入 額	△240,339,792
受 取 利 息 及 び 配 当 金	△160
支 払 利 息	82,941,046
固 定 資 産 売 却 損 益	0
固 定 資 産 除 却 損	0
未 収 金 の 減 少 額	△38,552,295
た な 卸 資 産 の 増 加 額	△4,446,875
前 払 金 等 の 増 加 額	0
そ の 他 流 動 資 産 の 増 減 額	37,065,140
未 払 金 の 増 加 額	37,616,510
前 受 金 等 の 増 加 額	△8,729
そ の 他 流 動 負 債 の 増 加 額	22,485
小 計	627,482,150
利 息 及 び 配 当 金 の 受 取 額	160
利 息 の 支 払 額	△82,941,046
業務活動によるキャッシュ・フロー	544,541,264

2. 投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出	△573,259,203
有形固定資産の売却による収入	0
国庫補助金等による収入	198,637,038
負担金による収入	2,123,500
投資活動によるキャッシュ・フロー	△372,498,665

3. 財務活動によるキャッシュ・フロー

一 時 借 入 金 に よ る 収 入	165,500,000
建 設 改 良 企 業 債 等 に よ る 収 入	0
建 設 改 良 企 業 債 等 の 償 還 に よ る 支 出	△329,954,464
建 設 改 良 他 会 計 借 入 金 等 の 償 還 に よ る 支 出	△7,456,363
リ ー ス 債 務 の 返 済 に よ る 支 出	△896,039
財務活動によるキャッシュ・フロー	△172,806,866

4. 資金の増加(減少)額 △764,267

5. 資金期首残高 943,555,862

6. 資金期末残高 942,791,595

7. 企 業 債 明 細 書

(単位：円)

種 類	発行年月日	発行総額	償 還 高		未償還残高	発行価格	利率 (%)	償還終期
			当年度償還高	償還高累計				
資 金 運 用 部 資 金	H 1. 3. 27	315,000,000	21,109,937	315,000,000	0	315,000,000	4.85	H31. 3. 25
〃	H 1. 3. 27	18,900,000	1,266,596	18,900,000	0	18,900,000	4.85	H31. 3. 25
〃	H 5. 3. 25	108,000,000	5,827,957	81,977,751	26,022,249	108,000,000	4.40	R5. 3. 25
公 営 公 庫 資 金	H 5. 3. 26	46,300,000	2,877,626	40,145,939	6,154,061	46,300,000	4.50	R3. 3. 20
資 金 運 用 部 資 金	H 6. 3. 23	122,500,000	6,102,169	88,447,520	34,052,480	122,500,000	3.65	R6. 3. 1
〃	H 6. 3. 23	31,200,000	1,554,185	22,527,043	8,672,957	31,200,000	3.65	R6. 3. 1
公 営 公 庫 資 金	H 6. 3. 23	52,500,000	2,981,292	42,861,796	9,638,204	52,500,000	3.75	R4. 3. 20
〃	H 6. 3. 23	13,400,000	760,939	10,939,963	2,460,037	13,400,000	3.75	R4. 3. 20
資 金 運 用 部 資 金	H 7. 3. 27	138,000,000	6,888,397	89,305,591	48,694,409	138,000,000	4.65	R7. 3. 1
〃	H 7. 3. 27	15,400,000	768,705	9,965,986	5,434,014	15,400,000	4.65	R7. 3. 1
公 営 公 庫 資 金	H 7. 3. 27	138,000,000	7,943,485	102,220,139	35,779,861	138,000,000	4.75	R5. 3. 20
〃	H 7. 3. 27	15,400,000	886,447	11,407,175	3,992,825	15,400,000	4.75	R5. 3. 20
資 金 運 用 部 資 金	H 8. 3. 14	117,000,000	5,335,064	74,598,574	42,401,426	117,000,000	3.15	R8. 3. 1
〃	H 8. 3. 14	9,900,000	451,429	6,312,187	3,587,813	9,900,000	3.15	R8. 3. 1
公 営 公 庫 資 金	H 8. 3. 22	78,100,000	4,027,586	55,894,048	22,205,952	78,100,000	3.25	R6. 3. 20
〃	H 8. 3. 22	6,700,000	345,517	4,795,009	1,904,991	6,700,000	3.25	R6. 3. 20
資 金 運 用 部 資 金	H 9. 3. 25	151,000,000	6,616,758	90,888,460	60,111,540	151,000,000	2.80	R9. 3. 1
〃	H 9. 3. 25	11,000,000	482,015	6,621,015	4,378,985	11,000,000	2.80	R9. 3. 1
公 営 公 庫 資 金	H 9. 3. 26	7,300,000	359,935	4,908,532	2,391,468	7,300,000	2.90	R7. 3. 20
〃	H 9. 3. 28	100,700,000	4,965,130	67,710,852	32,989,148	100,700,000	2.90	R7. 3. 20
資 金 運 用 部 資 金	H10. 3. 25	205,800,000	8,665,759	119,095,053	86,704,947	205,800,000	2.10	R10. 3. 1

(単位：円)

種 類	発行年月日	発行総額	償 還 高		未償還残高	発行価格	利率 (%)	償還終期
			当年度償還高	償還高累計				
資 金 運 用 部 資 金	H10. 3. 25	15,300,000	644,247	8,854,003	6,445,997	15,300,000	2.10	R10. 3. 1
公 営 公 庫 資 金	H10. 3. 25	137,200,000	6,442,748	87,928,683	49,271,317	137,200,000	2.20	R8. 3. 20
〃	H10. 3. 25	10,200,000	478,980	6,536,973	3,663,027	10,200,000	2.20	R8. 3. 20
〃	H11. 3. 24	346,700,000	15,895,793	206,839,053	139,860,947	346,700,000	2.10	R9. 3. 20
資 金 運 用 部 資 金	H11. 3. 25	88,100,000	3,632,992	47,273,181	40,826,819	88,100,000	2.10	R11. 3. 1
公 営 公 庫 資 金	H11. 3. 30	58,700,000	2,691,327	35,020,053	23,679,947	58,700,000	2.10	R9. 3. 20
資 金 運 用 部 資 金	H11.10.29	520,300,000	21,213,015	271,574,030	248,725,970	520,300,000	1.90	R11. 9. 25
公 営 公 庫 資 金	H12. 3. 22	320,800,000	14,388,473	177,566,663	143,233,337	320,800,000	2.00	R10. 3. 20
資 金 運 用 部 資 金	H12. 3. 24	481,200,000	19,434,155	239,834,907	241,365,093	481,200,000	2.00	R12. 3. 1
〃	H12. 3. 24	311,400,000	12,576,467	155,204,886	156,195,114	311,400,000	2.00	R12. 3. 1
公 営 公 庫 資 金	H12. 3. 30	207,600,000	9,311,243	114,909,099	92,690,901	207,600,000	2.00	R10. 3. 20
〃	H13. 3. 22	265,500,000	11,665,311	137,670,682	127,829,318	265,500,000	1.65	R11. 3. 20
資 金 運 用 部 資 金	H13. 3. 26	328,000,000	13,033,766	154,261,902	173,738,098	328,000,000	1.60	R13. 3. 1
公 営 公 庫 資 金	H14. 3. 22	182,700,000	7,860,430	83,869,286	98,830,714	182,700,000	2.20	R12. 3. 20
財 政 融 資 資 金	H14. 6. 28	224,800,000	8,706,969	93,385,074	131,414,926	224,800,000	2.10	R14. 3. 25
〃	H15. 3. 25	93,000,000	3,618,561	37,519,721	55,480,279	93,000,000	1.20	R15. 3. 1
〃	H16. 3. 25	299,500,000	11,170,326	102,301,678	197,198,322	299,500,000	2.00	R16. 3. 1
公 営 公 庫 資 金	H17. 3. 23	125,500,000	5,076,171	42,084,274	83,415,726	125,500,000	2.10	R15. 3. 20
財 政 融 資 資 金	H17. 3. 25	204,500,000	7,439,540	61,677,910	142,822,090	204,500,000	2.10	R17. 3. 1
〃	H18. 3. 27	250,000,000	8,906,768	66,306,074	183,693,926	250,000,000	2.10	R18. 3. 1
〃	H19. 3. 26	156,500,000	5,460,367	35,931,967	120,568,033	156,500,000	2.10	R19. 3. 1

(単位：円)

種 類	発行年月日	発行総額	償 還 高		未償還残高	発行価格	利率 (%)	償還終期
			当年度償還高	償還高累計				
財 政 融 資 資 金	H20. 3. 25	127,000,000	4,339,489	24,727,751	102,272,249	127,000,000	2.10	R20. 3. 1
公営公庫資金(借換)	H20. 9. 22	11,900,000	1,268,878	11,900,000	0	11,900,000	2.45	H31. 3. 20
沖縄県農業協同組合	H21. 3. 19	147,600,000	13,418,000	134,180,000	13,420,000	147,600,000	2.35	R2. 3. 30
〃	H21. 3. 19	86,100,000	7,175,000	71,750,000	14,350,000	86,100,000	2.40	R3. 3. 30
〃	H21. 3. 19	14,000,000	1,272,000	12,720,000	1,280,000	14,000,000	2.35	R2. 3. 30
財 政 融 資 資 金	H21. 3. 25	85,100,000	2,899,065	13,962,333	71,137,667	85,100,000	1.90	R21. 3. 1
沖縄県市町村振興資金	H23. 9. 16	14,200,000	1,680,232	12,516,239	1,683,761	14,200,000	0.21	R2. 2. 10
財 政 融 資 資 金	H24. 4. 24	120,500,000	3,924,837	7,779,969	112,720,031	120,500,000	1.80	R24. 3. 25
沖縄県市町村振興資金	H25. 3. 22	73,300,000	8,155,793	48,764,046	24,535,954	73,300,000	0.14	R4. 2. 10
財 政 融 資 資 金	H25. 3. 25	179,200,000	5,956,593	5,956,593	173,243,407	179,200,000	1.50	R25. 3. 1
〃	H27. 2. 24	63,000,000	0	0	63,000,000	63,000,000	1.10	R26. 9. 25
〃	H27. 3. 25	148,700,000	0	0	148,700,000	148,700,000	1.20	R27. 3. 1
〃	H28. 3. 25	114,000,000	0	0	114,000,000	114,000,000	0.50	R28. 3. 1
〃	H29. 3. 27	87,900,000	0	0	87,900,000	87,900,000	0.60	R29. 3. 1
合 計		7,602,100,000	329,954,464	3,775,329,663	3,826,770,337	7,602,100,000		

合併特例債明細書

(単位：円)

種 類	発行年月日	発行総額	償 還 高		未償還残高	発行価格	利率 (%)	償還終期
			当年度償還高	償還高累計				
宮 古 島 市 役 所	H21. 3. 25	8,940,000	1,206,941	8,940,000	0	8,940,000	2.25	H31. 3. 25
〃	H22. 5. 28	7,260,000	404,520	2,327,520	4,932,480	7,260,000	1.70	R12. 3. 20
〃	H23. 5. 26	16,320,000	901,878	4,377,582	11,942,418	16,320,000	1.50	R13. 3. 20
〃	H24. 5. 30	23,850,000	1,319,210	5,183,448	18,666,552	23,850,000	1.20	R14. 3. 20
〃	H25. 5. 30	18,960,000	1,049,248	3,116,602	15,843,398	18,960,000	1.00	R15. 3. 20
〃	H26. 5. 29	13,830,000	684,586	2,697,841	11,132,159	13,830,000	1.00	R16. 03. 20
〃	H27. 5. 26	38,010,000	1,889,980	5,624,969	32,385,031	38,010,000	0.80	R17. 03. 20
合 計		127,170,000	7,456,363	32,267,962	94,902,038	127,170,000		

8. 固定資産明細書

(1)有形固定資産

(単位:円)

資産の種類	年度当初の 現在高	当年度 増加額	当年度 減少額	年度末 現在高	減価償却累計額			年度末 償却未済額
					当年増加額	当年減少額	累計	
土地	648,966,482	0	0	648,966,482	0	0	0	648,966,482
建物	1,170,097,757	44,658,997	0	1,214,756,754	23,858,055	0	517,963,359	696,793,395
構築物	20,087,881,027	760,722,038	0	20,848,603,065	397,815,737	0	10,074,594,332	10,774,008,733
機械及び装置	5,438,203,526	1,256,555	0	5,439,460,081	105,533,965	0	4,781,729,811	657,730,270
車両運搬具	11,229,092	499,550	0	11,728,642	481,366	0	9,765,069	1,963,573
器具備品	59,919,996	6,019,000	0	65,938,996	1,715,916	0	50,094,070	15,844,926
リース資産	6,003,497	0	0	6,003,497	1,080,629	0	4,989,145	1,014,352
建設仮勘定	27,883,334	29,990,943	27,883,334	29,990,943	0	0	0	29,990,943
合 計	27,450,184,711	843,147,083	27,883,334	28,265,448,460	530,485,668	0	15,439,135,786	12,826,312,674

(2)無形固定資産

(単位:円)

資産の種類	年度当初の現在高	当年度増加額	当年度減少額	当年度減価償却高	年度末現在高	備 考
電話加入権	174,930	0	0	0	174,930	
合 計	174,930	0	0	0	174,930	

9. 平成31年度 宮古島市水道事業会計予算実施計画

(イ) 収益的収入及び支出

収 入

単位:千円

款	項	目	予 定 額	備 考
1. 水道事業収益			2,192,918	
	1. 営 業 収 益		1,891,507	
		1. 給 水 収 益	1,878,895	水道料金
		2. そ の 他 営 業 収 益	12,612	給水工事申込加入金、工事検査料
	2. 営 業 外 収 益		301,406	
		1. 受 取 利 息	2	
		2. 他 会 計 補 助 金	1	
		3. 補 助 金	1	
		4. 他 会 計 負 担 金	71,027	児童手当、消火栓維持管理、交付金事業
		5. 長 期 前 受 金 戻 入	226,635	
		6. 資 本 費 繰 入 収 益	1	
		7. 雑 収 益	3,738	
		8. 消 費 税 還 付 金	1	
	3. 特 別 利 益		5	
		1. 固 定 資 産 売 却 益	1	
		2. 過 年 度 損 益 修 正 益	1	
		4. そ の 他 特 別 利 益	3	

(消費税込み)

支 出

単位:千円

款	項	目	予 定 額	備 考
1. 水道事業費用			2,192,918	
	1. 営 業 費 用		1,963,420	
		1. 原 水 及 び 浄 水 費	681,100	揚、送水並びに浄水作業水源及び浄水施設の維持管理に要する経費
		2. 配 水 及 び 給 水 費	464,056	給、配水管の維持管理に要する経費
		3. 総 係 費	313,602	事業運営に伴う関連費及び料金調定業務に要する経費
		4. 減 価 償 却 費	504,658	
		5. 資 産 減 耗 費	2	
		6. そ の 他 営 業 費 用	2	
	2. 営 業 外 費 用		209,490	
		1. 調 査 費	105,437	
		2. 支 払 利 息	78,318	
		3. 雑 支 出	1	
		4. 消 費 税	25,733	
		5. そ の 他 営 業 外 費 用	1	
	3. 特 別 損 失		8	
		1. 固 定 資 産 売 却 損	1	
		2. 災 害 に よ る 損 失	1	
		3. 過 年 度 損 益 修 正 損	1	
		4. そ の 他 特 別 損 失	5	
	4. 予 備 費		20,000	
		1. 予 備 費	20,000	

(消費税込み)

(ロ) 資本的収入及び支出
収 入

単位:千円

款	項	目	予 定 額	備 考
1. 資本的収入			396,918	
	1. 企 業 債		197,001	
		1. 企 業 債	197,001	
	2. 補 助 金		197,000	
		1. 補 助 金	197,000	
	3. 負 担 金		2,916	
		1. 負 担 金	2,916	消火栓設置工事
	4 その他資本的収入		1	
		1. 固 定 資 産 売 却 代 金	1	

支 出

単位:千円

款	項	目	予 定 額	備 考
1. 資本的支出			907,623	
	1. 建 設 改 良 費		587,342	
		1. 施 設 費	576,157	
		2. 営 業 設 備 費	10,970	
		3. 土 地 購 入 費	1	
		4. リ ー ス 資 産 購 入 費	214	
	2. 企 業 債 償 還 金		320,280	
		1. 企 業 債 償 還 金	320,280	
	3. 予 備 費		1	
		1. 予 備 費	1	

(消費税込み)

10. 経 営 分 析

(イ)費用の比較構成表

年 度 科 目	平成21年度		22		23		24		25	
	金 額	構成比	金 額	構成比	金 額	構成比	金 額	構成比	金 額	構成比
人 件 費	396,987,063	25.42	368,410,988	23.56	367,739,835	24.36	364,450,468	24.72	344,870,921	22.54
動 力 費	94,229,848	6.03	90,599,017	5.80	97,455,659	6.46	99,677,322	6.76	101,564,246	6.64
薬 品 費	133,587,467	8.55	131,649,155	8.42	120,740,570	8.00	112,095,515	7.60	112,158,806	7.33
修 繕 費	45,154,916	2.89	80,118,424	5.12	113,158,351	7.50	105,320,723	7.14	80,769,755	5.28
そ の 他 諸 経 費	253,153,775	16.21	234,029,562	14.97	222,865,517	14.76	266,475,918	18.08	282,053,978	18.43
減 価 償 却 費	396,943,402	25.42	380,934,211	24.37	354,033,680	23.45	341,226,511	23.15	343,044,780	22.42
資 産 減 耗 費	48,946,712	3.13	96,010,080	6.14	53,401,718	3.54	0	0.00	5,526,352	0.36
そ の 他 営 業 費 用	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
支 払 利 息	179,183,253	11.47	167,265,821	10.70	155,035,153	10.27	142,972,425	9.70	119,547,210	7.81
調 査 費	0	0.00	0	0.00	12,500,000	0.83	23,711,429	1.61	28,180,000	1.84
そ の 他 営 業 外 費 用	1,608,699	0.10	807,587	0.05	980,103	0.07	2,618,547	0.18	101,094,127	6.61
特 別 損 失	12,070,320	0.77	13,615,987	0.87	11,649,700	0.77	15,555,040	1.06	11,223,280	0.73
合 計	1,561,865,455	100.00	1,563,440,832	100.00	1,509,560,286	100.00	1,474,103,898	100.00	1,530,033,455	100.00

年 度 科 目	25		26		27		28		29	
	金 額	構成比	金 額	構成比	金 額	構成比	金 額	構成比	金 額	構成比
人 件 費	334,929,967	19.66	319,241,708	19.73	288,337,573	17.95	277,425,108	16.82	267,645,196	15.42
動 力 費	105,258,828	6.18	88,944,450	5.50	79,121,598	4.93	89,571,704	5.43	100,284,161	5.78
薬 品 費	123,145,771	7.23	136,352,155	8.43	140,216,538	8.73	148,742,465	9.02	156,670,600	9.03
修 繕 費	55,767,441	3.27	59,271,765	3.66	93,735,085	5.84	46,760,179	2.83	133,315,093	7.68
そ の 他 諸 経 費	336,112,727	19.73	312,072,861	19.29	351,296,647	21.87	370,792,484	22.47	405,244,150	23.34
減 価 償 却 費	574,700,514	33.73	570,686,535	35.28	529,789,357	32.98	527,777,484	31.99	530,485,668	30.56
資 産 減 耗 費	267,836	0.02	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
そ の 他 営 業 費 用	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
支 払 利 息	112,330,008	6.59	106,071,768	6.56	98,531,792	6.13	90,940,308	5.51	82,941,046	4.78
調 査 費	9,650,000	0.57	13,880,000	0.86	24,700,000	1.54	91,100,000	5.52	55,875,926	3.22
そ の 他 営 業 外 費 用	15,503,250	0.91	326,177	0.02	0	0.00	0	0.00	0	0.00
雑 支 出	-	-	-	-	496,455	0.03	6,586,097	0.40	3,446,220	0.20
特 別 損 失	36,281,520	2.13	10,800,340	0.67	0	0.00	90,982	0.01	0	0.00
合 計	1,703,947,862	100.00	1,617,647,759	100.00	1,606,225,045	100.00	1,649,786,811	100.00	1,735,908,060	100.00

(ロ)財務分析表

項 目		算 出 方 法	H21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
自 己 資 本 構 成 比 率		$\frac{\text{資本金+剰余金+評価差額等+繰延収益}}{\text{負 債 資 本 合 計}} \times 100$	64.29	66.39	67.82	69.04	70.13	60.04	62.04	63.66	65.95	67.94
固 定 資 産 対 長 期 資 本 比 率		$\frac{\text{固 定 資 産}}{\text{資本金+剰余金+評価差額等+固定負債+繰延収益}} \times 100$	97.92	98.11	97.36	96.90	96.87	98.57	97.35	95.91	95.46	96.54
流 動 比 率		$\frac{\text{流 動 資 産}}{\text{流 動 負 債}} \times 100$	434.18	601.47	848.68	974.46	354.53	129.02	164.33	200.17	210.77	167.71
総 収 益 対 総 費 用 比 率		$\frac{\text{総 収 益}}{\text{総 費 用}} \times 100$	106.44	103.60	107.09	109.83	110.02	108.83	117.04	118.52	122.12	115.42
営 業 収 益 対 営 業 費 用 比 率		$\frac{\text{営 業 収 益}-\text{受 託 工 事 収 益}}{\text{営 業 費 用}-\text{受 託 工 事 費 用}} \times 100$	121.14	116.35	120.87	122.75	124.32	102.51	109.55	111.08	115.15	107.51
企業債償還元金対 減価償却額比率		$\frac{\text{建設改良のための企業債償還元金}}{\text{当年度減価償却費}-\text{長期前受金戻入}} \times 100$	104.56	107.90	126.64	217.53	119.21	70.37	123.01	127.64	118.51	113.72
給水収益に対する比率	企 業 債 償 還 元 金	$\frac{\text{建設改良のための企業債償還元金}}{\text{料 金 収 入}} \times 100$	25.54	25.82	28.09	47.35	26.17	26.05	24.15	22.44	20.44	19.45
	企業債利息	$\frac{\text{企 業 債 利 息}}{\text{料 金 収 入}} \times 100$	11.03	10.51	9.72	9.12	7.65	7.23	6.57	6.03	5.46	4.89
	職員給与費	$\frac{\text{職 員 給 与 費}}{\text{料 金 収 入}} \times 100$	24.43	23.14	23.04	23.25	22.07	21.57	19.76	17.66	16.66	15.77

(ハ)費用の比較構成表

項 目	算 出 方 法	単位	H21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
負 荷 率	$\frac{\text{一日平均配水量}}{\text{一日最大配水量}} \times 100$	%	88.20	80.80	64.00	79.89	76.36	76.16	79.93	83.01	76.21	78.55
施設利用率	$\frac{\text{一日平均配水量}}{\text{一日配水能力}} \times 100$	%	61.34	61.12	62.02	60.81	59.59	60.37	58.70	60.75	70.44	71.89
最大稼働率	$\frac{\text{一日最大配水量}}{\text{一日配水能力}} \times 100$	%	69.54	75.65	96.91	76.12	78.04	79.26	73.44	73.18	92.42	91.52
配水管 使用効率	$\frac{\text{年間総配水量}}{\text{導・送・配水管延長}}$	m³/m	16.95	16.81	16.95	16.32	15.90	16.12	15.68	16.13	16.81	17.14
固定資産 使用効率	$\frac{\text{年間総配水量}}{\text{有形固定資産}} \times 1,000$	m³/万円	4.58	4.59	4.67	4.51	4.46	6.28	6.26	6.62	6.97	6.96
供給単価	$\frac{\text{給水収益}}{\text{年間総有収水量}}$	円/m³	219.84	218.85	219.30	218.41	218.52	219.00	222.35	223.00	224.10	225.45
給水原価	$\frac{\text{総費用}-\text{受託工事費}-\text{長期前受金戻入}}{\text{年間総有収水量}}$	円/m³	211.31	214.92	207.44	205.40	213.95	240.31	186.25	186.22	189.69	198.73
職員1人当たり 給水人口	$\frac{\text{現在給水人口}}{\text{損益勘定所属職員数}}$	人	1,138	1,242	1,250	1,329	1,357	1,424	1,494	1,629	1,682	1,704
職員1人当たり 給水量	$\frac{\text{年間総有収水量}}{\text{損益勘定所属職員数}}$	m³/人	153,983	165,334	165,385	175,041	178,783	186,595	201,831	221,864	232,153	235,177
職員1人当たり 営業収益	$\frac{\text{営業収益}}{\text{損益勘定所属職員数}}$	千円	34,549	36,539	36,519	38,598	39,472	41,281	45,237	49,902	52,574	53,541
給水量1万m³ 当たり職員数	$\frac{\text{損益勘定所属職員数}}{\text{有収水量} \div 365 \div 10,000}$	人	24	24	22	21	20	20	18	16	16	16
資 本 費	$\frac{\text{減価償却費}+\text{企業債利息}-\text{長期前受金戻入}}{\text{年間総有収水量}}$	円/m³	82.26	88.55	55.99	47.55	48.74	96.88	58.24	52.65	50.89	49.57
料金回収率	$\frac{\text{供給単価}}{\text{給水原価}} \times 100$	%	104.03	101.82	105.71	106.33	102.14	91.13	119.38	119.75	118.14	113.45

第 8 章 議会及び許認可事項

第8章 議会及び許認可事項

1. 議会議決・認定事項

議案番号	件名	提出年月日	議決年月日
議案第125号	平成29年度宮古島市水道事業会計利益の処分について	平成30. 8. 30	平成30. 9. 21
議案第108号	平成30年度宮古島市水道事業会計補正予算（第1号）	平成30. 8. 30	平成30. 9. 21
議案第134号	平成30年度宮古島市水道事業会計補正予算（第2号）	平成30. 12. 5	平成30. 12. 18
議案第12号	平成30年度宮古島市水道事業会計補正予算（第3号）	平成31. 3. 4	平成31. 3. 12
議案第22号	平成31年度宮古島市水道事業会計予算	平成31. 3. 4	平成31. 3. 12

認定番号	件名	提出年月日	認定年月日
認定第11号	平成29年度宮古島市水道事業会計決算認定について	平成30. 8. 30	平成30. 9. 21

2. 行政官庁許認可事項

許認可年月日	許可番号	許可事項	行政官庁名

資


料

1. 宮古島における降水量調べ


資料提供:宮古島地方気象台

月別年	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	計
2009	107.5	78.5	131.0	206.0	52.5	225.0	197.5	197.5	47.5	377.0	152.0	68.5	1840.5
2010	129.5	92.0	51.0	191.5	134.5	127.5	284.0	319.0	156.5	289.0	230.0	102.0	2106.5
2011	216.0	105.0	39.0	150.0	529.5	188.0	38.0	173.5	86.5	336.0	215.0	139.0	2215.5
2012	152.5	138.0	59.5	100.0	267.0	247.5	79.0	234.0	356.0	20.0	104.5	155.0	1913.0
2013	119.5	59.0	90.5	213.0	155.0	117.5	40.0	163.5	178.5	135.0	187.5	134.5	1593.5
2014	53.0	128.0	153.0	88.0	411.0	135.0	105.0	193.0	89.0	34.0	195.0	139.0	1723.0
2015	224.5	73.5	89.5	158.0	377.5	37.5	248.5	323.5	56.0	87.0	186.0	195.5	2057.0
2016	479.5	202.0	184.0	343.5	301.5	136.0	173.5	228.0	334.0	88.5	167.0	37.5	2675.0
2017	30.0	158.0	83.0	146.0	203.0	82.0	124.0	43.5	576.5	125.0	179.5	96.5	1847.0
2018	187.0	58.0	111.0	143.0	61.5	185.0	517.0	601.0	241.5	213.5	72.5	244.5	2635.5
過去10年平均値	151.2	103.4	88.1	159.6	243.2	129.6	129.0	187.6	188.1	149.2	161.7	106.8	1797.1

2. 年次別 降水量(過去10年)

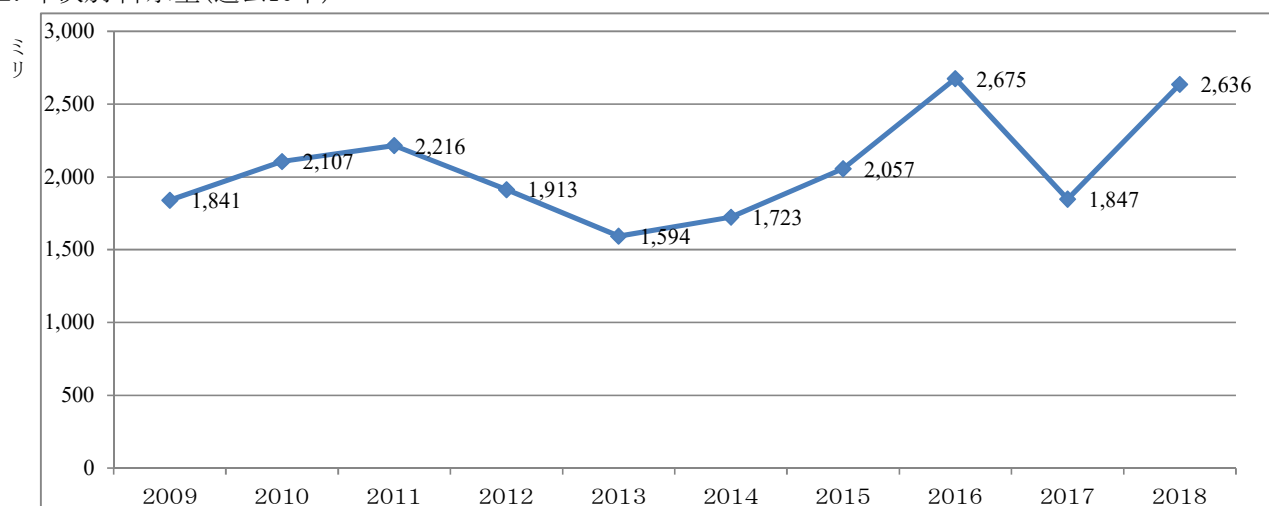

3. 平成30年月別降水量(過去10年月別平均値)

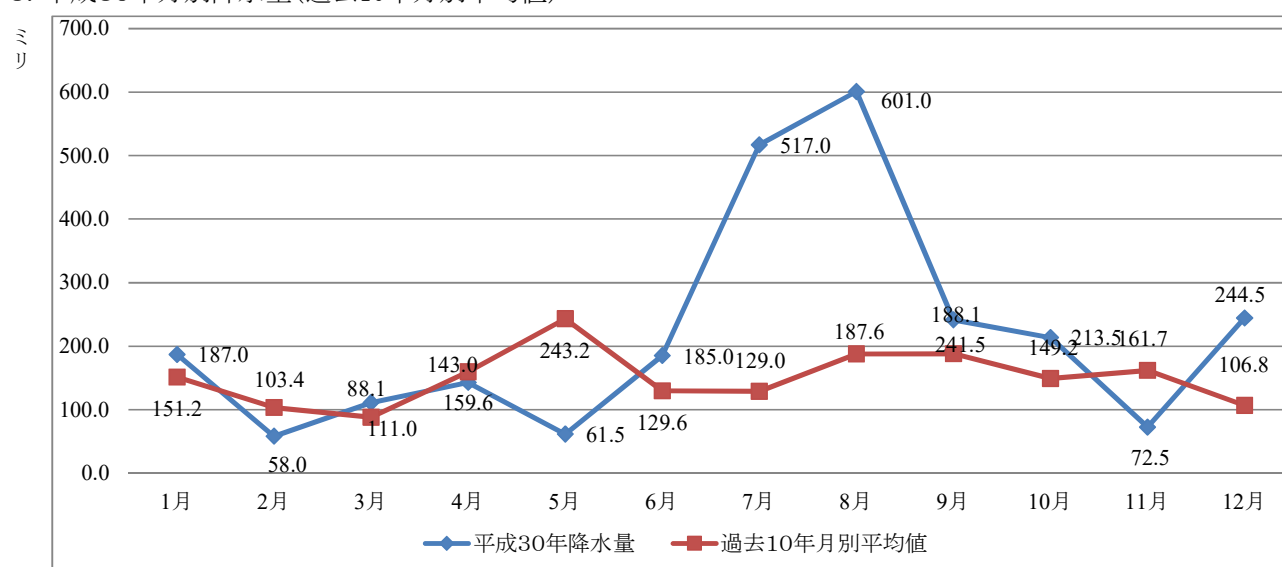

4. 降水量の少なかった時期の記録

資料提供:宮古島地方気象台


起 年	期 間	日 数	期 間 内 降 水 量
1969	4 月 1 日 ~ 5 月 6 日	36	11.0 mm
〃	10 月 8 日 ~ 11 月 11 日	34	5.0 〃
1971	3 月 15 日 ~ 9 月 16 日	185	162.0 〃
1972	8 月 18 日 ~ 11 月 7 日	82	80.5 〃
1974	7 月 6 日 ~ 9 月 24 日	81	100.0 〃
1976	8 月 10 日 ~ 9 月 15 日	37	15.5 〃
〃	11 月 22 日 ~ 12 月 29 日	38	24.0 〃
1977	2 月 22 日 ~ 5 月 29 日	98	61.5 〃
1979	6 月 17 日 ~ 7 月 22 日	36	8.5 〃
〃	8 月 30 日 ~ 10 月 14 日	46	32.0 〃
1980	6 月 3 日 ~ 8 月 26 日	85	205.0 〃
1981	8 月 1 日 ~ 8 月 29 日	29	13.0 〃
1982	8 月 12 日 ~ 9 月 20 日	40	17.5 〃
1983	6 月 20 日 ~ 8 月 4 日	46	23.5 〃
1984	6 月 6 日 ~ 7 月 17 日	42	32.5 〃
1985	3 月 1 日 ~ 3 月 31 日	31	45.5 〃
1986	4 月 1 日 ~ 5 月 12 日	42	35.5 〃
1987	4 月 1 日 ~ 5 月 2 日	32	32.0 〃
1988	6 月 4 日 ~ 7 月 28 日	54	30.0 〃
1989	2 月 1 日 ~ 3 月 31 日	59	74.0 〃
1990	10 月 7 日 ~ 11 月 24 日	47	85.0 〃
1991	11 月 29 日 ~ 12 月 31 日	33	31.0 〃
1992	6 月 29 日 ~ 8 月 24 日	57	49.0 〃
1993	6 月 12 日 ~ 8 月 31 日	81	141.0 〃
1994	10 月 12 日 ~ 11 月 26 日	46	45.0 〃
1995	11 月 1 日 ~ 1 月 17 日	78	151.5 〃
1996	6 月 3 日 ~ 7 月 29 日	56	37.5 〃
1998	6 月 12 日 ~ 8 月 18 日	67	31.5 〃
2001	10 月 17 日 ~ 11 月 30 日	44	40.5 〃
2003	7 月 1 日 ~ 7 月 30 日	30	8.0 〃
2006	10 月 1 日 ~ 10 月 23 日	23	8.5 〃
2007	7 月 1 日 ~ 8 月 6 日	37	28.0 〃
2008	5 月 11 日 ~ 5 月 20 日	20	28.0 〃
2009	9 月 5 日 ~ 9 月 30 日	26	19.5 〃
2010	2 月 23 日 ~ 3 月 31 日	37	51.0 〃
2011	6 月 23 日 ~ 7 月 23 日	31	38.0 〃
2012	10 月 1 日 ~ 10 月 31 日	31	20.0 〃
2013	7 月 1 日 ~ 7 月 31 日	31	40.0 〃
2014	8 月 21 日 ~ 11 月 20 日	92	197.0 〃
2017	7 月 30 日 ~ 8 月 31 日	33	43.5 〃

5. 白川田水源地湧水量調査表

(単位: m³)

白川田泉	年度	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	計	月平均	¥
	20	498,668	505,888	527,639	511,759	461,588	400,371	374,220	347,760	343,614	306,338	247,573	263,527	4,788,945	399,079	13,120
	21	266,249	338,262	336,363	389,848	404,169	374,969	367,261	472,774	458,298	415,266	347,125	373,307	4,543,891	378,658	12,449
	22	346,509	402,999	410,295	400,721	517,626	548,549	556,916	545,961	531,762	511,981	475,004	493,654	5,741,977	478,498	15,731
	23	418,847	517,518	558,878	528,904	478,917	403,889	476,845	510,620	536,743	515,392	464,652	488,418	5,899,623	491,635	16,163
	24	422,484	403,121	520,040	510,952	486,484	434,394	530,905	458,173	464,208	454,080	384,606	376,879	5,446,326	453,861	14,921
	25	357,790	435,656	449,518	400,786	341,956	332,017	331,710	305,193	315,389	338,346	318,104	361,682	4,288,147	357,346	11,748
	26	357,091	485,889	514,350	470,090	413,598	362,177	320,789	265,446	281,568	274,127	273,002	316,779	4,334,906	361,242	11,876
	27	293,873	378,211	457,759	447,947	431,957	434,290	386,417	321,194	321,934	463,658	507,432	509,511	4,954,183	412,849	13,573
	28	500,918	509,648	481,375	452,619	436,032	437,305	448,240	386,903	364,442	315,244	234,101	246,017	4,812,844	401,070	13,150
	29	225,028	224,564	309,303	338,283	292,393	372,784	450,085	387,662	408,092	368,879	325,168	311,703	4,013,944	334,495	10,997
山川泉	年度	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	計	月平均	日平均
	20	269,287	255,620	374,083	301,094	213,895	174,156	155,763	149,478	136,947	98,593	73,494	86,448	2,288,858	190,738	6,271
	21	98,373	142,802	136,109	178,853	173,116	147,510	144,800	251,224	205,864	168,627	131,025	136,163	1,914,466	159,539	5,245
	22	122,805	167,709	172,943	158,060	298,264	285,662	253,950	498,820	408,674	293,792	335,731	248,616	3,245,026	270,419	8,890
	23	173,376	107,641	185,862	410,602	232,906	163,295	271,313	288,436	341,751	332,541	197,834	243,726	2,949,283	245,774	8,080
	24	178,696	154,102	142,904	339,071	214,778	199,231	423,357	221,522	204,967	197,371	158,824	141,072	2,575,895	214,658	7,057
	25	144,460	127,254	219,559	162,589	124,153	132,543	128,214	109,263	109,356	119,044	116,385	136,870	1,629,690	135,808	4,465
	26	141,421	182,765	451,154	233,416	174,404	147,040	115,899	87,159	108,384	96,620	99,698	118,939	1,956,899	163,075	5,361
	27	111,211	179,267	298,119	228,905	210,934	235,017	173,955	125,316	124,479	292,766	410,106	408,014	2,798,089	233,174	7,666
	28	345,427	302,564	232,431	257,297	205,004	163,742	208,101	170,475	152,124	116,224	75,658	81,632	2,310,679	233,174	7,645
	29	73,371	100,998	149,039	158,219	132,623	287,608	372,442	196,876	201,143	171,494	147,929	139,514	2,131,256	177,605	5,839
合計	年度	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	計	月平均	日平均
	20	767,955	761,508	901,722	812,853	675,483	574,527	529,983	497,238	480,561	404,931	321,067	349,975	7,077,803	589,817	19,391
	21	364,622	481,064	472,472	568,701	577,285	522,479	512,061	723,998	664,162	583,893	478,150	509,470	6,458,357	538,196	17,694
	22	469,314	570,708	583,238	558,781	815,890	834,211	810,866	1,044,781	940,436	805,773	810,735	742,270	8,987,003	748,917	24,622
	23	592,223	625,159	744,740	939,506	711,823	567,184	748,158	799,056	878,494	847,933	662,486	732,144	8,848,906	737,409	24,244
	24	601,180	557,223	662,944	850,023	701,262	633,625	954,262	679,695	669,175	651,451	543,430	517,951	8,022,221	668,518	21,979
	25	502,250	562,910	669,077	563,375	466,109	464,560	459,924	414,456	424,745	457,390	434,489	498,552	5,917,837	493,153	16,213
	26	498,512	668,654	965,504	703,506	588,002	509,217	436,688	352,605	389,952	370,747	372,700	435,718	6,291,805	524,317	17,238
	27	405,084	557,478	755,878	676,852	642,891	669,307	560,372	446,510	446,413	756,424	917,538	917,525	7,752,272	646,023	21,239
	28	846,345	812,212	713,806	709,916	641,036	601,047	656,341	557,378	516,566	431,468	309,759	327,649	7,123,523	593,627	19,463
	29	298,399	325,562	458,342	496,502	425,016	660,392	822,527	584,538	609,235	540,373	473,097	451,217	6,145,200	512,100	16,836
計		5,345,884	5,922,478	6,927,723	6,880,015	6,244,797	6,036,549	6,491,182	6,100,255	6,019,739	5,850,383	5,323,451	5,482,471	72,624,927		
10年月平均		534,588	592,248	692,772	688,002	624,480	603,655	649,118	610,026	601,974	585,038	532,345	548,247	7,262,493		
10年日平均		17,820	19,105	23,092	22,194	20,145	20,122	20,939	20,334	19,419	18,872	18,357	17,685			

6. 宮古島市水道水源地下水流域図

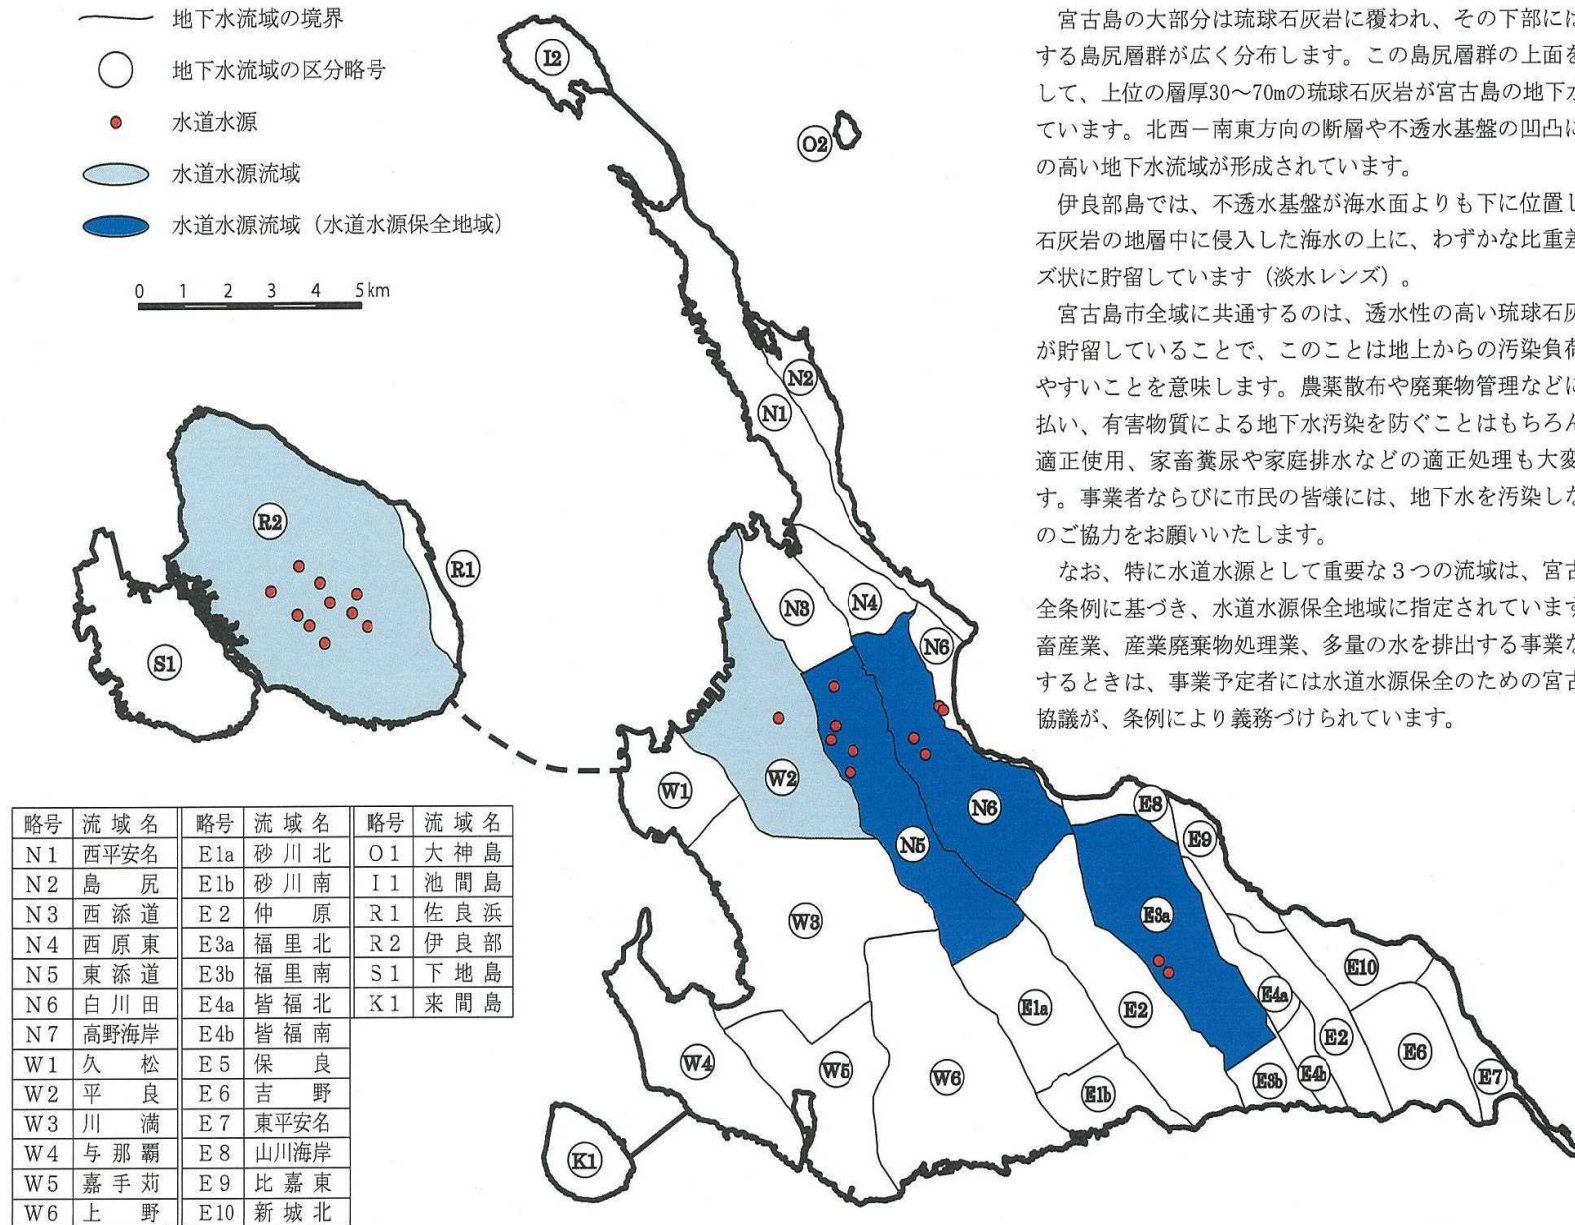

宮古島の大部分は琉球石灰岩に覆われ、その下部には泥岩を主体とする島尻層群が広く分布します。この島尻層群の上面を不透水基盤として、上位の層厚30～70mの琉球石灰岩が宮古島の地下水帯水層となっています。北西－南東方向の断層や不透水基盤の凹凸により、独立性の高い地下水流域が形成されています。

伊良部島では、不透水基盤が海面よりも下に位置しているため、石灰岩の地層中に侵入した海水の上に、わずかな比重差で淡水がレンズ状に貯留しています（淡水レンズ）。

宮古島市全域に共通するのは、透水性の高い琉球石灰岩中に地下水が貯留していることで、このことは地上からの汚染負荷の影響を受けやすいことを意味します。農薬散布や廃棄物管理などに細心の注意を払い、有害物質による地下水汚染を防ぐことはもちろん、化学肥料の適正使用、家畜糞尿や家庭排水などの適正処理も大変重要なことです。事業者ならびに市民の皆様には、地下水を汚染しないよう、日々のご協力をお願いいたします。

なお、特に水道水源として重要な3つの流域は、宮古島市地下水保全条例に基づき、水道水源保全地域に指定されています。この地域で畜産業、産業廃棄物処理業、多量の水を排出する事業などを行おうとするときは、事業予定者には水道水源保全のための宮古島市との事前協議が、条例により義務づけられています。

7. 宮古島水道年表

(イ) 創立

西 暦	昭和	月 日	記 事
平良市			
1939	14	初期	平良町、町長による水道構想なる。
		11.	町長の職を退いたため上水道構想空論に終わる。
1943	18	末期	日本軍吉丸部隊による軍水道布設される。
1946	21	7.	宮古民政府による簡易水道布設される。
1950	25	6.23	平良市三大事業の一環として上水道基本計画なる。
		12.5	上水道事業本格的測量開始。
1951	26	2.13	上水道事業に対する第1回補助を受ける。
		3.16	三大事業のうち電気・水道事業・マッカーサー司令部より認可される。
1952	27	3.27	第一次工事着手
1953	28	5. 4	第一次工事竣工、白川田の水が市内に流れ市民を欣喜雀躍せしめる。 当時の給水状況 夏期 4月～10月 午前6時から9時 午後4時から7時 冬期 11月＝3月 午前7時から10時 午後3時から6時 共同栓による桝売りである。
1955	30		給水条例改正により自家用栓と共同栓により給水する。
1956	31	6.	第二次工事(袖山浄水場緩速濾過池)完成
1957	32	11.	塩素滅菌機室及配水池工事完成 ※上水道施設一応整う
1961	36		共同栓による桝売り制廃止される。
城辺町			
1954	29		宮古島における初の民営水道として保良部落内に簡易水道設置される。
1955	30		昭和30年9月19日、友利、砂川部落に簡易水道施設完成
上野村			
1956	31	3.	宮国簡易水道組合設立
		6.	宮国簡易水道施設竣工
1958	33	8.30	宮国簡易水道村営移管
1959	34		野原部落村営簡易水道設置される。
1962	37		宮古製糖水源地より新里、宮国部落に配水される。
1963	38	7.	野原部落簡易水道村営移管される。
下地町			
1959	34		川満、入江部落に簡易水道設置される。
1963	38		※ 町全体に対する水道計画樹立(第一期工事着手)
1963	38	8.	前古、未曾有と言われた大早魃到来 平良市より那覇市に愛情の水を送る。
		11.30	宮古島の水利用計画全面中止(高等弁務官～琉球政府)

西 暦	昭和	月 日	記 事
1963	38	12.16	上野村議会に於いてマスタープランに対し反対決議される。
		12.31	米国民政府により宮古島上水道マスタープラン発表。
		1. 28	代行官、宮古地方庁長(現支庁長)より上野村役場においてマスタープラン説明会あり。
(ロ) 宮古島用水管理局			
1964	39	5. 14	※ 米国民政府高等弁務官布令54号「宮古島用水管理局の設立」を公布、即日執行 宮古島用水管理局定款発表 管理局長直接任命される。
			※ 課設置条例施行に伴い課長、係長制実施
		5. 25	用水管理局第一回理事会開く。
		6. 4	平良市議会全員協議会に於いて、事務引継について検討する小委員会設置
		6.29	※ 平良市水道料金値下げ決議される。 1.10ドル→1ドル(7月1日実施)
		7. 14	平良市議会に於いて事務引継反対決議される。
		7. 16	平良市議会事務引継反対陳情団派遣
		8. 13	白川田水源地～袖山浄水場間導水施設工事完成。 平良市会議室に於いて事務引継について懇談会あり。
		8. 28	平良市議会に於いて昭和40年7月1日付で民立法による市町村水道組合設立を 前提とした施設の無償貸与決議される。
		9.	福山配水施設工事完成
		9. 9	宮古島用水管理局設立のため平良市役所水道課の職員及び下地町役場、上野 村役場水道係の職員依頼退職する。
		9. 10	平良市役所、下地町役場、上野村役場の依頼退職職員を宮古島用水管理局に 職員採用される。
1965	40	1.	下地町、与那覇、川満、配水管改良工事完成
		2. 1	給水工事指定店規則施行される。
		2. 2	市町村組合設立準備委員会設置される。
		2. 27	平良市、下地町、上野村財政事業に於いて組合規約、布令54号廃止の決議される。
		2.	平良市、山北、細竹、七原、新豊配水施設工事完成
		3.30	城辺町、西城中前配水施設工事完成
		3. 15	城辺町議会に於いて組合規約、布令54号廃止決議される。 ※ 宮古島上水道組合設立許可申請書提出
		4. 7	※ 宮古島上水道組合設立許可される。
		4. 16	第一回給水工事主任技術者試験実施
		4. 25	下地町高千穂地内配水施設工事完成
		4. 30	平良市～下地町連結配水施設工事完成 平良市北部送水施設工事完成
		5. 1	※ 平良市北部地区通水される。
		5. 24	地下水管理県に対する疑義照会
		6. 8	内務局長より出来る旨の解答あり。
		6. 10	平良市、城辺町、下地町、上野村議会に於いて地下水保護管理を宮古島上水道 組合(7月1日設立予定市町村組合)に委ねる決議される。

西 暦	昭和	月 日	記 事
1965	40	6. 10	同決議書行政主席へ送付 平良市西原、富名腰、腰原、狩俣配水施設工事完成 城辺町加治道～新城配水施設工事完成 上野村野原送水管、新里、野原配水施設工事完成 下地町棚根、皆愛配水施設工事完成
(ハ) 宮古島上水道組合			
1965	40	7. 1 7. 8 8. 10 8. 15 8. 9. 21 10. 20 11. 12. 29 12.30	※ 宮古島上水道組合設立、職務執行者発令される(設立と同時に給水開始)。 初代水道事業管理者に平良市長真栄城徳松氏選任される。 初代水道議会議長に下里芳蔵氏選任される。 宮古島用水管理局より宮古島上水道組合に事務引継がれる。 宮星浄水場工事完成 城辺町福東、福北、下南配水施設工事完成 2代水道議会議長に本村清吉氏選任される。 城辺町加治道浄水場工事完成(加治道水源開発) 城辺町友利、加治道地内、長中、長南、土底、西中、西々、吉田、西東地内配水施設工事完成 平良市袖山浄水場工事完成(濾過池1～4号) 城辺町加治道浄水場濾過池工事完成 水道料金徴収事務委託開始(平良市16人、下地町2人)
1966	41	7. 1 7. 25 9. 10. 1 10. 13 12.	袖山浄水場工務課浄水係から分離浄水場となる。 宮古島上水道組合マーク、審議決定される。 下地町へ袖山浄水場より給水される。(宮星浄水場停止される) 第二次宮古島台風(コラ)のため断水(9月5日～7日・3日間) 第二回給水工事主任技術者試験実施される。 第3代水道議会議長に川上政雄氏選任される。 平良～与那覇線配水施設改良工事完成 石原雅太郎氏顕彰碑建立、於白川田水源地内
1967	42	1. 1. 30 2. 3 2. 4. 4.	池間海底送水管工事予備調査実施 下地営業所事務所移転(宮星浄水場→下地町役場) 石原雅太郎氏顕彰碑除幕式挙行 友利、砂川簡易水道切替えられる。 池間海底送水施設工事調査結果まとまる。 下地町入江簡易水道引継がれる。
		7. 1 8. 10. 9 12. 21 12. 22	公営企業会計適用す。 宮古島水道誌発行 第2代水道事業管理者に平良市長真栄城徳松氏選任される。 上野村宮国地内第一期配水施設改良工事完成 平良市下里地内配水施設改良工事完成
1968	43	2. 21	白川田水源地取水施設改良工事(山川水源拡張) 完成

西 暦	昭和	月 日	記 事
1968	43	4. 11	上野村野原地内米軍へ給水
		5. 27	上水道事業竣工式典挙行、水道事業協力者表彰される。
		6. 25	第一次拡張事業(取水地点を山川水源に拡張)変更許可される(建第492号)。
		7. 13	事務所に於ける宿日直実施
		9. 3	量水器検針業務委託される。(城辺町を除く)
		9.	南西里、荷川取、富名腰配水施設改良工事完成
		9. 23	23、24日第3宮古島台風(デラ)発生
1969	44	5. 1	上野村新里、野原第一期配水施設改良工事完成
		5. 29	第3代水道事業管理者上野村長下地一弘氏選任される。
		10. 21	第6回沖縄水道協会総会開催(於平良市)
		11. 4	城辺町福里配水施設改良工事完成
		11. 26	第4代水道議会議長に饒平名恵真氏選任される。
1970	45	7. 20	第3回給水工事主任技術者試験実施される。
		11. 11	城辺町福東配水施設改良工事完成
		12. 25	第4代水道事業管理者上野村長下地一弘氏選任される。
1971	46	2. 23	池間海底送水管工事施行に対し日水協より技術指導の為田井技術課長招聘す。 大早魃到来(185日) 3月15日～9月16日
		8. 28	来間島海底水道について陳情
		8. 27	早魃のため城辺地区隔日給水(90日間南部、北部地区を交互に実施)
		5	平良市内全域制限給水
		11. 27	(11月10日～13日の4日間午前10時～5時、7時間)
		10. 1	斉藤厚生大臣白川田水源地視察
		11. 25	早魃のため白川田水源地の湧水量が減少したため、補助水源を開発するため 特別交付税の交付陳情す。
1972	47	1. 10	袖山水源開発工事実施
		3. 17	庁舎敷地買収
		5. 1	袖山浄水場～平良市街地間第一期工事完成
		5. 9	池間海底送水管工事起工式 袖山水源開発工事完成
(二) 宮古島上水道企業団			
1972	47	5. 15	本土復帰に伴い宮古島上水道組合から宮古島上水道企業団へ改称 組織名称変更に伴い第4代管理者(下地一弘上野村長)初代企業長となる。 部長制実施、助役、収入役制廃止される。(本土復帰に伴う) 初代理事長 平良市長 平良重信氏 城辺営業所、工務課、浄水場より分離す。 上野、下地営業所廃止される。
		6. 30	庁舎建設工事完成
		7. 12	庁舎移転(ボーリング場より新庁舎へ)
		7. 20	池間海底送水管工事完成

西 暦	昭和	月 日	記 事
1972	47	7. 28	庁舎落成、池間海底送水管竣工式典挙行
		9. 7	池間小中学校へ給水開始
		11. 30	企業団規約認可される。
1973	48	3. 25	白川田水源地ポンプ改良工事完成
		4. 11	第5代水道議会議長に饒平名恵真氏選任される。
		5. 2	事務所宿日直制廃止される。
		5. 18	第2代理事長、平良市長 平良重信氏
		5. 29	部長制廃止される。
		6. 1	第2代企業長赤嶺民夫氏就任
		6. 3	事務所当直委託実施
		7. 10	平良市街地南部地区配水施設改良工事完成
		7. 30	次長制実施、総務課に調査統計係設置される。
		8. 6	池間島陸上配水管工事完成
		9.	池間島給水工事実施
		9. 21	来間島海底送水管工事入札
		9. 27	来間島海底送水管工事着手
		11. 15	第6代水道議会議長に狩俣恵典氏選任される。
		11. 30	白川田水源地宿日直室兼事務所工事完成
		12. 23	赤嶺民夫氏企業長辞任
1974	49	2. 31	上野、下地出張所設置
		3. 25	来間海底送水管第二次工事完成
		4. 10	野原送水施設改良工事完成
		5. 1	第3代企業長伊志嶺恒雄氏就任
		8. 1	水道料金改訂実施される。
		8. 30	西原、山中、宮星配水施設改良工事完成
		9. 26	七原、細竹配水施設改良工事完成
		10. 7	昭和48年度水道統計年報発行(第一号)
		10. 30	第4回給水装置主任技術者試験実施される。
		11. 5	簡易無線電話設置される。
		11. 16	集金、検針奨励金制度実施される。
		12. 24	量水器修理業務を廃止し委託制に切替えられる。
1975	50	1. 27	来間島へ上水道給水開始(試験給水)
		1. 31	来間島海底送水管工事完成
		2. 7	砂川(国道部)配水施設工事完成
		3. 25	南西里(県営住宅)配水施設工事完成
		3. 31	袖山ポンプ(東北部)改良工事完成
			ニャーツ配水施設工事完成(北部配水系から市内配水系へ切替えられる)
		4. 1	下地、上野出張所廃止される。 工務課に漏水防止係設置される。
		5. 19	下里地区(市営住宅一帯)下里配水池系から腰原配水池系へ切替えられる。

西 暦	昭和	月 日	記 事
1975	50	8. 1	連合専用栓制実施される。
		9. 6	保良、西中配水施設改良工事完成
		10. 2	第二次拡張事業(来間)変更許可される(厚生省環第641号、県整第162号) (実施年度、昭和51年～53年)
		10. 15	無線電話局免許交付される。
			昭和49年度水道事業統計年報発行(第二号)
		10. 21	水道議会議員研修(日南市、福岡市、埼玉県南)
1976	51	11. 30	庁舎環境整備工事完成
		2. 28	下地(川満・来間陸上を含む)上野配水施設工事完成
			城辺地区(友利・砂川)配水施設工事完成
			白川田水源地施設(山川止水壁)改良工事完成
		3. 20	白川田水源地環境整備工事完成
			加治道、宮星環境整備工事完成
1977	52	4. 7	川満部落簡易水道より上水道へ切り替えられる。
		4. 23	来間島各戸給水される。
		6. 1	宮古計算センターへ水道料金調定事務委託
		8.	昭和50年度水道事業統計年報発行(第三号)
		10. 3	水道議会議員研修(都城市、小牧市、桶川、北本)
		10. 12	大道線(歩道)配水管布設工事完成
		10. 14	大野越配水施設工事完成
		10. 15	大野越部落給水開始
		11. 10	加治道浄水場揚水、送水施設改良工事完成
		12. 28	下地町(嘉手苅・洲鎌)、城辺町(下南)配水施設改良工事完成
			平良、下地(入江・洲鎌)、上野(高田)配水施設改良工事完成
			城辺町(福東)配水施設改良工事完成
			平良市(北中前・栄・福山)配水施設改良工事完成
		1. 10	福山地区配水施設(ポンプ機関)工事完成
		1. 11	前福地区地下水調査工事(ボーリング)完成
		1. 31	袖山浄水場水質試験室改造工事完成
		3. 14	工業高校通り配水管布設工事完成
		3. 28	下地町ヒトジ地区配水施設改良工事完成
		3. 30	袖山浄水場濾過砂取替工事実施
		4. 12	水道議会議員研修(南部水道、県企業局、名護市)
		4. 15	給水契約に伴う加入金制度実施される。
		5. 18	第3代理事長 平良市長 平良重信氏
		9.	昭和51年度水道事業統計年報発行(第四号)
		9. 5	上野村豊原地区配水管移設(農地整備伴う)工事完成
		10.	袖山浄水場水質試験実施
		11. 8	大神島海底送水管布設について沖縄開発庁、県、現地調査
		11. 16	第7代水道議会議長に仲宗根金吉氏選任される。
		11. 30	上野村豊原地区配水施設工事完成

西 暦	昭和	月 日	記 事
1977	52	12. 24	城辺町保良地区配水施設工事完成 下地町皆愛、上野村名嘉山、豊原地区配水施設工事完成
		12. 25	平良市荷川取配水施設工事完成
1978	53	1. 25	袖山浄水場(濾過池及び配水池) 工事完成
		1. 30	羽立、腰原、久松、添道地区配水施設改良工事完成
		1. 31	西原、成川配水管改良工事完成 前福水源開発及び導水管工事完成
		2. 10	長北、西東、下南、保良配水施設改良工事完成
		3. 15	城辺営業所予備発電機室工事完成 与那覇線配水管布設替工事完成
		3. 25	下崎、成川線配水施設改良工事完成
		3. 30	福南地区配水管改良工事完成
		4. 30	伊志嶺恒雄氏企業長任期満了退任
		5. 14	水道議会議員研修(吹田市、伊東市、坂戸・鶴ヶ島)
		7. 24	第4代理事長 平良市長 盛島明秀氏
		8. 19	池間配水管移設工事完成
		24	上地地区配水施設改良工事完成
		8. 25	昭和52年度水道事業統計年報発行(第五号)
		10. 4	全国労働衛生週間で労使協力して職場の衛生に努力し沖縄県労働基準協会より表彰される。
		10. 10	下里ポンプ改良工事完成
		10. 16	第4代企業長 下地一弘氏就任
		31	ガーラバリ、ヒトジ配水施設改良工事完成
		11. 2	上野村豊原、ンキャガリ地区配水管移設工事完成
		12. 8	袖山浄水場送水施設管理室築造工事完成
		12. 28	城辺町(西中)地区配水施設改良工事完成 平良市(腰原・久貝・大原)配水施設改良工事完成 城辺(保良・仲原)地区配水施設改良工事完成
1979	54	1. 10	袖山水源改良工事完成
		1. 16	安全運転管理及び無事故運転コンクールで優秀の成績のため沖縄県警察本部長より表彰を受ける。
		1. 31	平良～上野(袖山～山中)送水管工事完成
		2. 3	野原送水管(公園内)移設工事完成
		2. 22	与那覇配水管改良工事完成
		3. 10	袖山浄水場内送水施設(計装装置)改良工事完成
		3. 15	池間配水管(学校)移設工事完成 平良市(荷川取)地区配水施設改良工事完成 平良市(前比屋・東仲)配水施設改良工事完成 城辺町(吉田)地区配水施設改良工事完成
		3. 26	羽立地区配水施設改良工事完成
		3. 30	城辺町(福東)配水施設改良工事完成

西 暦	昭和	月 日	記 事
1979	54	3. 30	袖山浄水場計装装置切替え 第3次拡張事業変更認可される。(厚生省環第226号・県環境第307号) (実施年度 昭和54年～59年)
		4. 5	市町村道改良に伴う配水施設改良工事費を市町村負担とすることを理事会で決議す。
		5. 13	水道議会議員研修(仙台市、会津若松市)
		7.	宮古計算センターを解散し、情報サービスグループが設立され水道料金調定事務委託を引継ぐ。
		11. 21	大神島海底送水管工事起工式
		11. 30	上野村、城辺南部(東洋畜産～高田)配水施設改良工事完成 下地町(嘉手苅～棚根)配水施設改良工事完成
		12. 7	城辺町(新城～吉野)配水施設改良工事完成
		12. 13	県立少年自然の家配水管布設工事完成
		12. 20	下地町(山根・上地)配水施設改良工事完成 平良市(腰原・ニャーツ)配水施設改良工事完成
		12. 25	上野村(大岳公園～東洋畜産)配水工事完成 袖山浄水場濾過池築造工事完成
1980	55	1. 20	加治道浄水場(計装設備)改良工事完成 白川田水源地(計装設備)改良工事完成
		1. 30	平良市二重越配水池築造工事完成 上野村、城辺南部(東洋畜産～下南)配水施設改良工事完成
		1. 31	平良市(スバル自動車～久松配水池)配水施設改良工事完成 平良市漲水(マクラム通り)配水施設改良工事完成 平良市二重越(テレビ局～大和電工)配水施設改良工事完成
		2. 8	庁舎増築工事完成
		2. 28	上野村(野原配水池～大岳公園)配水施設改良工事完成(防衛施設庁)
		2. 29	白川田水源地フェンス工事完成 上野村野原配水池築造工事完成 平良市山中、上野村(鏡原～野原配水池)送水施設改良工事完成
		3. 1	白川田水源地、加治道浄水場揚水機関自動化される。 会計課に業務係設置、袖山浄水場揚水係廃止される。 工務課漏水防止係、管理係へ改称される。
		3. 4	大神島海底送水管工事完成
		10	東部配水PC配水池へ切替られる。
		3. 18	大神島配水管工事完成 昭和53年度水道事業統計年報発行(第六号)
		3. 22	北部配水PC配水池系へ切替られる。 高野部落、袖山配水池系へ切替られる。
		3. 25	城辺町福嶺地区配水施設改良工事完成
		3. 29	上野村配水管移設工事完成
		7. 17	大神島水道工事竣工式典挙行、給水(試験)開始
		7. 30	大神島送配水管工事完成
		8. 25	水道議会議員研修(松本市、高山市)

西 暦	昭和	月 日	記 事
1980	55	10. 31	昭和54年度水道事業統計年報発行(第七号)
		11. 10	平良市第7工区(少年自然の家・西辺・パイナガマ)配水施設改良工事完成
1981	56	1. 10	平良市第3工区(ニャーツ、平一校西、南通り)配水施設改良工事完成
			〃 4工区(宮古球場～垣花内科、下里市場)配水施設改良工事完成
			〃 5工区(大見謝支店～パリ～南部線・水高前通り)配水施設改良工事完成
			〃 6工区(高阿良四辻～厚生園～荷川取)配水施設改良工事完成
		1. 31	〃 1工区(大和電工～富名腰～仏法寺)配水施設改良工事完成
			〃 2工区(仏法寺～町田機工～市営住宅)配水施設改良工事完成
			上野第1工区(砂川小学校～友利)配水施設改良工事完成
			〃 4工区(上野～測嶺部落)配水施設改良工事完成
			下地、城辺第1工区(新城部落内)配水施設改良工事完成
			〃 2工区(新城～七又部落内)配水施設改良工事完成
			〃 3工区(下地小学校～町公民館)配水施設改良工事完成
			〃 4工区(西東部落内)配水施設改良工事完成
			情報サービスグループを解散し、宮古広域電子計算センター協議会が設立され企業団も参入。
1981	56	2. 15	上野第2工区(高田～新里)配水施設改良工事完成
			〃 3工区(高田～名嘉山～宮国)配水施設改良工事完成
		2. 28	平良第8工区(二重越～ニャーツ裏)配水施設改良工事完成
			〃 9工区(宮積～増原)配水施設改良工事完成
			〃 10工区(荷川取・腰原・川満・長北)配水施設改良工事完成
			〃 11工区(西辺線)配水施設改良工事完成
		3. 10	白川田水源地ポンプ改良工事完成
		3. 15	平良第12工区(富名腰・七原・下地町役場東通り)配水施設改良工事完成
		4. 18	水道議会議員研修(松山市、高知市、武蔵野市)
		4. 22	収納金融機関指定される。
		5. 8	第18回日本水道協会沖縄県支部総会開催 於、平良市
		7. 1	共同住宅各戸検針及び料金徴収に関する取扱要綱適用
		8. 31	平良第1工区(野田地区)配水施設改良工事完成
		10. 1	週休2日(4周5休)制試行
		10. 14	上野1工区(ウナトウ地区)配水施設改良工事完成
		11. 6	第8代水道議会議長に比嘉米三氏選任される。
		11. 21	城辺1工区(吉野地内)配水施設改良工事完成
			城辺2工区(仲原地内)配水施設改良工事完成
		12. 25	平良9工区(南静園線)配水施設改良工事完成
		12. 27	平良5工区〔下崎線〕配水施設改良工事完成
		12. 28	平良10工区(下崎地内)配水施設改良工事完成
1982	57	1. 20	浄水施設(袖山浄水場濾過池)改良工事完成
			平良2工区(狩俣線)配水施設改良工事完成
			平良3工区(狩俣線)配水施設改良工事完成
			平良4工区(ニャーツ～漲水学園)配水施設改良工事完成
			平良6工区〔平一小学校～源河商店〕配水施設改良工事完成

西 暦	昭和	月 日	記 事
1982	57	1. 20	平良7工区(添道～福山)配水施設改良工事完成 平良8工区(西里、腰原地内)配水施設改良工事完成 下地1工区(棚根、吉田地内)配水施設改良工事完成 城辺4工区(加治道～新城)配水施設改良工事完成 城辺6工区(")配水施設改良工事完成
		1. 25	西底原水源地開発工事完成 送水施設(袖山浄水場～二重越配水池間)工事完成
		1. 31	城辺9工区(城辺地内)配水施設改良工事完成 城辺3工区(加治道～新城)配水施設改良工事完成 城辺5工区(")配水施設改良工事完成 城辺7工区(")配水施設改良工事完成 城辺8工区(友利地内)配水施設改良工事完成
		2. 28	平良11工区(池間地内)配水施設改良工事完成 与並武岳配水池(PC)築造工事完成
		4. 1	水道料金改定実施される。
		5. 21	上水道整備事業委託業務(平良地区)完成
		6. 26	" " (城辺他2地区)完成 上水道整備事業委託設計業務(総括)完成
		7. 23	第5代理事長 平良市長 伊波幸夫氏
		8. 15	上水道整備事業平良3工区(天理教本部～老人福祉センター)配水施設改良工事完成
		9. 10	" 平良1工区(郡農協～宮自練)配水施設改良工事完成
		10. 15	下地一弘氏企業長任期満了退任(第4代)
		25	上水道整備事業委託設計業務完成
		11. 30	" 上野2工区(高 田 地 内)配水施設改良工事完成
		12. 4	" 平良8工区(七原地内～電々公社裏通り) " " 城辺1工区(長 中 地 内) "
		12. 7	" 城辺4工区(下北地内～東与那原地内) "
		12. 13	" 城辺2工区(長 中 地 内) "
		12. 16	" 城辺3工区(下 南 地 内) "
		12. 20	" 平良7工区(島 尻 地 内) " " 上野1工区(宮 国 地 内) " " 下地1工区(高千穂～カズラ嶺) "
		12. 24	" 平良4工区(新生通り～パイナガマ通り) " " 平良5工区(山中タンク～野原越) "
		12. 25	" 平良6工区(野 原 越 地 内) "
		12. 27	" 平良2工区(下里公設市場通り) "
		1. 20	" 下地2工区(上地地内～与那覇地内入口) "
		1. 31	ポンプ並びに塩素減菌機据付工事完成
		3.	第4次拡張工事完成
1983	58	5. 20	庁舎増築工事委託設計監理業務完成 上水道整備事業委託設計業務完成 (平良地区、城辺地区、下地地区)

西 暦	昭和	月 日	記 事
1983	58	6. 10	上水道整備事業委託設計業務完成(総括)
		8. 5	72日間の早魃の末(5月24日より)降雨あり (平良47.5ミリ、城辺28ミリ、伊良部29ミリ、多良間7ミリ) ※ 宮古島農家では長期早魃による被害額は総額約10億と報じられる。
		8. 8	調圧空気弁据付工事
		9	新水源確保の為にボーリング調査行われる(15日間)
		8. 20	袖山導水管布設工事
		10. 8	制水弁室築造並びに改良工事
		10. 11	上水道施設整備工事平良1工区(日刊宮古社前)完成
		10. 22	〃 城辺5工区(福東、福西、福北地区)完成
		11. 8	庁舎増築工事完成
		11. 10	下地町消火栓設置工事
		11. 27	環境整備工事
		12. 7	上水道施設整備工事城辺2工区(長 南 地 区)完成
		12. 8	〃 城辺3工区(福 嶺～保良地区)完成
		12. 20	〃 城辺4工区(福 嶺～保良地区)完成
1984	59	1. 18	〃 城辺1工区(吉 田 地 区)完成
		1. 20	〃 平良2工区(東 川 根 線)完成
			〃 平良3工区(東 川 根 線)完成
		1. 31	来間島高架タンク築造工事 制水弁設置工事 平良市消火栓設置工事
		2. 4	袖山浄水場環境整備工事
		2. 15	上水道施設整備工事城辺6工区(宮 古 の 里)完成
		2. 28	〃 平良4工区(南西地区〔南部線〕)完成
			〃 下地1工区(与 那 覇 地 区)完成
		3. 10	ポンプ据付工事
		3. 23	配水管布設工事
		3. 26	制水弁及び定水位弁等設置工事
		5. 19	沖縄県信用農業協同組合連合会より感謝状を受ける。
		6. 29	高野水源開発工事完成
		8. 10	第5代目企業長 宮国泰光氏就任
		8. 15	第4次拡張事業認可変更される。(厚生省環第45号、県環衛第391号) (実施年度 昭和60年～平成4年)
		9. 21	創立20周年記念式典
		10. 9	上水道施設整備工事平良1工区(荷川取)完成
		10. 11	〃 導水管布設工事(高野水源～袖山浄水場)完成
		10. 20	〃 城辺2工区(西々地区)完成
		10. 27	〃 平良2工区(狩俣線)完成
		10. 31	〃 平良11工区(福嶺医院～日進電気前)完成
		11. 10	〃 平良3工区(狩俣線)完成
		11. 15	〃 平良8工区(東仲〔ニャーツ〕県職員住宅南)完成

西 暦	昭和	月 日	記 事
1984	59	11. 24	上水道施設整備工事 平良5工区(添道〔中添道〕)完成
			〃 平良6工区(添道〔旧公民館前〕)完成
			〃 平良7工区(腰原〔南小学校〕・棚原)完成
			〃 城辺3工区(狩俣線)完成
			〃 上野1工区(千代田・豊原〔県営住宅〕・新里)完成
		11. 30	〃 下地1工区(与那覇・カズラ嶺)完成
		12. 15	〃 城辺4工区(下北)完成
		12. 20	高野水源地運転開始
		12. 25	上水道施設整備工事 平良7工区(鏡原〔七原～西地盛〕・鏡原小学校南)完成
		12. 26	〃 城辺1工区(比嘉地区)完成
1985	60	1. 31	〃 平良10工区(漲水〔とみや商会～棧橋入口〕)完成
			〃 平良12工区(下地線〔松川建設～古波蔵組〕)完成 (城辺線〔川田電気～吉浜解体所〕)
			庁舎及び浄水場事務所増築工事
			上水道施設整備工事 上野2工区(上野村役場・上野村体育館前)完成
		2. 20	〃 平良4工区(添道〔西添道〕)完成
		2. 28	〃 袖山浄水場次亜生成施設完成
			※1938年(昭和13年)気象台が観測を始めて以来2月中の降雨量は1959年(昭和34年) 320.2mmを上回り、昭和60年2月では400mmを越える雨量となり、26年ぶりにして 記録更新され、2月18日の1日間で113.5mmの降雨量。
		4. 1	等級別給料表の適用
		10. 15	配水管移設工事(宮国・大嶺)
		11. 26	第9代上水道議会議長に宮国哲二氏選任される。
1986	61	12. 11	上水道施設整備工事上野2工区(新里・ナベヤマ)完成
		12. 25	流量発信器移設及び流量計設置工事(平良市)
		1. 31	消火栓設置工事(平良・城辺・下地・上野)
			上水道施設整備工事平良1工区 (八千代バス北十字路より西十字路、八千代バス車庫 より西通り、北小学校裏通り)完成
			〃 平良2工区(丸勝マンション西通り、ヤマガー部落、市役所裏通り、 福嶺医院四辻より東へ、八番街裏通り)
			〃 平良3工区(工業高校通り、宮古病院東通り、宮古高校東、腰原、 福山)完成
			〃 平良5工区(南静園入口、北増原、南小学校西通り)完成
			〃 城辺3工区(下北)完成
			〃 上野1工区(野原)完成
		2. 28	上水道施設整備工事平良4工区(盛加、細竹、地盛、野原越、宮原)完成
			〃 城辺1工区(新城、皆福)完成
			〃 城辺2工区(比嘉、保良)完成
			〃 城辺4工区(福東、長中、吉田、砂川、友利)完成
			〃 下地1工区(川満、洲鎌、上地、与那覇)完成
		3. 25	上水道施設整備工事平良6工区(西原、南静園)完成
			〃 下地2工区(上地より前浜)完成

西 暦	昭和	月 日	記 事
1986	61	3. 25	送水管連結及び配水管布設工事(高千穂) 制水弁設置工事(平良市、下地町) 〃 (城辺町、上野村) 逆止弁設置工事(平良市) 環境整備並びに施設改修工事(平良市、城辺町)
		5. 27 7. 23 10. 20 11. 11. 13 11. 29 12. 20	宮古警察署、宮古地区交通安全協会より表彰状を受ける。 第6代理事長 平良市長 下地米一氏 加治道浄水場ポンプ改良工事完成 白川田貯水池用地取得 11月 1日 (6,391㎡)、11月8日 (8,061㎡) 11月14日 (781㎡)、3月17日 (59,190㎡) 第10代水道議会議長に新里新登氏選任される。 加治道浄水場濾過池及びポンプ井開閉台改良工事完成 上水道施設整備事業 平良1工区(狩俣地区みのる食堂より島尻キヨ宅前)完成 〃 平良2工区(みのる食堂～狩俣昌信宅前)完成 〃 平良3工区(大浦地区)完成 〃 平良10工区(地盛、山中地区)完成
1987	62	1. 30 2. 10 2. 20 〃 〃 2. 25 2. 28 3. 10 3. 20 3. 25 〃 〃 6. 25	〃 平良5工区(下崎地区)完成 〃 平良11工区(宮原地区)完成 〃 平良7工区(東仲郵便局～瑞慶覧朝二宅前)完成 〃 平良8工区(市内地区)完成 〃 平良4工区(西辺地区)完成 消火栓設置工事(平良・城辺) 上水道施設整備事業 平良12工区(大原地区)完成 城辺1工区(長北、下北、福南地区)完成 下地、上野1工区(側嶺地区、入江地区、前浜～ポンプ小屋)完成 平良6工区(上地モータース～古謝薬局、玉元スーパー北～アバビル)完成 平良9工区(久松地区)完成 城辺2工区(加治道地区)完成 袖山浄水場配水処理施設工事完成 上水道施設整備事業 城辺3工区(長北地区)完成 消火栓設置工事(平良、城辺)完成 庁舎内環境整備工事完成 袖山浄水場配水池築造工事完成
		4. 1	水道料金改定実施される。 宮古広域電子計算センター協議会解散のため企業団コンピューター導入(水道料金調定事務、給与事務(給与袋)をコンピューター実施される) 会計業務係、調定係へ改称される。浄水場に水質係が設置される。
		5. 22	宮古島地下水保護管理条例を廃止する(宮古地区広域行政組合に引き継がれる)
		6. 20	上水道施設整備事業(貯水施設築造工事) 白川田水源池
		6. 25	九州地区水道企業団協議会総会開催 於・平良市中央公民館

西 暦	昭和	月 日	記 事
1987	62	7. 22	環境整備工事(浄水場内)完成
		8. 18	白川田貯水池工事起工式
			制水弁設置工事(平良市)完成
		10. 1	委託業務(修理)指定店協会へ委託開始
		12. 10	環境整備工事(与並岳配水池フェンス及び袖山浄水場内側壁工事)完成
		12. 15	消火栓設置工事(平良市、城辺町、下地町、上野村)完成
1988	63	2. 17	上水道施設整備事業 (配水管)平良市、上野村 完成
		2. 20	〃 (〃)平良市 完成
		2. 23	〃 (貯水池工事)白川田 完成
		3. 14	〃 (配水管)高野部落 完成
		3. 17	〃 (導水管工事)平良市 完成
		3. 19	〃 (〃) 〃 完成
		3. 20	配水管移設工事(東川根)完成
		3. 24	水道管移設工事(福山)完成
		3. 25	上水道施設整備事業 (取水管工事)平良市 完成
			〃 (配水管工事)東川根、大原 完成
			〃 (〃)砂川、大嶺、野原越 完成
			〃 (貯水池工事)平良市 完成
		4. 1	委託業務(量水器取替、給水停止開始)指定店協会へ委託 城辺地区の検針事務一部委託開始
		4. 15	上水道施設整備事業設計調査業務(配水施設)完成 〃 (浄水施設)完成
		4. 20	〃 (申請書作成)完成
		6. 24	宮古島地下水水質保全対策協議会設立
		7. 25	水道管移設工事(パイナガマ)土木事務所 完成
		7. 30	車庫築造工事(袖山浄水場)完成
		8. 9	宮国泰光氏企業長任期満了退任(第5代)
		8. 31	配水管布設工事(皆愛地区) 東急 完成
			貯水施設築造工事(土砂除去作業)完成
			貯水施設築造工事(1号貯水池4万トン)完成
		9. 20	ポンプ据付工事(加治道浄水場)完成
		10. 29	消火栓改修工事(平良市、下地町、城辺町)完成
		10. 31	消火栓設置工事(平良市、下地町)完成
			減圧弁設置工事(上野村、城辺町)完成
		11. 30	上水道配水管工事6工区(宮原)完成
1989	64	1. 7	天皇崩御
		1. 8	元号が平成に改まる。
	平成	1. 24	上水道配水管工事5工区(長中、皆愛、嘉手苅)完成
	元年	1. 28	配水管布設工事(宮原、高田)完成
		1. 30	上水道施設整備事業配水管工事 1工区(市場通り)完成
			〃 2工区(西里、添道)完成
			〃 3工区(上野、宮原)完成

西 暦	平成	月 日	記 事
1990	2	5. 19	上水道施設整備事業設計調査業務(配水施設) 完成
		6. 1	公衆衛生の向上に寄与したことにより県知事表彰される。
		6. 5	上水道施設整備事業設計調査業務(申請書作成)完成
		7. 23	第7代理事長 平良市長 下地米一
		9. 7	第1回日本水協沖縄県支部統一配管工資格試験実施
		10. 1	第41回全国労働衛生週間において沖縄労働基準局長賞を受ける。
		11. 14	第1回日本水協沖縄県支部統一責任技術者資格試験実施
		12. 19	上水道施設整備事業(配水管布設工事その8、新城地区)完成
1991	3	1. 31	〃 〃 (〃 〃 その1、宮古高校前)完成 与那覇、上地線配水管移設工事 完成 配水管及び弁室移設工事(城辺町、下地町)完成
		2. 5	配水管改良工事(嘉手苅、屋原線)完成
		2. 25	上水道施設整備事業(配水管布設工事その2、宮古郡農協平良市所前)完成 〃 〃 (〃 〃 その3、上野村ウナトウ部落)完成 〃 〃 (〃 〃 その4、城辺町福中部落)完成 〃 〃 (〃 〃 その5、城辺町福東部落)完成 〃 〃 (〃 〃 その7、大三俵3区、パイナガマ線)完成 〃 〃 (〃 〃 その9、大和自練前、下地町上地部落)完成 給水管切替工事その1、宮古高校前 完成 〃 〃 その2、宮古郡農協平良市所前 完成
		2. 28	上水道施設整備事業(配水管布設工事その6、上野村新里部落)完成
		3. 9	給水管切替工事その7、大三俵3区、パイナガマ線 完成
		3. 20	配水管布設工事(宮古田線)完成 上水道施設整備事業(白川田貯水池配水施設工事)完成
		3. 25	ポンプ小屋築造工事(袖山浄水場)完成
		3. 29	宮古島上水道企業団給水工事指定店規則改正(平成3年4月1日)され、責任技術者及び配管工は日水協沖縄県支部統一資格者となる。 庁舎内駐車場用地取得(726.08㎡)
		4. 1	水道料金に消費税転嫁
		5. 22	硬度低減化実験開始
		5. 25	上水道施設整備事業調査設計業務 (配水タンク) 完成 〃 〃 (配 水 管) 完成
		6. 10	〃 〃 (申請書作成) 完成
		7. 24	袖山浄水場環境整備工事完成
		7. 30	長期少雨期続く(平成2年10月1日より3年7月31まで平均115ミリ)
		9. 20	消火栓室蓋設置改修工事完成
		10. 4	環境整備工事(庁舎内駐車場)完成
		10. 24	制水弁設置工事その1(平良市、城辺町)完成
		10. 25	〃 〃 その2(城辺町)完成
		10. 28	城辺町営業所環境整備工事完成(フェンス工事)完成
		11. 7	制水弁設置工事その3(平良市、城辺町)完成
		12. 1	土曜日閉庁、(四週六休)実施

西 暦	平成	月 日	記 事
1992	4	1. 14	上水道施設整備事業平良市その8 (国道バイパス、国家公務員住宅～松川建設裏)完成
		1. 17	上水道施設整備事業城辺町その7(砂川部落、国道)完成
		1. 20	給水管切替工事(福山公民館通り)完成
		1. 27	上水道施設整備事業平良市その6 (山中タンク～伊良皆哲夫宅前)完成
		1. 29	上水道施設整備事業平良市その3 (仲松スーパー～ターミナル裏通り)完成 (アツママ神社～平良中正門前)完成 (アツママ神社～平良商店)完成 (おしゃれサロン～アツママ神社、大道線)完成
		1. 31	上水道施設整備事業平良市その4 (松原歯科～馬場団地)完成 (まるひろ洋酒店裏通り)完成 配水管移設工事(下地嘉手苅)完成
		2. 14	給水管切替工事3工区(平良市) (仲松スーパー～ターミナル裏通り)完成 (アツママ神社～平良中正門前)完成 (アツママ神社～平良商店)完成 (おしゃれサロン～アツママ神社、大道線)完成 給水管移設工事 4校(平良市)完成 (松原歯科～馬場団地)完成 (まるひろ洋酒店裏通り)完成
		2. 17	上水道施設整備事業平良市その5 (大米建設～みなとタクシー)完成 (下地黒糖～広域消防～大成コンサルタント)完成
		2. 20	上水道施設整備事業平良市、下地町その9 (国道バイパス、アパート蔵～海上保安庁宿舎入口)完成 (下地町ツング、積間)完成
		2. 26	下北加圧ポンプ場遠隔操作装置設置工事完成
		2. 28	上水道施設整備事業平良市その1 (狩俣西の浜～池間大橋取り付け道路)完成 (島尻部落)完成 上水道施設整備事業平良市その2 (西原県道バイパス)完成 上水道施設整備事業城辺町その10 (城辺町長南)完成
		2. 29	給水管切替工事5工区(平良市)
		3. 10	宮星高架タンク工事、完成
		3. 16	環境整備工事(配水池フェンス工事)完成
		3. 30	資料室内装工事(袖山浄水場)完成

西 暦	平成	月 日	記 事
1992	4	4. 1	委託業務(休日と時間外の修理当番の常駐)、管工事組合へ委託
		5. 7	第29回日本水道協会沖縄県支部総会開催(於・平良市中央公民館)
		10. 11	配水管600m/m布設工事のため(袖山浄水場より佐和田アパートまで) 市内全区域断水(午前9時～午後5時まで)
1993	5	1. 7	上水道施設整備事業 (配水管移設工事1～3工区)
		1. 8	〃 (袖山浄水場～佐和田アパート前) 3工区 完成
		1. 8	〃 〃 1工区 完成
		1. 9	〃 〃 2工区 完成
		1. 19	上水道施設整備事業 (配水管移設工事4. 5. 7工区) (平良市大原区画整理地区) 4工区完成 (平良市富名腰山ちゃん食堂～下地黒糖) 5工区完成 (城辺町・福東地区) 7工区完成
		1. 20	上水道施設整備事業 (配水管移設工事6工区) (平良市、カザンミ、地盛、新里地区) 完成
		2. 8	上水道施設整備事業 (送水施設) 完成 北部送水ポンプ完成 (浄水場内) 完成
		3. 25	上水道施設整備事業 (配水管布設工事8. 9. 10. 11工区) 平良～城辺線、鏡原地区 安全学校～七原タンク 8工区 完成 〃 〃 郡農協給油所～安全学校三叉路 9工区 完成 上野村宮国地内 砂川商店～ドイツ村入口 10工区 完成 上野村宮国地内 〃 11工区 完成
		4. 1	管理課新設に伴い城辺営業所廃止 城辺地区の検針業務全面委託される。 週休二日制実施 給水装置修理企業団負担とする。 検針業務の改善(ハンディターミナル導入)
		5. 7	第5次拡張事業変更認可される (県環第228号計画年度平成5年～14年)
		7. 21	第1回渇水対策委員会設置
		9. 10	硬度低減化促進委員会発足
		11. 2	第12代水道議会議長に池間青昌氏選任される
		11. 5	池間昌六 企業長任期満了退任(第六代)
		11. 30	上水道施設整備事業 (配水管布設工事 1工区) 完成 (宮農体育館前～みつば幼稚園裏通り)
		12. 27	送水管布設工事(加治道浄水場～与並武岳配水池) 完成
1994	6	1. 14	給水制限についての記者会見(長期渇水による水源地の取水可能量が配水量に 対応しきれなくなった為)
		1. 17	第7代企業長 上地慶彦就任
		1. 19	渇水対策本部設置
		1. 20	上水道施設整備事業 (配水管布設工事2工区) 完成 (富名腰健康広場前～山城アルミ工業前通り)

西 暦	平成	月 日	記 事
1994	6	1. 21	上水道施設整備事業（配水管布設工事3工区）完成 （教員住宅～宮古モートル・嶺間光成宅前～県営西里団地前三叉路） 制限給水実施 平良市・下地町・上野村・城辺町砂川学区 午後10:00 ～ 午前6:00（8時間） 全面制限給水実施 2月15日 午後9:00 ～ 午前7:00（10時間） 3月15日 午後10:00 ～ 午前6:00（8時間） 3月17日 午後12:00 ～ 午前6:00（6時間） 制限給水解除 4月 1日 午前6時以降
		2. 1	第5次拡張事業第1次変更認可（県環第95）
		2. 28	上水道設備整備事業（配水管布設工事4工区）完成 （県営東団地前・しまとうふ加工所前・仲間鉄工所前） （前原新吉宅～下地和弘宅）腰原
		3. 15	浄水施設工事（加治道濾過池築造工事）完成 大野水源開発工事完成
		8. 22	理事会において第8代理事長に平良市長 伊志嶺 亮氏選出される。
		9. 6	配水管布設工事（久貝団地）完成
		12. 27	空気弁設置工事完成 ブロックメーター設置工事（新城・吉野・保良・友利）完成
		1. 1	水道料金改定実施される。
		1. 30	阪神大震災緊急支援のため職員を芦屋市に派遣 1月30日～2月16日（2名） 2月13日～3月 1日（2名）
		2. 13	上水道施設整備事業（配水管 第2工区）完成 給水管切替工事（第2工区）完成
1995	7	2. 21	上水道施設整備事業（導水管第1・2工区）完成
		3. 3	〃（導水管第4・5工区）完成
			〃（着水井築造工事）袖山浄水場完成
		3. 8	〃（配水管第1・3工区）完成 ブロックメーター設置工事（西東・新里） 給水管切替工事（第1工区）完成
		3. 17	底原水源開発工事完成 ニヤーツ水源開発工事完成
		3. 21	上水道施設整備事業（導水管 第3工区）完成
		3. 27	〃（配水管 第4工区）完成 給水管切替工事（第4工区）完成
		4. 1	袖山浄水場に水源保全係を新設
		7. 1	創立30周年記念式典挙行（於：平良市中央公民館）
		8. 24	創立30周年記念講演会開催 於：アバビル 講師：真柄泰基氏 演題：「水道の水質監理と水源保全」
		8. 31	配水管布設工事（パイナガマ通り）完成
		10. 27	ブロックメーター設置工事（皆福、比嘉、長南、加治道、下北）完成

西 暦	平成	月 日	記 事
1995	7	10. 27	仕切弁設置工事(七原、新里、地盛、宮国)完成
		11. 27	上水道施設整備事業 地下水開発工事(加治道西)完成
		12. 12	阪神・淡路大震災1周年に当たり水道施設復旧支援に対し厚生省生活衛生局長より感謝状を受ける。
1996	8	1. 10	バタフライフロート弁設置工事(狩俣)完成
		2. 9	ブロックメーター設置工事(長中、福南、福西、福中、下南、砂川、下北西、西中)完成
		2. 15	消火栓設置工事(大三俵、栄、西東、西中)完成
		2. 20	上水道施設整備事業 配水管布設工事(1工区城辺町長北)完成
			〃 配水管布設工事(2工区城辺町長北)完成
			消火栓移設工事(長北)完成
			給水管切替工事(1工区城辺町長北)完成
			給水管切替工事(2工区城辺町長北)完成
		2. 28	袖山浄水場浄化槽設置工事完成
		2. 29	上水道施設整備事業 導水管布設工事(加治道西)完成
		3. 11	〃 水源設置工事(加治道西)完成
			〃 水源設置工事(大野)完成
			〃 送水設置工事(加治道浄水場)完成
			減圧弁設置工事(沖糖東)完成
		3. 15	上水道施設整備事業 配水管布設工事(3工区平良市大原)完成
			〃 配水管布設工事(4工区平良市久貝)完成
			加治道浄水場ポンプ室改良工事完成
			給水管切替工事(3工区平良市大原)完成
			〃 (4工区平良市久貝)完成
		3. 21	与並武岳配水池電磁流量計設置工事完成
			配水管改良工事(方齒科前)完成
		3. 25	仕切弁移設工事(上地)完成
		3. 26	給水管切替工事(カママ嶺公園付近)完成
		3. 31	「宮古島水道誌(Ⅱ)」発行
		7. 19	平成8年第2回議会(定例会)
		10. 14	地区別ブロックメーター設置工事(上野村9ヶ所)完成
		11. 8	濾過池更生工事完成(1～4号濾過池)
		11. 26	白川田貯水池法面環境整備工事完成
		12. 24	平成8年第3回議会(定例会)
1997	9	1. 20	企業団庁舎美装工事完成
		2. 5	上水道施設整備事業 配水管布設工事(1～3工区 平良市山中～七原)完成
		3. 10	環境整備事業(来間・保良・新城配水池)完成
			地区別ブロックメーター設置工事(平良市6ヶ所)完成
			減圧弁設置工事(下地町川満)完成
		3. 14	白川田貯水池東側周辺環境整備及び殖栽工事完成
			上水道施設整備事業 配水管布設工事(4～5工区 宮古空港ターミナル線)完成
			上水道施設整備事業 配水管布設工事(7工区 平良市地盛、城辺町加治道)完成
		3. 17	消火栓設置工事(平良市3ヶ所、城辺町1ヶ所、上野村2ヶ所)完成

西 暦	平成	月 日	記 事
1997	9	3. 19	平良市北部・高台電磁流量計設置工事完成
		3. 21	上水道施設整備事業 配水池築造工事(山中)完成 上水道施設整備事業 配水池築造工事(久松)完成 上水道施設整備事業 配水管布設工事(8～9工区 平良市中央縦線及びふじ胃腸科前、 上野村宮国)完成
		3. 28	配水管改良工事(平良市1ヶ所、城辺町2ヶ所、上野村6ヶ所)完成 平成9年第1回議会(定例会)
		3. 31	第5次拡張事業第2次変更認可(県指令環第 498号)
		4. 1	水道料金に消費税5%転嫁
		4. 24	第12回九州地区水道企業団協議会総会開催 (於・ホテルアトールエメラルド宮古島)
		7. 25	浄水方法の変更(前塩素廃止) 薬学博士:村瀬 誠
		7. 28	平成9年第2回議会(定例会)
		10. 20	地区別ブロックメーター設置工事 (城辺町1ヶ所、下地町8ヶ所、上野村1ヶ所)完成
		11. 12	消火栓設置工事(平良市6ヶ所)完成
		11. 14	第13代水道議会議長に松原信勝氏選任される。
		11. 28	環境整備工事(大神配水池)完成
		12. 22	平成9年第3回議会(定例会)
1998	10	1. 16	上地慶彦氏 企業長任期満了退任(第7代)
		1. 17	池間 功氏 企業長就任(第8代)
		1. 30	ポンプ室築造工事(貯水池、下北ポンプ)完成
		2. 10	電磁流量計設置工事(市内系統)完成
		2. 10	上水道施設整備事業 配水管布設工事 (1工区ひばり保育園、やすい食品付近)完成
		3. 10	上水道施設整備事業 配水管布設工事 (2工区ブックボックス～近代PR)完成
		3. 16	加治道浄水場合併浄化槽設置工事完成
		3. 20	上水道施設整備事業 硬度低減化施設築造工事 (土木、建築、機械設備、ペレットリアクター、着水井、分水井)完成
		3. 25	配水管改良工事(城辺町5ヶ所、上野村2ヶ所)完成
		3. 27	平成10年第1回議会(定例会)
		7. 30	平成10年第2回議会(定例会)
		8. 1	「宮古島水道水源保護条例」公布
		8. 17	宮古島水道水源保護審議会委員の委嘱状交付及び第1回審議会
		9. 25	平成10年第3回議会(臨時会)
		10. 21	白川田・東添道流域内水源調査業務完了(平成6年度～平成10年度)
		11. 5	宮古島水道水源保護地域の指定について審議会より答申を受け指名する。 (白川田、東添道、福里)
		11. 5	狩俣ポンプ場改良工事完成
		12. 15	配水管布設替え工事(厚生園前)完成
		12. 22	平成10年第4回議会(定例会)

西 暦	平成	月 日	記 事
1999	11	2. 10	上水道施設整備事業 配水管布設工事 (2工区 ばっしらいいん～宮古焼き、宮古イエスキリスト教会～のひなアパート)完成
		2. 10	上水道施設整備事業 配水管布設工事 (3工区 下地町上地、宮古旅館～市上原団地)完成
		2. 26	北部送水ポンプ改良工事完成
		3. 10	上水道施設整備事業 配水管布設工事 (1工区 旧JA給油所～大和電工)完成
		3. 15	上水道施設整備事業 硬度低減化施設築造工事 (場内および法面整備、機械・電気設備、場内配管、非常用発電機)完成
		3. 21	硬度低減化施設試運転(全量処理24時間自動運転)
		3. 29	平成11年第1回議会(定例会) ～30日まで 水道料金改定可決される(平成11年7月検針分より実施)
		3. 30	配水管改良工事(平良市6ヶ所、城辺町3ヶ所)完成
		4. 1	袖山浄水場硬度低減化施設共用開始
		7. 1	水道料金改定実施される
		7. 8	第68回日本水道協会九州地方支部総会開催 (於・平良市)
		7. 21	平成11年第2回議会(定例会)
		9. 28	上水道施設整備事業 配水管布設工事 (4工区 下地町川満地内)完成
		10. 29	上水道施設整備事業 白川田水源地改良工事 (土木・建築、機械・電気、機械・電気その2)完成
		11. 30	配水管改良工事(下地町2ヶ所、上野村1ヶ所)完成
		12. 2	平成11年第3回議会(定例会)
2000	12	2. 10	白川田水源地環境整備工事完成
		3. 1	平成12年第1回議会(定例会) ～2日まで
		3. 6	上水道施設整備事業 袖山浄水場滅菌設備改良工事 (次亜注入)完成
		3. 6	上水道施設整備事業 前浜送水施設改良工事完成
		3. 8	上水道施設整備事業 袖山浄水場中央管理棟築造工事 (土木、建築)完成
		3. 15	加治道浄水場硬度低減化施設築造工事 (建築、機械・電気)完成
		3. 17	上水道施設整備事業 配水管布設工事 (1工区 宮古第3給油所～旧JA給油所)完成
		3. 17	県道4号線化に伴う配水管布設工事 (宮古第3給油所～旧JA給油所)完成
		3. 21	上水道施設整備事業 袖山浄水場計装設備改良工事 (集中監視、集中監視その2)完成
		4. 1	加治道浄水場硬度低減化施設共用開始
		7. 4	平成12年第2回議会(定例会)
		11. 13	宮古島上水道企業団車庫築造工事完成
		12. 1	平成12年第3回議会(定例会)
2001	13	1. 10	与那覇～来間島海底送水管補修工事完成
		2. 28	ブロックメーター設置工事(1工区)(平良市北部地区、下地町洲鎌地区)完成
		2. 28	ブロックメーター設置工事(2工区)(平良市鏡原地区)完成
		2. 28	上水道施設整備事業 配水管布設工事(2工区 平良市久貝地区、菊の露通り)完成

西 暦	平成	月 日	記 事
2001	13	2. 28	上水道施設整備事業 配水管布設工事(3工区 下地町川満、皆愛、嘉手苅地区)完成
		3. 1	平成13年第1回議会(定例会)
		3. 6	消火栓設置工事(平良市、上野村)完成
		3. 15	上水道施設整備事業 加治道浄水場浄水池築造工事完成
		3. 19	配水管改良工事(下地町与那覇地区)完成
		3. 21	上水道施設整備事業 配水管布設工事 (4工区 平良市ぐしけん印刷前、佐久川金物店前、城辺町長北地区)完成
		3. 23	上水道施設整備事業 配水管布設工事 (1工区 平良市山中、二重越地区、石水亭前)完成
			上水道施設整備事業 二重越第2配水池築造工事完成
			上水道施設整備事業 袖山浄水場9号濾過池築造工事完成
			上水道施設整備事業 二重越第2配水池築造工事(電気)完成
			上水道施設整備事業 袖山浄水場9号濾過池築造工事(法面)完成
			袖山浄水場濾過池改良工事(1号～4号濾過池)完成
			上水道施設整備事業 袖山浄水場9号濾過池築造工事(法面)完成
			袖山浄水場濾過池改良工事(1号～4号濾過池)完成
		7. 3	平成13年第2回議会(定例会)
		7. 26	第5次拡張事業 第3次変更(取水地点の変更)
		10. 2	配水管改良工事(1工区 城辺町山川地区)完成
			配水管改良工事(2工区 平良市野原越、上野村ガーラ原地区)完成
		10. 15	仕切弁設置工事(1工区 平良市池間地区)完成
			仕切弁設置工事(2工区 平良市、上野村)完成
		10. 22	ブロックメーター設置工事(平良市、下地町)完成
		12. 4	平成13年第3回議会(定例会)
		12. 25	上水道施設整備事業 添道水源地開発工事(さく井)完成
2002	14	1. 16	池間 功氏 企業長任期満了退任(第8代)
		2. 12	上水道施設整備事業 配水管布設工事(1工区 平良市久松小学校前)完成
		2. 15	上水道施設整備事業 配水管布設工事(2工区 平良市国営間通り、あばら樹通り 次郎工業裏通り、共和マンション裏通り、仏法寺裏通り)完成
			上水道施設整備事業 配水管移設工事(3工区 平良市産業道路、喜寿田マンション前 荷川取公民館前)完成
			量水器官民境界移設工事(1工区 城辺町吉野、保良、新城、皆福、七又)完成
			量水器官民境界移設工事(2工区 城辺町福東、福中、福西、福南 加治道、比嘉、福北)完成
			量水器官民境界移設工事(3工区 城辺町仲原、西東、西中、下北)完成
			量水器官民境界移設工事(4工区 城辺町西々、吉田、長南、長中、長北)完成
			量水器官民境界移設工事(5工区 城辺町下南、砂川、友利)完成
		2. 28	消火栓設置工事(平良市宮原、久貝、荷川取地区)完成
		3. 5	平成14年第1回議会(定例会)
		3. 8	高野水源地1号ポンプ改修工事完成
		3. 15	上水道施設整備事業 導水管布設工事(1工区 添道水源地～市民球場前)完成
			上水道施設整備事業 導水管布設工事(2工区 市民球場前～砂川金物店)完成

西 暦	平成	月 日	記 事
2002	14	3. 20	加治道浄水場減菌設備改良工事完成 上水道施設整備事業添道水源地開発工事(建築)完成 袖山浄水場環境整備工事完成 加治道浄水場環境整備工事完成 袖山浄水場8号濾過池電動弁取替工事完成
		3. 25	上水道施設整備事業新城配水池築造工事完成 上水道施設整備事業 配水管布設工事(4工区) 平良市池間大橋前、タンク前、池間小学校前)完成 袖山浄水場環境整備工事(張芝)完成 上水道施設整備事業添道水源地開発工事(電気)完成 上水道施設整備事業添道水源地開発工事(電気その2)完成 配水管改良工事(3工区)城辺町山川地区完成 配水管改良工事(4工区)上野村側嶺地区完成 海底送水管防食工事(来間、池間)完成
		3. 26	配水管布設工事(平良市民球場前)完成
		3. 27	公共下水道使用料徴収取り扱い協定
		4. 1	渡真利 光俊氏 企業長就任(第9代)
		4. 1	添道水源地取水開始
		5. 30	上水道施設整備事業池間配水池築造工事完成
		6. 12	添道水源地環境整備工事完成
		6. 14	池間配水池環境整備工事完成
		6. 14	新城配水池環境整備工事完成
		7. 19	平成14年第2回議会(定例会)
		8. 9	白川田導水管排水弁設置工事完成
		8. 26	城辺線4車線に伴う配水管布設工事完成
		8. 28	水資源功績受賞(国道交通大臣賞)
		9. 27	下地、上野、城南ライン流量計設置工事完成
		12. 4	平成14年第3回議会(定例会)
2003	15	1. 31	上水道施設整備事業 配水管布設工事(4工区) 沖縄製糖工場東～下地町老人福祉センター前)完成 上水道施設整備事業 配水管布設工事(5工区) 城辺町福里給油所西～町営福里第2団地(向かい)完成 上水道施設整備事業 配水管布設工事(6工区) 平良市腰原地区完成
		2. 17	上水道施設整備事業 配水管布設工事(1工区) 平良市元佐和田アパート前～ アイワ家具前)完成 上水道施設整備事業 配水管布設工事(2工区) 平良市アイワ家具前～日進電気 西交差点)完成 上水道施設整備事業 配水管布設工事(3工区) 上野村高田公民館～千代田ハイツ～野原板金前)完成 企業団庁舎屋上断熱防止工事完成
		3. 3	平成15年第1回議会(定例会)
		3. 10	消火栓設置工事(平良市西里、上野村宮国)完成

西 暦	平成	月 日	記 事
2003	15	3. 14	老朽管改良工事(1工区 平良市下崎建設裏と豊見山車輛前、上野村宮国地区)完成 老朽管改良工事(2工区 城辺町西中公民館前と新城、下地町郵便局前と上地及び入江地区)完成
		3. 26	仕切弁設置工事(平良市山中配水池東、沖電工東、塩川商店前)完成 仕切弁・空気弁設置工事(仕切弁は恩川理容館前と袖山浄水場前(空気弁は袖山浄水場西と東)完成
2004	16	8. 8	袖山水源地揚水井洗滌工事完成
		9. 9	白川田導水管改修工事(1工区)完成 白川田導水管改修工事(2工区)完成
		12. 2	平成15年第3回議会(定例会)
		1. 9	台風14号に関わる災害復旧工事(袖山・加治道浄水場)完成
		1. 16	台風14号に関わる災害復旧工事(野原・宮星・来間・新城配水池)完成
		1. 30	給水管切替工事(3工区 平良市鏡原元そろばん塾前道路地内)完成 上水道施設整備事業 配水管布設工事(2工区)完成 上水道施設整備事業 配水管布設工事(3工区)完成
		2. 20	上水道施設整備事業 配水管布設工事(1工区)完成
		2. 27	袖山浄水場5・6号濾過池改良工事(濾過材)完成 袖山浄水場5・6号濾過池改良工事(建築・電気)完成 袖山浄水場5・6号濾過池改良工事(配管)完成
		3. 2	平成16年第1回議会(定例会)
		3. 10	上水道施設整備事業袖山水源改良工事(機械・電気)完成
		3. 15	上水道施設整備事業 配水管布設工事(4工区)完成 上水道施設整備事業 配水管布設工事(5工区)完成 上水道施設整備事業 配水管布設工事(6工区)完成 上水道施設整備事業 配水管布設工事(7工区)完成 上水道施設整備事業 配水管布設工事(8工区)完成
			給水管切替工事(7工区 平良市添道公民館、西添道地区)完成 給水管切替工事(8工区 平良市腰原、荷川取地区)完成 給水管切替工事(4工区 城辺町地区)完成 給水管切替工事(6工区 平良市 下地町地内)完成 高野水源地ポンプ室、防水、塗装工事完成 加治道浄水場ポンプ室、防水、塗装工事完成 消火栓設置工事(新設)平良市、城辺町、上野地区完成 消火栓設置工事(移設)平良市地内完成
		3. 17	第5次拡張事業変更(給水区域の拡張)認可
		3. 20	災害復旧に伴う硬度低減化施設屋根瓦補修工事完成
		3. 25	上水道施設整備事業 配水管布設工事(9工区)完成 給水管切替工事(9工区 平良市 下地町地内)完成 水源涵養林整地工事完成 危機管理対策遠隔監視システム設置工事
		3. 26	袖山水源地環境整備工事(屋上断熱防水塗装)完成
		3. 29	竹林公園内東屋築造工事完成

西 暦	平成	月 日	記 事
2004	16	3. 29	漏水調査委託業務(市街地、高台、久松地区)有収率契約完成 管路情報管理システム導入(東部地区、上野村)完成
		4. 21 4. 27 6. 19 7. 30 11. 10 12. 7 12. 10	平成16年第2回議会(臨時議会) 第41回日本水道協会県支部総会(平良市)ホテルアトールエメラルド宮古島 自治体環境グランプリ2004表彰 狩俣～池間島海底送水管狩俣側立上がり部補修工事完成 宮星配水池昇降背もたれ梯子取替工事完成 県道幅に伴う排水管切替工事 白川田貯水池太陽光発電システム設置工事完成
2005	17	1. 28 1. 31	アスファルト路面復旧工事 上水道施設整備事業 配水管布設工事(4工区)完成 上水道施設整備事業 配水管布設工事(7工区)完成 上水道施設整備事業 配水管布設工事(9工区)完成 給水管切替工事(4工区)完成 給水管切替工事(7工区)完成 給水管切替工事(9工区)完成
		2. 4	上水道施設整備事業 配水管布設工事(1工区)完成 上水道施設整備事業 配水管布設工事(6工区)完成 給水管切替工事(6工区)完成
		2. 10	上水道施設整備事業 配水管布設工事(2工区)完成 上水道施設整備事業 配水管布設工事(3工区)完成 給水管切替工事 (1工区)完成 給水管切替工事 (2工区)完成
		2. 18	上水道施設整備事業 配水管布設工事(5工区)完成 上水道施設整備事業 配水管布設工事(8工区)完成 給水管切替工事 (3工区)完成 危機管理対策遠隔監視システム設置工事(その2) 消火栓設置工事(移設)
		2. 25	上水道整備事業袖山浄水場東、北部送水施設改良工事(高圧受変電設備) 上水道整備事業袖山浄水場東、北部送水施設改良工事(土木、建築)
		2. 28	上水道施設整備事業 配水管布設工事(10工区)完成 上水道施設整備事業 配水管布設工事(11工区)完成 上水道施設整備事業 配水管布設工事(12工区)完成 給水管切替工事 (5工区)完成 給水管切替工事 (8工区)完成 給水管切替工事 (10工区)完成 給水管切替工事 (11工区)完成
		3. 30	漏水調査委託業務(有収率契約) 加治道西水源1号、2号取水井戸洗浄工事 加治道西水源2号取水ポンプ及び揚水管取替工事 太陽光発電システム遠隔監視用データロガー装置設置工事

西 暦	平成	月 日	記 事
2005	17	7. 29	狩俣配水池階段設置工事 袖山浄水場東、北部送水施設周辺環境整備工事
		8. 12	危機管理対策遠隔監視システム設置工事(その3)
		8. 25	消火栓設置工事(移設)
		9. 22	更竹周辺地下水水質監視孔設置及び調査業務
		9. 30	渡真利光俊氏 企業長退任(第9代)
		10. 1	5市町村合併に伴い宮古島市水道局に改称する。
		10. 1	合併創設認可される。(県指令福2426号)
		10. 31	袖山浄水場1～4号ろ過池補砂工事
		11. 15	袖山浄水場東、北部送水施設改良工事(高圧受電設備その2)
		11. 28	給水管切替工事(2工区)完成 ・宮原(砂川昇清宅前～平良勝則宅)
		12. 15	管路情報管理システム導入
		12. 16	配水管布設工事(2工区)完成 ・宮原(砂川昇清宅前～平良勝則宅) 配水管布設工事(1工区)完成 ・市街地(喫茶G-1～郵便局前ホットスパ)・松原(ホットスパ松原南店前～福里鉄也宅)
		12. 19	給水管切替工事(1工区)完成 ・市街地(喫茶G-1～郵便局前ホットスパ)・松原(ホットスパ松原南店前～福里鉄也宅)
2006	18	1. 16	給水管切替工事(3工区)完成 ・下崎(食事処すなやま前～与那覇長一宅)・下崎(狩俣栄次宅前～下崎食堂) 給水管切替工事(4工区)完成 ・西上原(清掃センター前～コーポ平良)・西上原(山里建設～羽地宅) 給水管切替工事(5工区)完成 ・東上原(砂川清治宅前～ヘアーサロンアトリエ)・添道(東亜技研前～植物園西駐車場前) 配水管布設工事(3工区)完成 ・下崎(食事処すなやま前～与那覇長一宅)・下崎(狩俣栄次宅前～下崎食堂) 配水管移設工事(4工区)完成 ・西上原(清掃センター前～コーポ平良)・西上原(山里建設～羽地宅) " (5工区) 完成 ・東上原(砂川清治宅前～ヘアーサロンアトリエ)・添道(東亜技研前～植物園西駐車場前) " (6工区) 完成 ・大原(三和自練前～東里ガングリ四又)・大原(元教育事務所前～丸国タイヤ前) " (7工区) 完成 ・入江(入江ブロックメーター前～入江団地前) " (9工区)完成 ・名加山1号・大嶺1,2号(宮国善好宅前～下地栄勇前道路、平良幸弘宅前～上地昇宅)・名加山2号(名加山団地前～海宝前) 配水管移設工事 (10工区)完成 ・下南1号(楚南鮮魚店前～砂川清厚宅)・下南2号(川満キク宅前～佐和田恵吉宅)・下南3号(与座鉄筋工業付近) 給水管切替工事(6工区)完成 ・大原(三和自練前～東里ガングリ四又)・大原(元教育事務所前～丸国タイヤ前) " (11工区)完成 ・松原(福里哲也宅前～池間正幸宅前道路)・川満(コーラルベジタブル前道路) 配水管移設工事(11工区)完成 ・松原(福里哲也宅前～池間正幸宅前道路)・川満(コーラルベジタブル前道路)

西 暦	平成	月 日	記 事
2006	18	1. 30	配水管移設工事(12工区)完成 ・宮国(博愛ゲート入口～博愛漁港入口)
		1. 31	配水管移設工事(8工区)完成 ・入江(入江団地前～ヒトジ部落) ・入江(ヒトジ部落～下里光之助宅前) ・入江(刈鎌三郎宅前)
		2. 10	給水管切替工事(8工区)完成 ・入江(入江団地前～ヒトジ部落) ・入江(ヒトジ部落～下里光之助宅前) ・入江(刈鎌三郎宅前)
		1. 20	〃 (10工区)完成 ・下南1号(楚南鮮魚店前～砂川清厚宅) ・下南2号(川満キ宅前～佐和田恵吉宅) ・下南3号(与座鉄筋工業付近)
		3. 28	アスファルト路面復旧工事 (その2) 完成 ブロックメーター設置工事 完成 伊良部浄水場緩速ろ過水送水管布設工事 完成
		3. 30	伊良部浄水場緩速ろ過池周辺フェンス設置工事 完成
2007	19	11. 30	アスファルト路面復旧工事 完成
		12. 25	伊良部、加治道及び袖山浄水ろ過砂(7池)入替工事 完成
		2. 5	上水道施設整備事業配水管布設工事(1工区)完成 池間(一周道路) 配水管布設工事(2工区)完成 池間(学校前) 〃 (4工区)完成 久松 〃 (6工区)完成 下地皆愛
		2. 13	給水管布設工事(2工区)完成 池間(学校前)
		2. 15	給水管布設工事(6工区)完成 下地皆愛
		2. 20	配水管布設工事(3工区)完成 根間地・加治道・下南 配水管布設工事(5工区)完成 上野名嘉山 給水管布設工事(1工区)完成 池間(一周道路) 〃 (3工区)完成 根間地・加治道・下南 〃 (4工区)完成 久松 〃 (5工区)完成 上野名嘉山
		2. 28	伊良部浄水場逆浸透膜交換 配水管布設工事(7工区)完成 下地高千穂 〃 (12工区)完成 池間添 給水管布設工事(7工区)完成 下地高千穂
		3. 19	配水管布設工事(8工区)完成 池間添(佐良浜) 〃 (9工区)完成 池間添(佐良浜) 〃 (10工区)完成 池間添(佐良浜) 〃 (11工区)完成 池間添(佐良浜)
		3. 28	給水管布設工事(8工区)完成 池間添(佐良浜) 〃 (9工区)完成 池間添(佐良浜) 〃 (10工区)完成 池間添(佐良浜) 〃 (11工区)完成 池間添(佐良浜) 〃 (12工区)完成 池間添(佐良浜)
		3. 30	県指令福第611号 宮古島市水道事業認可(第一回変更)
		9. 03	議案第70号 宮古島水道事業給水条例の一部を改正する条例 (合併協定項目に基づく水道使用料の統一、条例を改正する)

西 暦	平成	月 日	記 事
2007	19	11. 12	上水道施設設備事業配水管布設工事(1工区)完成・添道 (市民球場前北道路)(市民球場前東道路) 給水管切替工事(1工区)・添道(市民球場前北道路)(市民球場前東道路)
		11. 19	上水道施設整備事業配水管布設工事(2工区)完成・西里警察署前～狩俣採石
		11. 30	上水道施設設備事業配水管布設工事(3工区)完成・ 野原越(北野原越バス停前～新里工業前道路付近) 給水管切替工事(3工区)・野原越(北野原越バス停前～新里工業前道路付近)
			上水道施設設備事業配水管布設工事(4工区)完成 下里(ミナミ金物店前～大政マンション前交差点) 給水管切替工事(4工区)・下里(ミナミ金物店前～大政マンション前交差点)
			上水道施設設備事業配水管布設工事(5工区)完成 ・パイナガマビーチ前国道 給水管切替工事(5工区)・パイナガマビーチ前国道
		12. 07	上水道施設整備事業配水管布設工事(7工区)完成 佐良浜(佐良浜診療所付近～浜電サービス付近) 給水管切替工事(7工区)・佐良浜(佐良浜診療所付近～浜電サービス付近)
			大主神社付近給水管切替工事 給水管切替14件 上水道施設設備事業 ・白川田貯水池改良工事完成
			上水道施設整備事業配水管布設工事(6工区)完成・ 高千穂(ガーラバル団地前道路付近～ヒトジ部落前)
		1. 02	〃 (8 工区)完成・第2高千穂団地前～宮星配水池へ
		2. 08	〃 (9 工区)完成・8工区連結～宮星配水池へ 〃 (10工区)完成・9工区連結～宮星配水池へ
2008	20	1. 25	伊良部地区舗装復旧工事完成 (伊良部国仲地区)
		2. 01	宮古地区水道事業広域化検討委員会、委嘱状辞令交付式
		2. 21	老朽管廃止に伴う給水管切替工事完成 (久貝地区、カママ嶺公園前、吉田マンション前、新興開発)
		2. 25	アスファルト路面復旧工事完成(その2)
		3. 05	上水道施設整備事業配水管布設工事(11工区)・高千穂(10工区連結～宮星配水池)完成
		3. 10	給水管切替工事(11工区)完成・(タカラガイペンション前～沖縄総合開発前)
		3. 24	ブロックメーター設置工事完成(伊良部国仲地区) 農漁業集落排水使用料徴収取り扱い協定
		6. 17	上水道施設設備事業配水管布設工事完成(1工区)・平良(下里)地内
		7. 31	共同溝設置に伴う弁室形状変更工事完成・宮古島市平良字西里地内
		8. 29	共同溝設置に伴う配水管上越し工事完成・宮古島市平良字西里地内
		9. 30	袖山浄水場ろ過池(5号～8号)補砂工事完成・袖山浄水場地内
		10. 10	アスファルト路面復旧工事(その1)完成・宮古一円
		10. 20	久松配水地周辺老朽管改修工事完成・平良(久松)地内 渡口の浜周辺配水管布設工事完成・伊良部(伊良部)地内
		12. 04	上水道施設設備事業配水管布設工事 (1工区)完成・平良下里(川田荘前～総合実業高校)DCIP φ 350 L=136.0m(新設) (2工区)完成・平良下里(下里大通り～川田荘前)DCIP φ 350 L=341.88m(新設) (3工区)完成・平良下里 総合実業高校前 DCIP φ 350 L=287.72m(新設) (4工区)完成・城辺 砂川 加治道系統と野原系統との連結 DCIP φ 200 L=604.42m(新設) (5工区)完成・城辺 砂川・4工区連結～野原系統へ DCIP φ 200 L=606.84m(新設) (6工区)完成・上野 大嶺・国道大嶺交差点北付近～シギラベイ付近 DCIP φ 200 L=600.00m(新設) 減圧弁1基 (7工区)完成・上野 大嶺・6工区連結～シギラベイ付近 DCIP φ 200 L=650.00m(新設)

西 暦	平成	月 日	記 事
2009	21	12. 04	上水道施設設備事業配水管布設工事 (8工区)完成・上野 大嶺・7工区連結～シギラベイ付近 DCIP φ 200 L=637.73m(新設) (9工区)完成・平良 下地・与那覇(前浜ビーチ前～東急リゾートホテル前) DCIP φ 100 L=509.58m(新設)
		12. 25	上水道施設設備事業給水管切替工事 (9工区)完成・平良 鏡原(嘉数マンション～鏡原小学校前) DCIP φ 100 L=286.00m(新設)
		1. 16	汚砂置き場土間設置工事・白川田水源地地内
		1. 30	道路拡張に伴う配水管移設工事・伊良部(国仲・佐良浜)地内
		2. 12	上水道施設設備事業配水管布設工事 (10工区)完成平良下里 総合実業高校前3工区連結～ DCIP φ 350 L=67.00m(新設) 上水道施設設備事業配水管布設工事 (11工区)完成・城辺・下地 与那覇(前浜ビーチ前～東急リゾートホテル前) 9工区連結～DCIP φ 100 L=156.00m(新設)・砂川(砂川最寄)
		3. 03	南区配水管改良工事完成・伊良部(佐和田・仲地)地内
		3. 25	伊良部大橋海中道路側橋添(沖合側)添架物架台設置工事完成・宮古島市地内
		10. 30	上水道施設設備事業配水管布設工事 (4工区)完成・腰原(共和マンション前～寿産業前)DCIP φ 200 L=266.43m(復帰前施設の更新)
		11. 27	上水道施設設備事業給水管切替工事(4工区)完成・腰原
		12. 10	上水道施設設備事業配水管布設工事 (1工区)完成・下里(みやこ学園分場アタナス前～国道390バイパス交差点)DCIP φ 350 L=164.3m(新設) (5工区)完成・砂川(砂川和男宅前～川満恵俊宅前、池原孝記宅前～狩俣茂夫宅前) HIVP φ 50L=314.78m ・長南(長南公民館西～古謝盛夫宅前)HIVP φ 50L=281.52m (6工区)完成・鏡原(鏡原中学校東～漢那弘之宅前)DCIP φ 100 L=359.35m ・地盛(地盛公民館前～下地嘉津男宅前)DCIP φ 100L=299.98m(新設) (7工区)完成・洲鎌(棚根部落内消火栓付近～県道235号線取付道路付近)DCIP φ 100L=180.27m ・洲鎌(嘉手苅成幸宅前～(有)自然力研究所前)DCIP φ 100L=202.48m ・洲鎌(下地陸上競技場東～仲里祐昭宅前)HIVP φ 50L=164.11m
		12. 18	宮古島市水道事業の設置等に関する条例の一部を改正する条例議決(上下水道部設置)
		12. 18	上水道施設設備事業給水管切替工事(6工区)完成・鏡原
		12. 21	市場通り線街路改良工事に伴う水道管切回し工事完成・(旧)北市場前
		12. 25	老朽管廃止に伴う給水管切替工事完成・伊良部(仲地)・佐良浜
2010	22	2. 10	上水道施設設備事業配水管布設工事 (2工区)完成・久貝(国道390バイパス交差点～久松小学校付近) DCIP φ 350L=417.49m(新設) (3工区)完成・久貝(久松小学校付近～伊良部大橋現場事務所付近) DCIP φ 300L=499.61m(新設)

西 暦	平成	月 日	記 事
2010	22	3. 05	伊良部大橋海中道路側橋添(沖側)取付部送水管設置工事完成 伊良部大橋SUS304 φ 300L=14.00m (新設)・久貝(伊良部大橋現場事務所付近)DCIP φ 300L=15.74(新設)
		3. 15	下地島空港佐良浜線道路改良工事に伴う水道管移設工事完成・伊良部高校(西側)
		3. 25	ブロックメーター設置工事完成・伊良部、池間添、前里添
		3. 26	伊良部浄水場環境整備(フェンス設置)工事完成・伊良部浄水場
		4. 1	機構改革により上下水道部へ改称
		5. 14	電線共同溝に伴う配水管布設工事(1工区)完成・高野西里線(宮古第一給油所～北小学校前)
		5. 14	電線共同溝に伴う配水管布設工事(2工区)完成・高野西里線(旧郵便局～モンテドール前)
		8. 31	袖山浄水場ろ過池(1号から4号)補砂工事完成・袖山浄水場内
		11. 22	上水道施設整備事業配水管布設工事 (6工区)完成・大原(創価学会前～松ヶ原ゴルフ場)DCIP φ 150 L=405.78m(新設)
		12. 10	上水道施設整備事業配水管布設工事 (1工区)完成・伊良部(吉信産業前～牧山配水池(予定地))DCIP φ 300 L=501.28m(新設) (2工区)完成・伊良部(1工区連結～牧山地区(予定地))DCIP φ 300 L=528.72m(新設) (3工区)完成・伊良部(2工区連結～牧山地区(予定地))DCIP φ 300 L=513.52m(新設)
		12. 15	(7工区)完成・腰原(三和自練前十字路～フラワーショップいずみ)DCIP φ 100 L=243.57m(新設) ・細竹(宮古亜熱帯植物園前DCIP φ 100 L=426. 03m(新設)
2011	23	1. 07	上水道施設整備事業配水管布設工事 (5工区)完成・新豊(宮古空港前～多良間屋付近) DCIP φ 150 L=761.64m DCIP φ 100 L=139.90m(新設)
		1. 11	上水道施設整備事業伊良部大橋橋梁添架工事 (一般部)完成・伊良部大橋地内 複合外装ポリエチレン管 φ 300 L=610.00m(新設)
		2. 18	(一般部その2)完成・伊良部大橋地内 複合外装ポリエチレン管 φ 300 L=140.00m(新設)
		2. 18	上水道施設整備事業配水管布設工事 (4工区)完成・久貝(伊良部大橋建設事務所前～伊良部大橋)DCIP φ 300 L=160.00m(新設)
		2. 25	(8工区)完成・上野(高田ブロックメーター前十字路 DCIP φ 250 L=426.03m(新設)
		3. 25	城辺線電線共同溝工事に伴う配水管及び給水管切替工事完成・宮古病院裏通り
		8. 19	伊良部大橋橋梁整備6期工事に伴う配水管移設工事完成・久貝地内
		8. 25	久松地区配水管布設工事完成・久松地内 道路改良工事に伴う配水管切下げ工事完成・伊良部字伊良部地内
		12. 09	上水道施設設備事業配水管布設工事 (4工区)完成・城辺(比嘉) HVIP φ 50 L=229. 83m ・城辺(仲原)DCIP φ 100 L=445.93m
2012	24	1. 06	(3工区)完成・城辺(砂川) DCIP φ 100 L=784.92m HIVP φ 50 L=247.31m
		1. 12	(1工区)完成・平良(久松) DCIP φ 300 L=518.03m
		1. 25	アスファルト路面復旧工事(その1)完成・宮古一円

西 暦	平成	月 日	記 事
2012	24	1. 27	上水道施設設備事業配水管布設工事 (5工区)完成・平良(大原) DCIP φ 250 L=119.02m・下地(上地) DCIP φ 100 L=466.00m
		1. 31	国仲地区給水管切替及び仕切弁設置工事完成・伊良部(国仲)地内
		2. 01	上水道施設設備事業伊良部大橋主航路部水道管添架工事 (2工区)完成・千葉県市原地内 PP φ 300 L=139.20m
		2. 17	上水道施設設備事業配水管布設工事(2工区)完成・伊良部(牧山) DCIP φ 300 L=361.65m
		2. 20	伊良部大橋橋梁整備7期工事に伴う配水管移設工事完成・久貝地内
		2. 24	上水道施設設備事業伊良部大橋主航路部水道管添架工事 (3工区)完成・三重県津地内 PP φ 300 L=136.50mm
		3. 15	(1工区)完成・香川県多度津地内 PP φ 300 L=133.50m
		3. 16	上水道施設設備事業久松ポンプ場築造工事(場内整備)完成・平良(久松) A=945m ²
		3. 23	下地島空港佐良浜線道路改良工事に伴う導水管移設工事完成・伊良部国仲
		3. 27	危機管理対策遠隔監視システム更新・宮古島市地内
		5. 31	上水道施設設備事業伊良部大橋橋梁添架工事 (一般部)完成・伊良部大橋地内 PP φ 300 L=1426.2m
		11. 27	伊良部大橋水道管添架工事(海中道路埋設部)完成・伊良部大橋地内 PP φ 300 L=504.00m
		11. 30	上水道施設設備事業送水管布設工事(4工区)完成・平良(久貝)地内 DCIP φ 300 L=554.62m
		12. 07	上水道施設設備事業配水管布設工事 (2工区)完成・上野(宮国)地内 DCIP φ 250 L=470.66m
		12. 07	(3工区)完成・上野(名嘉山)地内 DCIP φ 100 L=324.98m 名嘉山団地北～県道202号線
		12. 14	(7工区)完成・下地(皆愛)地内 DCIP φ 200 L=653.33m 下地小学校～国道390号線～東風平宅前 (8工区)完成・下地(皆愛)地内 DCIP φ 200 L=650.48m 東風平宅前～ツヌジ御嶽南 (9工区)完成・下地(皆愛)地内 DCIP φ 200 L=692.98m ツヌジ御嶽南～長間宅前
		12. 21	(6工区)完成・平良(袖山・竹原)地内 DCIP φ 100 L=560.61m 宮古焼き～キャッスル松原 DCIP φ 100 L=119.85m サンエーショッピングタウン宮古北側
		12. 27	(4工区)完成・伊良部(長浜)地内 DCIP φ 100 L=705.87m ペンション富谷～浜川宅前
		12. 27	(5工区)完成・伊良部(長浜)地内 DCIP φ 100 L=724.56m 浜川宅前～平成の森公園北側
2013	25	1. 21	上水道施設設備事業送・配水管布設工事 (1工区)完成・伊良部(牧山)地内 DCIP φ 300 L=364.91m 牧山展望台南道路～(2工区)連結 DCIP φ 200 L=216.08m DCIP φ 100 L=150.39m 上水道施設設備事業送水管布設工事 (3工区)完成・伊良部(牧山)地内 DCIP φ 300 L=200.00m 伊良部大橋～県道202号線

西 暦	平成	月 日	記 事
2013	25	2. 04	上水道施設設備事業配水管布設工事 (1工区)完成・平良(大原)地内 DCIP φ 200 L=455.52m JAセルフ前交差点～宮里動物病院～聖仙書道塾～ホワイト急便
		2. 15	上水道施設設備事業送・配水管布設工事 (2工区)完成・伊良部(牧山)地内 DCIP φ 300 L=362.12m (1工区)完成 ・連結～牧山配水予定地 DCIP φ 200 L=367.42m
		2. 25	(10工区)完成・伊良部(牧山)地内 DCIP φ 300 L=459.92m (2工区)完成 ・連結～牧山配水予定地 上水道施設設備事業久松ポンプ場築造工事完成 (建築)・平良(久貝)地内 RC造り A=133㎡ 久松ポンプ場
2014	26	10. 31	上水道施設整備事業配水管布設工事(11工区)前年度分繰越 完成
		2. 03	上水道施設整備事業伊良部大橋水道管添架工事(取付橋梁部)完成・PP φ 300 L=226.07m(新設)
		2. 04	上水道施設整備事業配水管布設工事(1工区)完成・平良(竹原)地区 DCIP φ 100 L=451.22m (新設)
		3. 05	上水道施設整備事業伊良部大橋橋梁添架工事(一般部)その1完成・PP φ 300 L=245.40m(新設)
		3. 07	上水道施設整備事業送・配水管布設工事 (1工区)完成・久貝(伊良部大橋建設事務所前～伊良部大橋)DCIP φ 300 L=234.32m(新設) 上水道施設整備事業伊良部大橋橋梁添架工事 (一般部)その2(翌年度分繰越)完成・PP φ 300 L=678.80m(新設)
		4. 1	水道料金改定(消費税 8%転嫁)
		9. 30	上水道施設整備事業(前年度繰越)配水管布設工事(2工区)完成 DCIP φ 150 L=230.81
		10. 24	上水道施設整備事業(前年度繰越)伊良部大橋水道管添架工事 (一般部)その2完成 PP φ 300 L=678.80m(新設)
		10. 10	給水切替工事(2工区)完成 平良字(富名腰)地内
		10. 31	上水道施設整備事業(前年度繰越)久松ポンプ場築造工事完成(電気設備) 電気設備一式
		12. 15	ロードサーベイシステム導入 宮古島市地内
		12. 15	アスファルト路面復旧工事(その3)完成 平良地区一円
		12. 20	上水道施設整備事業送・配水管布設工事(2工区)完成 伊良部(牧山)地内 送水管 PP φ 300 L=48.95m DCIP φ 300 L=344.13m 配水管 DCIP φ 100 L=399.9m
2015	27	1. 16	上下水道部駐車場ブロック等撤去工事
		2. 20	(1工区)完成 送水管 PP φ 300 L=96.50mDCIP φ 300 L=196.95m 配水管DCIP φ 100 L=136.66m
		2. 27	上水道施設整備事業配水管布設工事(1工区)完成 城辺長中 長中公民館～ 他 PEP φ 50 L=407.98m 給水切替工事(2工区)完成 城辺(長中)地内
		3. 13	上水道施設整備事業 牧山配水池築造工事完成 PC造 V=1,300㎡ 伊良部(牧山)地内 上水道施設整備事業 久松ポンプ場築造工事(機械・電気)完成・送水ポンプ(Q=2.54m³/min H=73m φ 150×55Kw)×2台 流量計測装置(電磁式 φ 150) 電動仕切弁(φ 150)×2基
		3. 20	水道水源保全地域表示看板設置工事完成 宮古島市地内
		3. 25	老朽管に伴う配水管布設工事完成 伊良部(前里添)地内
		4. 20	牧山配水池環境整備工事(翌年度繰越分)完成 伊良部(牧山)地内
		5. 9	宮古本島より伊良部(北区)へ給水を開始する。
		5. 15	給水管改良工事完成 城辺仲原地区

西 暦	平成	月 日	記 事
2015	27	7. 31	給水管改良工事完成 とみや商会裏通り
		8. 4	給水管改良工事完成 牧山地区
		8. 19	水位伝送工事完成 前浜ポンプ場・来間配水池
		9. 30	配水池等改良工事及び劣化補修工事(繰越) 完成 配水池等改良工事及び劣化補修工事(その2) 完成
		10. 1	宮古島本島より伊良部全域へ給水を開始する。
		10. 21	平成27年度水道イノベーション賞特別賞受賞 日本水道協会全国会議(於:さいたま市) 「市町村合併に伴う不安定給水区域の解消(長スパン橋梁添架による送水管の布設)」
		11. 4	配水管調査設計委託業務 (城辺 長間地区)
		11. 27	上水道施設整備事業 配水管布設工事(8工区)完成 平良(竹原)地内 DCIP φ 100 L=481.35m
		12. 4	上水道施設整備事業配水管布設工事(7工区)完成 平良(東仲宗根)地内 DCIP φ 150 L=368.44m DCIP φ 100 L=232.40m
		12. 14	ろ過池(1.2.3.4.5.6.8.9)補砂工事完成 袖山浄水場地内
		12. 15	上水道施設整備事業 配水管布設工事(5工区)完成 上野(名嘉山)地内 DCIP φ 100 L=433.76m
			給水管切替工事 (5工区)完成 上野(名嘉山)地内
		12. 18	新水源候補地調査業務 (白川田・東添道水源流域内)
		12. 19	上水道施設整備事業 配水管布設工事(6工区)完成 城辺(友利・長南)地内 DCIP φ 100 L=477.01m PEP φ 50 L=972.03m
			給水管切替工事 (6工区)完成 城辺(友利・長南)地内
		12. 28	上水道施設整備事業 配水管布設工事(4工区)完成 上野(高田)地内 DCIP φ 100 L=198.33m PEP φ 50 L=581.23m
			給水管切替工事 (4工区)完成 上野(高田)地内
2016	28	1. 29	上水道施設整備事業配水管布設工事(3工区)完成 平良(腰原・大原)地内 DCIP φ 150 L=368.44m DCIP φ 100 L=232.40m
			給水管切替工事 (3工区)完成 平良(腰原・大原)地内
		2. 1	消火栓設置工事 (新設1工区)完成 給水管切替工事 (1工区)完成 平良(下里)地内
		2. 5	消火栓設置工事 (新設2工区)完成 上水道施設整備事業配水管布設工事(2工区)完成 平良(腰原)地内 DCIP φ 150 L=262.30m DCIP φ 100 L=16.65m
			給水管切替工事 (2工区)完成 平良(腰原)地内 上水道施設整備事業調査設計業務(配水管) 設計業務一式・測量業務一式
		2. 12	漏水に伴う配水管布設工事完成 伊良部サシバ公園前 HIVP φ 50 L=105.80m
		2. 15	上水道施設整備事業配水管布設工事(1工区)完成 平良(下里)地内 DCIP φ 250 L=457.40m
		3. 17	コンビニエンスストア収納対応プログラム作成業務
		3. 18	城辺配水管布設工事(1工区)(2工区)(3工区)完成 PEP φ 50 L=2113.09m 伊良部浄水地改良工事完成 伊良部浄水地内 二重越配水池螺旋階段改修工事完成 二重越配水池地内

西 暦	平成	月 日	記 事
2016	28	9. 30	水道施設耐震調査業務(ろ過池2箇所(7・8号ろ過池)・水源地(西底原ポンプ室))
		10. 13	袖山浄水場中央監視装置他実施設計業務 宮古島市地内
		10. 14	上水道施設整備事業 東添道水源開発工事(さく井)完成 井戸1・井戸2 φ 508 L=460m
		12. 9	城辺地区配水管改良工事(その1)完成 城辺長間地内
		12. 22	上水道施設整備事業 配水管布設工事(1工区)完成 平良(下里・腰原)地内 DCIP φ 250 L=174.52m DCIP φ 100 L=208.43m
		12. 22	上水道施設整備事業 配水管布設工事(3工区)完成 下地(上地)地内 PEP φ 50 L=1099.99m
		12. 22	袖山浄水場8号ろ過池再生工事完成 平良地内
2017	29	1. 13	上水道施設整備事業 配水管布設工事(2工区)完成 下地(川満)地内 DCIP φ 100 L=910.74m PEP φ 50 L=723.73m
		1. 16	アスファルト路面復旧工事(その3) 上野・下地地区
		1. 16	上水道施設整備事業 調査設計業務(配水管)設計・測量業務一式 平良地区 φ 100 L=460m φ 50 L=120m、城辺地区 φ 100 L=890m、下地地区 φ 100 L=1770m、上野地区 φ 150 L=510m φ 100 L=780m φ 50 L=370m
		2. 24	城辺地区配水管改良工事(その2)完成 城辺長間地内
		3. 15	伊良部大橋水道管メンテナンス 伊良部大橋内
		3. 15	上下水道部駐車場整備工事完成
		3. 15	配水管布設工事(スポーツ観光交流拠点交流施設)完成 平良(下里)地内
		3. 24	来間配水池給水量見直しに伴う施設改良調査設計業務 下地地内
		3. 24	第5配水池機能移設工事完成 伊良部(池間添)地内
		3. 24	変更認可申請及び事業評価策定業務 宮古島市地内
		8. 20	配水管調査設計業務委託 宮古島市平良狩俣・城辺西中・仲原地区
		8. 31	調査設計業務(送水管) 平良(池間)地内
		9. 13	台風18号上陸 最大72時間降水量 宮古島市城辺567mm、鏡原420mm(気象庁データ)
		10. 6	上水道施設整備事業 配水管布設工事(4工区)完成 下地(高千穂)地内 DCIP φ 100 L=627.26m
		10. 29	アスファルト路面復旧工事 宮古島市一円
		11. 16	消火栓設置工事完成 伊良部(池間添・前里添)地内
		11. 22	調査設計業務(配水管)
		11. 30	上水道施設整備事業 配水管布設工事(5工区)完成 城辺(砂川)地内 DCIP φ 100 L=476.08m
		11. 30	佐良浜高架タンク解体
		12. 5	大野水源井戸改修工事(二重ケーシング)完成 (※ポンプ・揚水管交換を含む。)
2018	30	1. 9	上水道施設整備事業 配水管布設工事(1工区)完成 平良(富名腰)地内 DCIP φ 100 L=468.15m PEP φ 50 L=117.09m
		1. 26	第5配水池改修工事完成 伊良部(池間添)地内
		1. 31	上水道施設整備事業 袖山浄水場中央監視設備改良工事完成 平良地内
		2. 2	上水道施設整備事業 配水管布設工事(6工区)完成 上野(大嶺・宮国)地内 DCIP φ 150 L=249.13m PEP φ 50 L=379.83m
		2. 9	来間配水池送水管布設工事完成 下地(来間)地内 DCIP φ 150 L=919.66m
		2. 28	東添道水源地・下北増圧ポンプ場実施設計業務委託 宮古島市地内

西 暦	平成	月 日	記 事
2018	30	3. 9	配水管布設工事(腰原)完成 平良(腰原)地内DCIPφ100 L=205.78m
		3. 16	配給水管改良工事(その1)完成 城辺(西中)地内 PEPφ50 L=773.63m
		3. 16	配給水管改良工事(その1)完成 城辺(東底原)地内 PEPφ50 L=552.14m
		3. 16	平成29年度地下水保全調査業務 白川田、東添道及び平良水道水源流域
		3. 23	送水管布設切替工事(池間地区)完成 平良(池間)地内 DCIPφ150 L=60.37m
		3. 30	二重越・野原・与並武岳配水池内部調査業務委託 宮古島市地内
		4. 13	前浜ポンプ場改良工事完成 下地(前浜)地内
		4. 28	伊良部第3配水池の施設損傷による伊良部南区緊急断水発生 (～H30.5.1解除) 断水世帯 1,231世帯(約2,400人)
		5. 31	来間配水池配水管布設工事完成 下地(来間・前浜)地内
		6. 15	前浜ポンプ場・来間配水池電気設備改良工事完成 下地地内
		8. 20	アスファルト路面復旧工事完成 宮古島市一円
		8. 22	配水管調査設計委託業務(上野地区)完了
		10. 31	上水道施設整備事業 配水管布設工事(H29繰 1工区)完成 上野(大嶺)地内 DCIPφ150 259.94m
		11. 30	上水道施設整備事業 調査設計業務(H29繰 野原送水管)完了
		11. 30	狩俣地区配水管布設工事完成 平良(狩俣)地内
		11. 30	袖山浄水場ろ過池(1～6・8・9号)補砂工事完成 袖山浄水場内
		11. 30	加治道西水源地井戸改修工事完成 加治道西水源地内
		12. 21	宮古島市管内海底送水管調査業務完了 与那覇～来間・狩俣～池間・狩俣～大神島
		12. 28	上水道施設整備事業 配水管布設工事(H29繰 2工区)完成 平良(池間)地内 DCIPφ150 229.45m
2019	31	1. 11	上水道施設整備事業 東添道水源開発工事(H29繰 建築)完成
		1. 11	上水道施設整備事業 配水管布設工事(1工区)完成 上野(大嶺)地内 DCIPφ100 777.07m
		1. 11	上水道施設整備事業 調査設計業務(H29繰 牧山配水管)完了
		1. 18	調査設計業務(導水管・配水管)完了 宮古島市地内
		1. 31	上水道施設整備事業 下北ポンプ場改良工事完成
		1. 31	底原水源地井戸改修工事完成 底原水源地内
		2. 22	上水道施設整備事業 東添道水源開発工事(ポンプ・計装)完成
		2. 28	仲原地区配水管改良工事(その1)完成 城辺(仲原)地内
		2. 28	前浜ポンプ送水管布設工事来間配水池配水管布設工事(翌年度繰越分)完成
		3. 8	上水道施設整備事業 東添道水源開発(導水管)完成 DCIPφ300 90.72m
		3. 15	加治道浄水場・硬度低減化施設計装機器更新工事完成 城辺地内
		3. 15	平成30年度地下水保全調査業務完了
		3. 22	東添道水源地供用開始
		3. 31	仲原地区配水管改良工事(その2)完成 城辺(仲原)地内



(宮古島市イメージキャラクター：みーや)

水道事業統計年報

(平成30年度版)

令和元年 1 2 月発行

発行 宮古島市上下水道部

編集 水道総務課

〒906-0012

宮古島市平良字西里794番地3

TEL (0980) 72-2653

FAX (0980) 72-2647
